



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice

v programovém období 2014–2020

IV. čtvrtletí 2017



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Národní orgán pro koordinaci
Odbor řízení a koordinace fondů EU
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

E-mail: nok@mmr.cz

Vydáno MMR-NOK 13. 3. 2017

Základní informace

Identifikační číslo zprávy: 2017_4Q

Sledované období od: 1. 10. 2017

Sledované období do: 31. 12. 2017

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce (vyjma OP PS ČR-Polsko, kde je ČR řídicím orgánem) jsou zdrojem dat řídicí orgány těchto programů. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje poskytnuté z IS SZIF na základě dohod mezi MZe a MMR.

Data platná od: 1. 1. 2014

Data platná k: 31. 12. 2017

Datum generování: 10. 1. 2018

ISSN: 2533-5111

Obsah

Základní informace	3
1..... Úvod	7
1.1 Účel zprávy	7
1.2 Struktura zprávy.....	8
2..... Stručný přehled čerpání	9
2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství	9
2.2 Srovnání programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	10
3..... Realizace Dohody o partnerství	13
3.1 Finanční čerpání	13
3.2 Naplnění priorit financování Dohody o partnerství	16
4..... Plnění pravidla n+3	21
4.1 Plnění pravidla n+3 programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost.....	21
5..... Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	24
5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	24
5.1.1 Zaměření.....	24
5.1.2 Přehled vyhlášených výzev	24
5.1.3 Finanční čerpání	25
5.1.4 Plnění indikátorů	27
5.1.5 Plnění výkonnostního rámce	28
5.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	31
5.2.1 Zaměření	31
5.2.2 Přehled vyhlášených výzev	31
5.2.3 Finanční čerpání	32
5.2.4 Plnění indikátorů	35
5.2.5 Plnění výkonnostního rámce	36
5.3 Operační program Zaměstnanost.....	40
5.3.1 Zaměření.....	40
5.3.2 Přehled vyhlášených výzev	40
5.3.3 Finanční čerpání	41
5.3.4 Plnění indikátorů	44
5.3.5 Plnění výkonnostního rámce	45
5.4 Operační program Doprava	50
5.4.1 Zaměření.....	50
5.4.2 Přehled vyhlášených výzev	50

5.4.3	Finanční čerpání	51
5.4.4	Plnění indikátorů	54
5.4.5	Plnění výkonnostního rámce	54
5.5	Operační program Životní prostředí	57
5.5.1	Zaměření.....	57
5.5.2	Přehled vyhlášených výzev	57
5.5.3	Finanční čerpání	58
5.5.4	Plnění indikátorů	61
5.5.5	Plnění výkonnostního rámce	62
5.6	Integrovaný regionální operační program	66
5.6.1	Zaměření.....	66
5.6.2	Přehled vyhlášených výzev	66
5.6.3	Finanční čerpání	67
5.6.4	Plnění indikátorů	70
5.6.5	Plnění výkonnostního rámce	71
5.7	Operační program Praha - pól růstu ČR	74
5.7.1	Zaměření.....	74
5.7.2	Přehled vyhlášených výzev	74
5.7.3	Finanční čerpání	74
5.7.4	Plnění indikátorů	78
5.7.5	Plnění výkonnostního rámce	79
5.8	Operační program Technická pomoc	83
5.8.1	Zaměření.....	83
5.8.2	Přehled vyhlášených výzev	83
5.8.3	Finanční čerpání	83
5.8.4	Plnění indikátorů	Chyba! Záložka není definována.
5.9	Program rozvoje venkova.....	86
5.9.1	Zaměření.....	86
5.9.2	Přehled vyhlášených výzev	90
5.9.3	Finanční čerpání	90
5.9.4	Plnění indikátorů	93
5.9.5	Plnění výkonnostního rámce	94
5.10	Operační program Rybářství	98
5.10.1	Zaměření.....	98
5.10.2	Přehled vyhlášených výzev	98

5.10.3	Finanční čerpání	98
5.10.4	Plnění indikátorů	102
5.10.5	Plnění výkonnostního rámce	102
6	Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce	105
6.1	INTERREG V-A Česká republika - Polsko	105
6.1.1	Zaměření.....	105
6.1.2	Přehled vyhlášených výzev	106
6.1.3	Finanční čerpání	106
6.1.4	Plnění indikátorů	108
6.1.5	Plnění výkonnostní rámce	108
6.2	INTERREG V-A Slovensko - Česká republika	111
6.2.1	Zaměření.....	111
6.2.2	Přehled vyhlášených výzev	111
6.2.3	Finanční čerpání	111
6.3	INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.....	112
6.3.1	Zaměření.....	112
6.3.2	Přehled vyhlášených výzev	112
6.3.3	Finanční čerpání	112
6.4	Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020	114
6.4.1	Zaměření.....	114
6.4.2	Přehled vyhlášených výzev	114
6.4.3	Finanční čerpání	115
6.5	Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014–2020	116
6.5.1	Zaměření.....	116
6.5.2	Přehled vyhlášených výzev	116
6.5.3	Finanční čerpání	116
7	Použité pojmy	118
8	Seznam zkratk.....	121

1 Úvod

1.1 Účel zprávy

Čtvrtletní zpráva o implementaci Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v České republice v programovém období 2014–2020 (dále ČZ) představuje základní výstup pravidelného monitorování realizace programů v programovém období 2014–2020.

Vydávání ČZ je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci (dále MMR-NOK), který má ze své centrální koordinační role přístup k agregovaným informacím o realizaci strukturální pomoci Evropské unie (dále EU) v ČR. Stejně jako u většiny ostatních zpráv zpracovávaných na úrovni Dohody o partnerství (dále DoP), tj. na národní úrovni, využívá MMR-NOK údaje poskytované z nižších úrovní monitorování. Informační hodnota této zprávy **tedy přímo závisí na kvalitě a úplnosti informací poskytovaných řídicími orgány (dále ŘO) jednotlivých programů a příjemci pomoci.**

ČZ slouží k těmto hlavním účelům:

- pravidelný přehled o realizaci DoP a programů, konkrétně o stavu, pokroku a vývoji finančního a věcného čerpání a aktuálních informací;
- nástroj pro efektivní řízení a koordinaci programů z centrální úrovně, který umožňuje včasnou identifikaci případných problémů v implementaci DoP a programů, které se promítají do efektivity čerpání a následně mohou mít negativní dopad na plnění finančních a věcných cílů DoP a programů;
- prostředek k informování široké veřejnosti o implementaci ESI fondů v České republice za účelem dodržení principu transparentnosti a informovanosti o hospodaření s veřejnými prostředky z evropských a národních zdrojů.

Následující komentované tabulky poskytují základní informace o postupu čerpání prostředků ESI fondů **za uplynulé čtvrté čtvrtletí roku 2017¹**. Při jejich vytváření se MMR-NOK opírá po stránce metodické o Metodický pokyn pro monitorování implementace evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020 a po stránce datové o data z centrálního informačního systému pro monitorování programů ESI fondů pro období 2014–2020 - MS2014+. V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce (vyjma INTERREG V–A Česká republika-Polsko, kde je ČR řídicím orgánem) jsou zdrojem dat řídicí orgány těchto programů. V případě programů spolufinancovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (dále ENRF) se jedná o údaje poskytnuté z Informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu (dále IS SZIF) na základě dohod mezi Ministerstvem zemědělství (MZe) a MMR-NOK.

¹ Vzhledem k rozsáhlé kontrole dat za indikátory v monitorovacím systému MS2014+, která probíhala v prvních měsících roku 2018, je ČZ a IV. Q 2017 vydávána se zpožděním oproti harmonogramu stanovenému v Metodickém pokynu pro implementaci Evropských a strukturálních fondů v ČR v programovém období 2014–2020.

1.2 Struktura zprávy

Struktura ČZ je koncipována tak, aby v úvodní části poskytovala základní informace o účelu a obsahu zprávy a stručné shrnutí stavu čerpání pro získání základního přehledu o stavu realizace DoP a programů, poté následují detailnější kapitoly věnované stavu implementace DoP a jednotlivých programů. Rozsah dat a informací ČZ poskytuje základní podklady pro řízení a koordinace a základní přehled o stavu implementace ESI fondů v ČR pro širokou veřejnost.

ČZ se ve své struktuře dělí na tyto kapitoly:

- Základní informace.
- Kapitola „Úvod“ obsahuje informace o účelu a struktuře ČZ.
- Kapitola „Stručný přehled čerpání“ nabízí grafické zpracování klíčových dat čerpání DoP a jednotlivých stavů finančních prostředků programů.
- Kapitola „Realizace Dohody o partnerství“ prezentuje finanční a věcný pokrok implementace Dohody o partnerství prostřednictvím klíčových stavů čerpání finančních prostředků z ESI fondů a dále prostřednictvím vybraných indikátorů DoP. Jedná se o souhrnný, národní pohled, jehož základem jsou agregovaná data za jednotlivé programy.
- Kapitola „Plnění pravidla n + 3“ se věnuje kontrole dodržování tohoto důležitého finančního instrumentu za účelem předcházení ztráty finančních prostředků.
- Kapitola „Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost“ tvoří nejobsáhlejší část ČZ a informuje o stavu realizace strukturální pomoci z jednotlivých programů prostřednictvím přehledu výzev², finančního čerpání, plnění indikátorů³ a naplňování výkonnostního rámce.
- Kapitola „Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce“ informuje o stavu realizace strukturální pomoci z programů přeshraniční spolupráce prostřednictvím přehledu výzev, finančního čerpání a plnění indikátorů.


² V případě některých programů došlo po vyhlášení výzvy k navýšení alokace výzvy, např. z důvodu vysokého převisu kvalitních projektů. Toto navýšení je předmětem úprav v MS2014+ a nemusí být prozatím u všech výzev zohledněno.

³ V ČZ za IV. čtvrtletí roku 2017 jsou v kapitolách „Plnění indikátorů“ uvedeny pouze milníkové indikátory, a to z důvodu jejich významnosti v roce 2018, neboť jejich naplnění k 31. prosinci 2018 bude rozhodovat o přidělení či nepřidělení výkonností rezervy jednotlivým programům.

2 Stručný přehled čerpání

2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství


Graf 1 Stav čerpání Dohody o partnerství

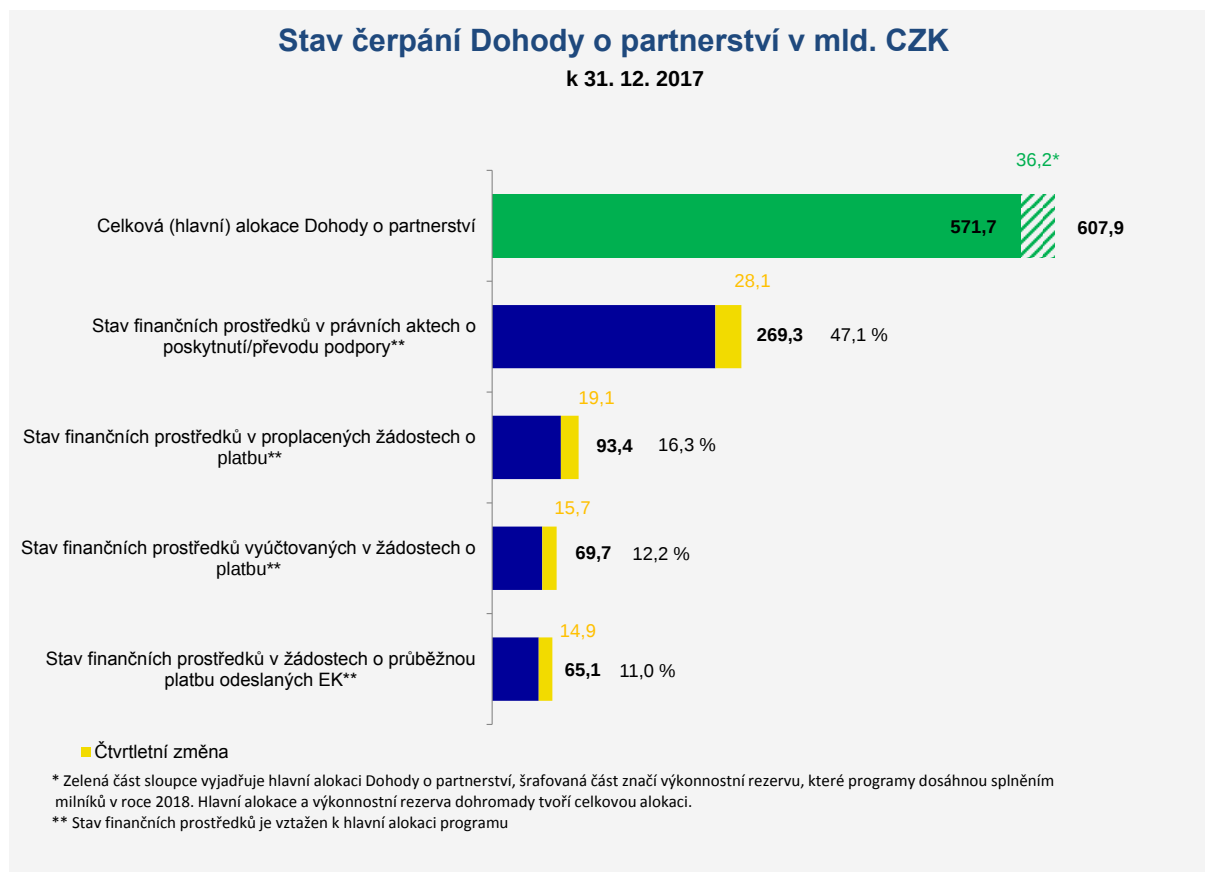


Pozn. 2: Do grafu nejsou zahrnuty údaje o programech v cíli Evropská územní spolupráce.

2.2 Srovnání programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost


Graf 2 Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory

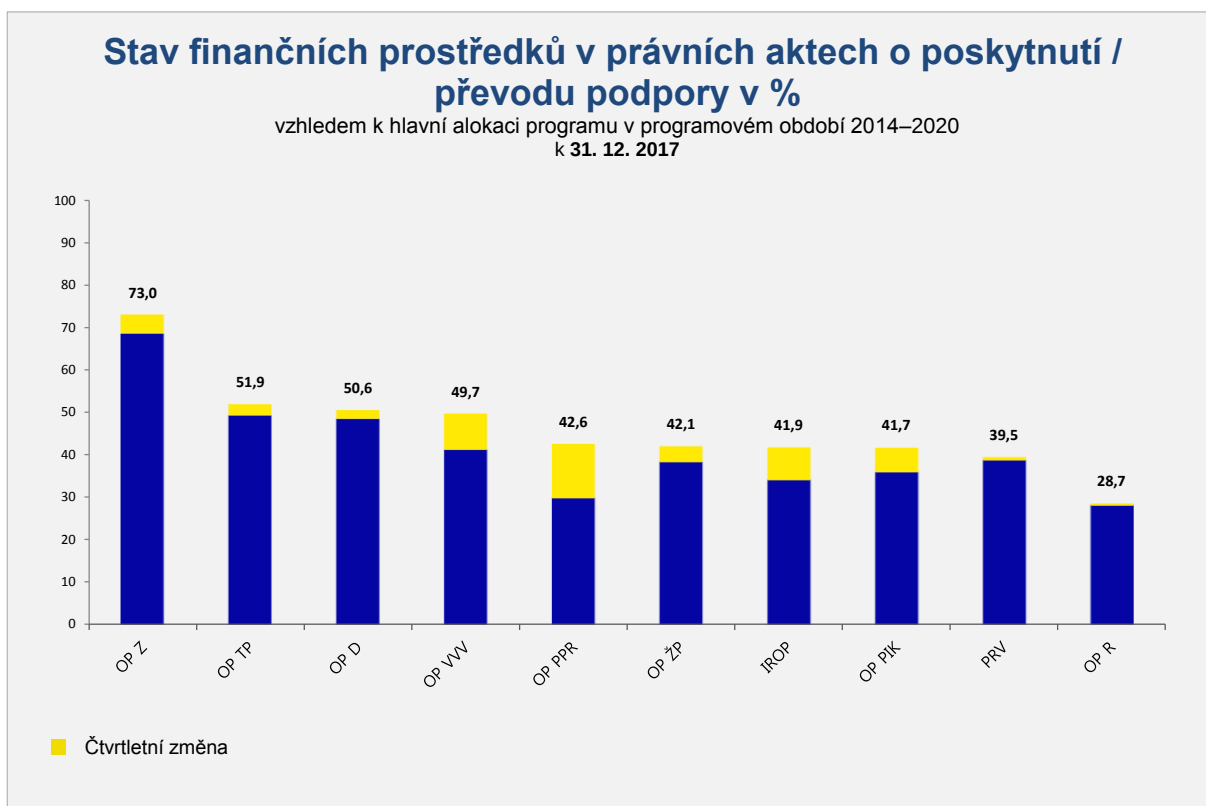

Graf 3 Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu

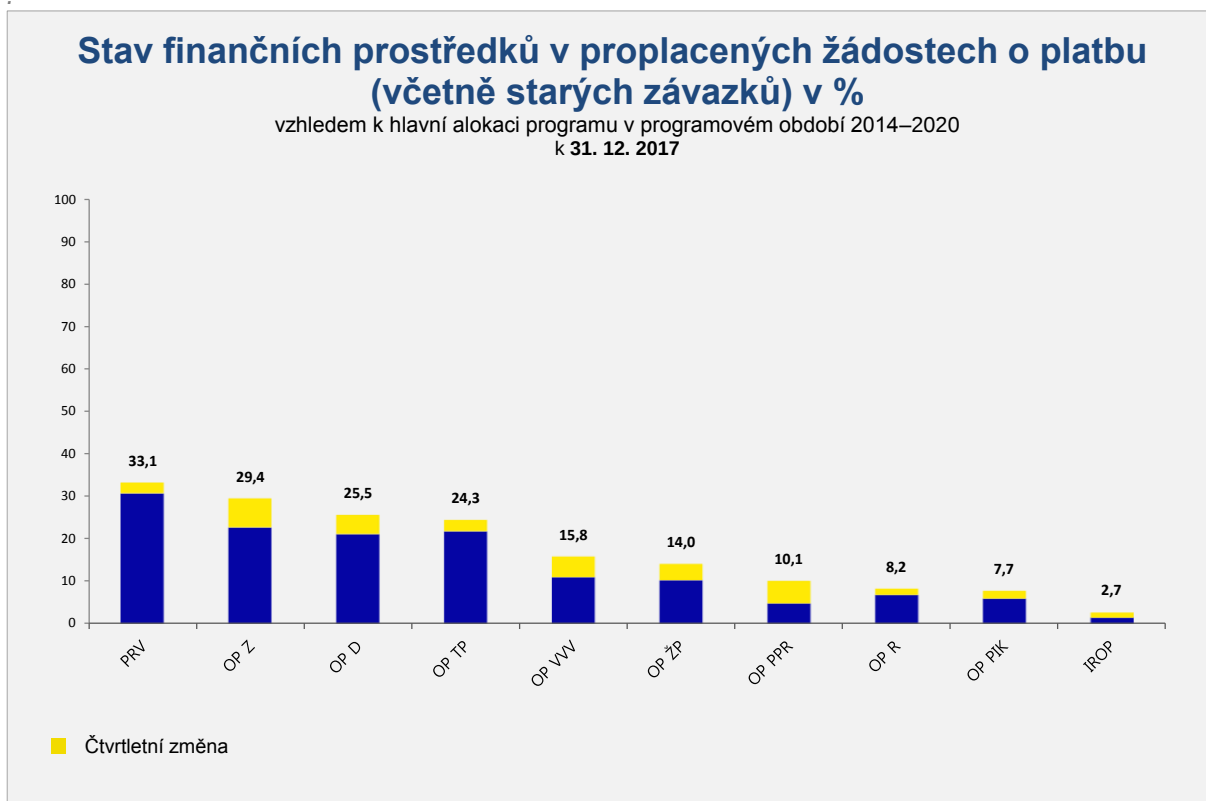


Graf 4 Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu

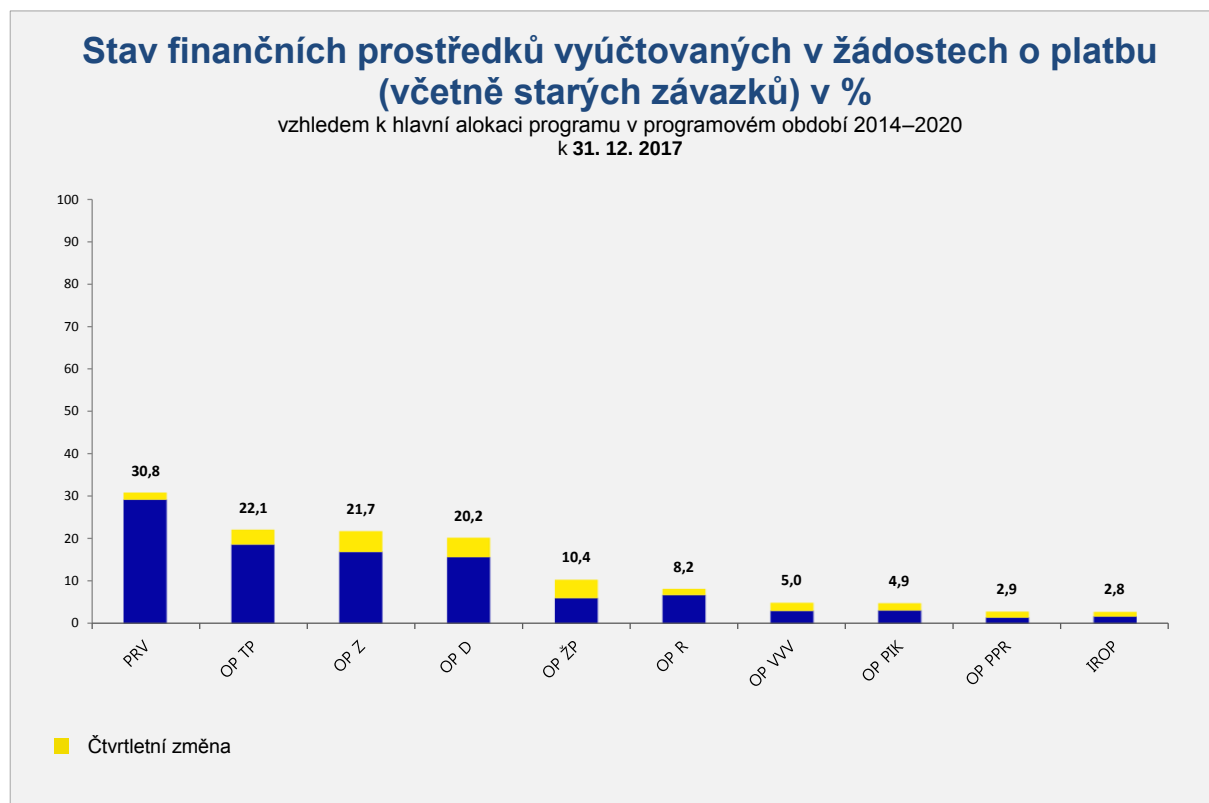

Pozn. 2: Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování.

Pozn. 3: V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům (nikoli vklad do finančního nástroje).

Graf 5 Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK

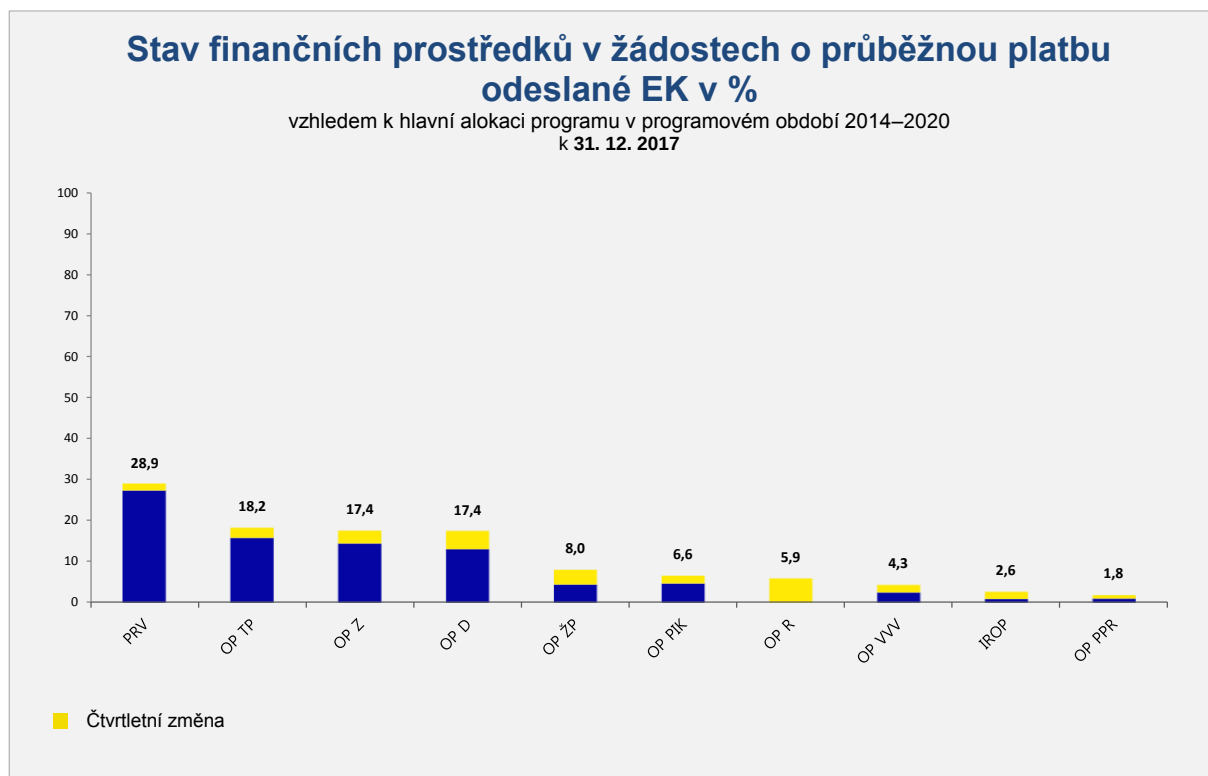

Pozn. 4: Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK zahrnují i příspěvky z programu na finanční nástroje. Do žádosti je možné zahrnout celý vklad prostředků do finančního nástroje, a to bez zohlednění, zda finanční prostředky již byly poskytnuté konečným příjemcům.

3 Realizace Dohody o partnerství

3.1 Finanční čerpání

K 31. prosinci 2017 bylo od počátku programového období vyhlášeno za všechny programy celkem **644 výzev s alokací 595,8 mld. Kč** (příspěvek EU). Tato částka představuje **104,2 % hlavní alokace období 2014–2020**, která činí 571,7 mld. Kč (příspěvek EU).⁴

Ze všech programů vyhlásil k 31. prosinci 2017 **nejvyšší objem výzev vzhledem k hlavní alokaci programu OP Rybářství, dále OP Doprava a OP Praha – pól růstu ČR**. Počet a objem vyhlášených výzev v rámci jednotlivých programů je uveden v kapitole 5, jejímž obsahem jsou podrobnější informace k čerpání prostředků jednotlivých programů v programovém období 2014–2020.

Kromě vyhlášení výzev se řídicí orgány věnují také příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení. Žadatelům, jejichž žádost splní stanovená hodnotící kritéria a je doporučena k financování, jsou vydávány právní akty o poskytnutí / převodu podpory. Za celou DoP byly do 31. prosince 2017 **vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory za 269,3 mld. Kč, tj. 47,1 % hlavní alokace DoP**. Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory vzhledem ke své hlavní alokaci vykázal k uvedenému datu OP Zaměstnanost, dále OP Technická pomoc a OP Doprava.

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů a proplácení způsobilých výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců, **do konce prosince 2017 bylo na úrovni DoP proplaceno 93,4 mld. Kč, tj. 16,3 % hlavní alokace**. Nejvíce finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu bylo proplaceno v případě Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a OP Doprava.

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci prosince 2017 činil 69,7 mld. Kč, tj. 12,2 % hlavní alokace. K vyúčtování největšího objemu finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci došlo u Programu rozvoje venkova, dále u OP Technická pomoc a OP Zaměstnanost.

Řídicí orgány (mimo řídicí orgán PRV⁵) po proplacení a vyúčtování předloží prostředky k certifikaci, v tzv. souhrnných žádostech, na Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán (MF-PCO), který po certifikaci výdajů zasílá žádosti o platbu do EK. Do konce prosince 2017 byly odeslány EK žádosti o platbu všech programů v **celkové hodnotě odeslaných žádostí 65,1 mld. Kč, tj. 11,0 % hlavní alokace DoP**.

Bližší přehled finančního čerpání za jednotlivé programy, v rozdělení dle fondu a kategorie regionu znázorňuje tabulka č. 1.

⁴ Pro přepočty použit měnový kurz (prosinec 2017): 1 EUR = 25,474 CZK.

⁵ ŘO PRV využívá k administraci plateb Platební agenturu SZIF.

Tabulka 1 Stav čerpání Dohody o partnerství

Program / DoP	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	poč.	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
OP PIK	EFRR	Méně rozvinuté regiony	103 710	12 758	110 221	106,28	4 249	43 295	41,75	7 995	7,71	5 039	4,86	7 386	7,12
OP VVV	EFRR	Méně rozvinuté regiony	33 021	716	70 861	214,59	228	18 727	56,71	5 119	15,50	2 019	6,12	2 016	6,11
OP VVV	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 333	382	10 813	324,44	102	1 574	47,22	387	11,60	73	2,20	73	2,19
OP VVV	ESF	Méně rozvinuté regiony	27 971	7 262	21 080	75,36	6 095	12 027	43,00	4 714	16,85	1 168	4,17	1 130	4,04
OP VVV	ESF	Více rozvinuté regiony	1 958	998	1 330	67,91	684	646	32,99	228	11,66	42	2,15	41	2,07
OP Z	ESF	Méně rozvinuté regiony	48 335	8 610	53 431	110,54	3 477	35 372	73,18	14 311	29,61	10 498	21,72	9 360	19,36
OP Z	ESF	Více rozvinuté regiony	2 395	1 090	2 529	105,62	373	1 419	59,28	581	24,27	461	19,25	416	17,36
OP Z	YEI + ESF související	Nerelevantní	693	6	742	107,14	5	733	105,82	206	29,70	222	32,02	136	19,63
OP D	FS	Nerelevantní	87 382	169	89 536	102,46	76	48 246	55,21	23 043	26,37	18 206	20,83	16 316	18,67
OP D	EFRR	Méně rozvinuté regiony	21 606	25	10 484	48,52	18	6 880	31,84	4 759	22,03	3 792	17,55	3 463	16,03
OP ŽP	FS	Nerelevantní	54 396	5 678	44 507	81,82	2 784	25 636	47,13	8 805	16,19	6 468	11,89	5 539	10,18
OP ŽP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	9 454	1 253	6 745	71,35	468	1 244	13,16	150	1,59	150	1,59	103	1,09
IROP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	110 546	7 586	108 852	98,47	2 920	46 324	41,91	2 953	2,67	3 156	2,85	2 840	2,57
IROP	EFRR	Více rozvinuté regiony	578	113	1 018	176,09	17	192	33,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OP PPR	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 678	331	2 637	71,69	96	1 439	39,13	299	8,14	49	1,34	49	1,34
OP PPR	ESF	Více rozvinuté regiony	1 149	337	899	78,23	194	619	53,91	186	16,19	90	7,83	89	7,71
OP TP	FS	Nerelevantní	5 342	106	3 554	66,53	81	2 774	51,93	1 299	24,31	1 180	22,09	1 175	21,99
PRV	EZFRV	Nerelevantní	55 418	146 011	38 971	70,32	102 435	21 911	39,54	18 316	33,05	17 058	30,78	N/A	N/A
OP R	ENRF	Nerelevantní	745	571	606	81,29	258	214	28,67	61	8,22	61	8,22	44	5,89

Program / DoP	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	poč.	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
DoP	FS	Nerelevantní	147 120	5 953	137 597	93,53	2 941	76 656	52,10	33 147	22,53	25 854	17,57	23 030	15,65
DoP	ENRF	Nerelevantní	745	571	606	81,29	258	214	28,67	61	8,22	61	8,22	44	5,89
DoP	EZFRV	Nerelevantní	55 418	146 011	38 971	70,32	102 435	21 911	39,54	18 316	33,05	17 058	30,78	N/A	N/A
DoP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	278 337	22 338	307 163	110,36	7 883	116 471	41,85	20 976	7,54	14 157	5,09	15 809	5,68
DoP	EFRR	Více rozvinuté regiony	7 589	826	14 468	190,64	215	3 205	42,23	686	9,04	123	1,62	122	1,61
DoP	ESF	Méně rozvinuté regiony	76 306	15 872	74 511	97,65	9 572	47 399	62,12	19 025	24,93	11 666	15,29	10 490	13,75
DoP	ESF	Více rozvinuté regiony	5 501	2 425	4 758	86,48	1 251	2 685	48,80	995	18,09	593	10,78	545	9,90
DoP	YEI + ESF související	Nerelevantní	693	6	742	107,14	5	733	105,82	206	29,70	222	32,02	136	19,63
DoP	-	-	571 710	192 446	578 815	101,24	123 973	269 274	47,10	93 412	16,34	69 733	12,20	50 176	9,72

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

V případě PRV jsou zahrnuty údaje za projekty, plošná opatření a také za staré závazky.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni DoP (bez ohledu na fond kategorií regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu.

3.2 Naplňování priorit financování Dohody o partnerství

Intervence z ESI fondů naplňují jednotlivé priority financování (PF) identifikované v DoP na základě ekonomicko-sociální analýzy a specifikace problémových oblastí. V roce 2017 došlo k výrazné akceleraci v naplňování věcných i finančních cílů DoP. Zvýšil se počet projektů s vydaným právním aktem o poskytnutí / převodu podpory (dále též „podpořené projekty“) a pokračovala realizace projektů, jimž byla poskytnuta podpora z výzev vyhlášených v předchozím období. Byly rovněž vyhlášeny výzvy na dosud nepokrytá témata. Nárůst hodnot indikátorů jak v závazcích příjemců (tj. v projektech, jimž byl vydán právní akt o poskytnutí / převodu podpory), tak v dosažených hodnotách indikátorů byl ke konci roku 2017 poměrně zřetelný, přestože poněkud nerovnoměrný. U některých indikátorů došlo již k dosažení cílových hodnot stanovených pro rok 2023, avšak u jiných se pohybuje pouze v jednotkách procent. V souhrnu lze konstatovat, že vzhledem k současnému stádiu implementace směřují podpořené projekty k naplňování věcných i finančních cílů DoP. Nejlépe se daří naplňovat cíle DoP v prioritách financování PF 01 – Zaměstnanost a PF 05 – Doprava. Zaostává naopak naplňování cílů v PF 05 – ICT infrastruktura a dále věcný cíl dosažení energetických úspor, který se prolíná více prioritami financování.

Komentáře v dalším textu se vztahují k jednotlivým prioritám financování, které mohou být naplňovány různými fondy a různými programy. Všechny finanční položky představují příspěvek EU.

PF 01 - Účinné a efektivní služby zaměstnanosti, které přispějí ke zvýšení zaměstnanosti zejména ohrožených skupin. V oblasti **zaměstnanosti** směřovala velká část finančních prostředků na podporu **zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob, které mají různá znevýhodnění na trhu práce**. Ti tvoří početnou skupinu v rámci nezaměstnaných a i přes aktuální pozitivní vývoj na trhu práce obtížně hledají uplatnění. Různými nástroji již bylo podpořeno přes 53 tis. osob (30 % cílové hodnoty), z nichž již cca 14 tis. získalo doklad o absolvovaném vzdělávacím programu. Bez mála 10 tis. podpořených účastníků je nyní aktivních, tzn., že buď hledají práci, vzdělávají se, nebo jsou již zaměstnaní. Velké systémové projekty na **modernizaci služeb zaměstnanosti**, zlepšení služeb Úřadu práce a dalších institucí jsou v realizaci. V **oblasti modernizace služeb zaměstnanosti** jsou realizovány velké systémové projekty, zejména pro zlepšení fungování Úřadu práce, ale i dalších institucí. Ty se potýkaly s některými problémy spojenými se začátkem realizace, jako je nedostatek zaměstnanců, či zdoluhavá výběrová řízení. Z tohoto důvodu nejsou výsledky zatím viditelné, dle ukazatelů v podpořených projektech lze však usuzovat na postupné plnění cílů i v této oblasti. K zajištění **souladu kvalifikace pracovní síly s požadavky trhu práce** a zvýšení adaptability zaměstnanců byly podpořeny zejména projekty v oblasti profesního podnikového vzdělávání. V rámci podpořených projektů je v plánu účast až 150 000 osob, což přesahuje požadovanou cílovou hodnotu. Doklad o absolvovaném vzdělávacím programu již získalo 81 893 účastníků, což je téměř 70 % cílové hodnoty. Zásadním tématem je také **soulad soukromého a pracovního života**, kde se podporují zařízení péče o děti. Ke konci roku 2017 vzniklo či bylo rozšířeno 495 zařízení, což představuje 145 % cílové hodnoty.

V PF 02 - Kvalitní vzdělávací systém (celoživotní učení) produkující kvalifikovanou a adaptabilní pracovní sílu jsou v počátečním vzdělávání realizovány kromě projektů systémových a koncepčních zejména projekty zaměřené na zlepšení místního a krajského strategického plánování a na ně navazující projekty zjednodušeného vykazování pro školy tzv. šablony. V realizaci je již 5 647 zjednodušených projektů. Řešenými tématy jsou zejména zkvalitňování výuky gramotností a podpora inkluze, u středních škol také zkvalitňování odborné výuky. Podpořeny byly také investice do infrastruktury škol v celkové hodnotě 9,75 mld. Kč, zájem o tuto podporu je vysoký. Na **zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání** směřuje podpora na strategické projekty jednotlivých škol, včetně rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů. Tematicky jsou výzvy cílené zejména na změny v oblasti řízení škol a jednotlivých vzdělávacích programů, dále na odstranění příčin studijní neúspěšnosti a na pomoc znevýhodněným studentům. Celkově je již v realizaci 234 projektů v objemu dosahujícím 14 mld. Kč, celkový počet účastníků však zatím zaostává za předpoklady. V roce 2017 byly poprvé vyhlášeny výzvy na mobilitu vysokoškolských pedagogů i studentů za účelem **rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje**. Pro řešení **neuspokojivé kvalifikační struktury v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví** byly podpořeny projekty zaměřené na předávání znalostí a informační akce, do nichž se zapojilo přes 2 300 osob.

V PF 03 - Výzkumný a inovační systém založený na kvalitním výzkumu propojeném s aplikační sférou a směřujícím ke komerčně využitelným výsledkům akcelerovalo ke konci roku 2017

hodnocení projektů a jejich vstup do realizace. Ve prospěch **zvýšení excelence a mezinárodní otevřenosti výzkumu** bylo podpořeno 121 projektů v objemu téměř 10 mld. Kč a proplaceny prostředky ve výši více než 4,1 mld. Kč. Ani navýšení alokace na výzvu Excelentní výzkum z 6 na 8,1 mld. Kč však nedokázalo uspokojit enormní zájem žadatelů o tuto podporu. Příjemci se zavázali vybudovat nebo rozšířit či modernizovat 81 výzkumných infrastruktur a spolu se zahraničními partnery vytvořit 1 764 odborných publikačních výstupů, což je více než dvojnásobek cílové hodnoty. Na **posílení orientace výzkumu na přínosy pro společnost** byly realizovány projekty aplikovaného výzkumu ve spolupráci podniků a výzkumných organizací. Právní akty o poskytnutí / převodu podpory dosáhly hodnoty více jak 14,6 mld. Kč, proplaceno bylo téměř 1,8 mld. Kč. Celkem 276 podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi představuje cca 10 % cílové hodnoty. V případě inovačních voucherů již byla cílová hodnota překročena. K **lepšímu využívání výsledků mobility ve výzkumu a vývoji (VaV) v oblasti zemědělství** byly proplaceny prostředky zatím pouze v jednotkách procent, avšak žádosti zaregistrované ve výzvách roku 2017 dávají předpoklady pro zvýšení aktivit v této oblasti.

V **PF 04 – Podniky využívající výsledků VaV, konkurenceschopné na globálním trhu a přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství registrujeme nerovnoměrný pokrok, Zatímco oblast Konkurenceschopnosti podniků** v průmyslu se vyvíjí pozitivně, oblast týkající se energetických úspor v průmyslu zaostává a pomalejší vývoj rovněž vykazuje konkurenceschopnost podniků v akvakultuře. K posílení **domácího podnikatelského sektoru** vstoupily do realizace projekty, které získaly podporu zejména v dotačním programu Technologie OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Zájem žadatelů několikanásobně překročil alokace vyhlášených výzev. V roce 2017 byl spuštěn program zvýhodněných úvěrů Expanze realizovaný ČMZRB a byly převedeny prostředky do Fondu fondů vytvořeného ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF). Bylo podpořeno 678 projektů ve výši 13,8 mld. Kč a proplaceno více jak 3,5 mld. Kč. Příjemci se zavázali instalovat 3 029 technologických zařízení, z čehož již 1 250 bylo realizováno. Tyto údaje signalizují dobrý trend v naplňování cílů DoP. Masivnější podpora **vzniku nových firem (startupů)** prostřednictvím fondu rizikového kapitálu nebyla v roce 2017 ještě zahájena, pokračovaly pouze nezbytné administrativní procesy nutné ke vzniku Národního inovačního fondu. Pozitivně se vyvíjí podpora **zlepšení podnikatelských aspirací** formou účastí na odborných veletrzích a výstavách, kde bylo podpořeno 434 projektů v hodnotě více než 1 mld. Kč. O zlepšení **podnikatelské infrastruktury** byl ze strany žadatelů velký zájem. Příjemci vybudovali, rozšířili nebo zrekonstruovali kapacity v užité ploše 50,1 tis. m², přičemž závazek příjemců je desetinásobně vyšší a představuje více než jednu třetinu cílové hodnoty. Pro zlepšení **vysoké energetické a surovinové náročnosti hospodářství** bylo ke konci roku 2017 podpořeno 579 projektů v objemu 4,1 mld. Kč, což však představuje pouze 21 % alokace vyčleněné pro tuto oblast. Proplaceno bylo téměř 780 mil. Kč. Celkově bude velmi obtížné dosáhnout plánovaných úspor dle Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR. Pro zlepšení situace bylo s Evropskou komisí dohodnuto, že část této podpory mohou čerpat i velké podniky, což by se mělo pozitivně projevit v následujících letech. Zároveň byly v průběhu roku 2017 spuštěny finanční nástroje jako nová možnost opatření k podpoře zvyšování energetické účinnosti. V oblasti **nízkouhlíkových technologií** je zaznamenán převis v registrovaných žádostech o podporu, aplikované technologie již překročily polovinu cílové hodnoty. Ve prospěch **zajištění vyšší konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských a lesnických podniků** poskytl Program rozvoje venkova podporu více než jednomu tisíci zemědělských podnikatelů na investice do hmotného majetku, jimž bylo proplaceno 5 mld. Kč. Rovněž v **sektoru rybářství a akvakultury** směřovaly aktivity do **posílení konkurenceschopnosti podniků**, zejména realizací projektů na investice do rybníků a opatření směřujících ke zvýšení produkce akvakultury. Počet podpořených projektů však zatím představuje méně než 10 % cílových hodnot.

V **PF 05 – Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území** se oblast dopravy vyvíjí pozitivně, zatímco k naplnění věcných cílů v oblasti energetické a ICT infrastruktury bude nutno přidat. V rámci **dopravní infrastruktury** byly pro **dokončení páteřní dopravní sítě** podpořeny projekty na modernizaci železničních tratí v objemu 18,9 mld. Kč a proplaceny ve výši 13,3 mld. Kč. Modernizováno tak bylo 212 km železničních tratí, z toho 32,9 km sítě TEN-T (tj. třetina cílové hodnoty). Dále byly podpořeny projekty silniční páteřní infrastruktury v objemu 27,9 mld. Kč a proplaceny ve výši 9,7 mld. Kč. Vybudováno tak bylo 19 km nových (tj. čtvrtina cílové hodnoty) a modernizováno rovněž 19 km (tj. více jak čtvrtina cílové hodnoty) stávajících dálnic a silnic sítě TEN-T. Ve stadiu realizace se nacházejí další kilometry tratí a silnic. U páteřní **U zlepšení infrastrukturních podmínek pro rozvoj měst a aglomerací** je pokrok nevyrovnaný. Z důvodu velké časové náročnosti přípravy nebyl podpořen a nevstoupil do realizace

prozatím žádný projekt výstavby či modernizace tratí hromadné dopravy ze strany měst. Lepší situace je v rámci dalších aktivit, kde byly podpořeny projekty v objemu 5,8 mld. Kč a proplaceny ve výši 359 mil. Kč. Příjemci se zavázali k výstavbě či rekonstrukci 26 přestupních terminálů ve veřejné dopravě (tj. necelá třetina cílové hodnoty), dva již byly zprovozněny. Dále se zavázali k pořízení 424 nových vozidel pro veřejnou dopravu (tj. dvě třetiny cílové hodnoty), z toho 71 již bylo pořízeno, a dále k vybudování 1 525 parkovacích míst (tj. necelá pětina cílové hodnoty), z toho realizováno bylo 41. Prozatím tak bylo dosaženo pouze dílčího pokroku.

V oblasti **energetiky a energetické infrastruktury** se realizuje řada různorodých aktivit přispívajících k naplňování věcných cílů DoP. Závazky z projektů na využívání **obnovitelných zdrojů energie** indikují problémy s čerpáním a dosažením očekávaných výsledků. Podpořeno bylo 5 projektů za 36 mil. Kč, což představuje necelá 3 % alokace na tuto oblast, proplaceny nebyly doposud žádné finanční prostředky. Ve prospěch zvýšení **modernosti a kapacity přenosové soustavy** bylo dosud podpořeno 6 projektů v celkové hodnotě 557 mil. Kč, proplaceno bylo 14 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že aktuálně není předpoklad pro vyčerpání celé alokace, byl navržen přesun prostředků do jiné oblasti. Ke **snížení ztrát tepelné energie v tepelných rozvodných zařízeních** a rovněž k lepšímu využití potenciálu **kombinované výroby elektřiny a tepla** bylo podpořeno 38 projektů v objemu 1,2 mld. Kč, proplaceno bylo 160 mil. Kč. Poměrně velký počet zaregistrovaných žádostí o podporu v relativně vysokém finančním objemu signalizuje zájem o tuto oblast. V oblasti **modernosti a kapacity distribučních soustav** prozatím nebyly podpořeny žádné projekty, registrovány jsou žádosti v objemu stovek milionů korun českých.

Oblast **informačních a komunikačních technologií (ICT) a ICT infrastruktury** vykázala v roce 2017 nerovnoměrný pokrok. Pro posílení nabídky **služeb a řešení ICT** byly do konce roku 2017 podpořeny projekty v objemu 4,3 mld. Kč, z toho bylo proplaceno 0,8 mld. Kč. Závazek příjemců pořídit 784 informačních systémů již překročil cílovou hodnotu a závazek vybudovat 25 nových a modernizovaných IT center dosáhl třetiny cílové hodnoty. Dosažené hodnoty se však zatím pohybují v jednotkách procent. Pro řešení **nedostatečného pokrytí převážně venkovského území vysokorychlostním internetem** byla vyhlášena jedna výzva v objemu 11,6 mld. Kč, která však zaznamenala minimální zájem ze strany žadatelů a stížnosti ICT sektoru. Situací se zabývá také Evropská komise. S ohledem na výsledky šetření bude provedena změna parametrů další výzvy a pravděpodobně i přesun části finančních prostředků. Přesto míra pokrytí území ČR sítěmi nové generace (NGA) dosahuje 75 % a blíží se k cílové hodnotě, což bylo dáno vývojem na trhu za komerčních podmínek. Řešení však vyžaduje pokrytí venkovských oblastí sítěmi NGA, jež zůstává na 52 %.

V **PF 06 – Transparentní a efektivní veřejná správa s nízkou mírou administrativní a regulační zátěže** došlo ke konci roku 2017 k výraznému nárůstu žádostí o podporu ve všech vyhlášených výzvách a řada projektů vstoupila do realizace. Pro **zvýšení efektivity, odbornosti a transparentnosti veřejné správy** byly podpořeny jednak projekty na úrovni ústřední státní správy, ale také projekty územních samospráv. Celkově bylo proplaceno 530 mil. Kč a podpořeno 90 institucí, což je cca 40 % cílové hodnoty. V oblasti **elektronizace výkonu veřejné správy** (eGovernment) došlo sice k výraznému nárůstu celkového počtu zaregistrovaných žádostí o podporu, avšak pokrok v čerpání je poměrně nevýrazný. Přes minimální objem proplacených prostředků lze vývoj v oblasti eGovernmentu hodnotit mírně pozitivně, protože žádosti o podporu převýšily alokace výzev. Příjemci se zavázali pořídit 303 informačních systémů, což sice převyšuje cílovou hodnotu, dosažená hodnota je však zatím nulová. Závazek příjemců vytvořit 160 nových nebo modernizovaných prvků k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti dosáhl 33 % cílové hodnoty, k dosažení výsledků však zatím nedošlo. Ke **zlepšení nízké efektivity fungování justice** jsou v realizaci dva projekty zaměřené na digitalizaci národního archivu a na elektronickou sbírku zákonů ve výši 425 mil. Kč. Největší zájem projeвили žadatelé o podporu **specifických informačních a komunikačních systémů a infrastruktury**, kde je v realizaci pět projektů za 236 mil. Kč na zvýšení efektivity výkonu veřejné správy, což indikuje pozitivní vývoj.

PF 07 Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně proti chudobě je podporován několika programy, v nichž byla vyhlášenými výzvami pokryta všechna zásadní témata, jako je zlepšování situace ve vyloučených lokalitách i zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb. K **řešení situace ve vyloučených lokalitách** byl v roce 2017 zaznamenán enormní zájem o infrastrukturu základních škol a o zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Počet zaregistrovaných žádostí o podporu zde několikanásobně převýšil alokaci. Přestože na podporu **koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám** bylo dosud schváleno téměř 300 projektů, realizace zatím zaostává. Pokrok byl zaznamenán v oblasti **zvyšování dostupnosti sociálních služeb**, o čemž svědčí počty zaregistrovaných, pozitivně hodnocených a částečně již realizovaných projektů. Závazky příjemců v **sociálním bydlení** mimo Prahu dosáhly hodnoty podpořených 519 bytů, což je více než 10 % cílové hodnoty, první sociální byty již byly postaveny nebo zrekonstruovány také v Praze. Počet podpořených projektů **v sociálním podnikání** svědčí oproti stavu roku 2016 o zvýšení zájmu o hmotné investice, zatímco alokaci na měkké aktivity se v této oblasti nepodařilo naplnit. Pokrok lze zaznamenat v řešení potřeb městského a venkovského prostoru díky podpoře 178 **strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)** s výší podpory na realizaci 2,5 mld. Kč, což je oproti předchozímu roku výrazný nárůst.

PF 08 - Ochrana životního prostředí a krajiny, přizpůsobení se změně klimatu a řešení rizik je rozdělena na dvě podoblasti. V podoblasti **přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik** je reakce na změnu klimatu řešena zajištěním povodňové ochrany intravilánu, kde bylo podpořeno 31 projektů za 654,8 mil. Kč. Čerpání prostředků je oproti očekávání doposud nízké, přestože v roce 2017 došlo k rozšíření aktivit o nádrže na využití srážkové vody. Zájem žadatelů o preventivní protipovodňová opatření je dostatečný. V říjnu 2017 došlo ke spuštění finančního nástroje pro aktivity vedoucí ke **snížení environmentálního rizika a rozvíjení systémů jejich řízení**. Pro **zlepšení připravenosti území** (Integrovaného záchranného systému – IZS) bylo podpořeno celkem 256 projektů za 3,8 mld. Kč. Mimořádný zájem žadatelů byl o techniku pro IZS. Projekty byly zaměřeny zejména na akvizici nákladnější specializované zásahové techniky (hasičské vozy). U stanic Integrovaného záchranného systému a vzdělávacích a výcvikových středisek doposud probíhá hodnocení žádostí o podporu z vyhlášených výzev, ale i v těchto případech přesáhl zájem žadatelů alokaci výzev.

V podoblasti **ochrany životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů** byla pro plnění věcných cílů DoP realizována řada různorodých aktivit. Ke **snížení znečištění ovzduší** bylo vyhlášeno 2. kolo „kotlíkových“ dotací. Celkově byly podpořeny projekty za 6,7 mld. Kč, realizováno bylo doposud 10 494 výměn kotlů. Náhrada kotle za kotel na uhlí již v 2. kole nebyla umožněna. Pro zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší bude pořízeno 245 přístrojů a 9 licencí, příp. nově vyvinutých nebo zmodernizovaných softwarových nástrojů ke sledování kvality ovzduší. Zájem žadatelů o podporu v oblasti snižování znečištění ovzduší je vysoký a dosažení cílů DoP je pravděpodobné. Pro lepší **jakost vod** v oblasti snížení množství vypouštěného znečištění bylo podpořeno 264 projektů za 6,6 mld. Kč, což u návrhové kapacity nově vybudovaných a rekonstruovaných čistíren odpadních vod vedlo k dosažení hodnoty 16 640 ekvivalentních obyvatel a přiblížení se stanovenému cíli z více než 20 %. Pro zajištění dodávek pitné vody bylo dosud podpořeno 88 projektů za 1,51 mld. Kč. V důsledku enormního zájmu žadatelů budou finanční prostředky na zlepšení vodohospodářské infrastruktury měst a obcí v roce 2018 vyčerpány. Ke zlepšení stavu v oblasti **nakládání s odpady** přispěla opatření na prevenci vzniku odpadů. Doposud byly vydány právní akty k 130 projektům za 285 mil. Kč. Velký zájem byl zejména o podporu na pořízení domácích kompostérů, zatímco o podporu na předcházení vzniku průmyslových odpadů byl vzhledem k omezením (veřejná podpora, snížená míra dotace) zájem prakticky nulový. Ke **zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů** bylo podpořeno 828 projektů za 2,4 mld. Kč, převážně na oddělený sběr odpadů. V oblasti **biodiverzity, krajiny, ekosystémových služeb a geofaktorů** bylo podpořeno 463 projektů za 1,2 mld. Kč. Oproti očekávání je zde nižší míra naplňování alokací výzev a to i s ohledem na charakter projektů a delší dobu realizace. K **lepšímu využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví** bylo dosud podpořeno 111 projektů za 5,8 mld. Kč, převážně na revitalizaci památek. Podpora kulturního dědictví průběžně pokračuje také v rámci výzev, určených pro integrované nástroje. Naplnění cílů DoP lze s velkou pravděpodobností očekávat. V oblasti **snížování energetické náročnosti** urbanizovaných území se dosud nedaří zcela naplňovat stanovené věcné cíle v nastaveném časovém horizontu a v jednotlivých segmentech. V realizaci projektů **veřejnoprávních subjektů** došlo k pozitivnímu posunu, bylo podpořeno 842 projektů v hodnotě 2,3 mld. Kč, proplaceno bylo 334 mil. Kč. To vedlo k výraznému nárůstu úspor energie z hodnoty 598 GJ/rok na konci roku 2016 na hodnotu 372 165 GJ/rok. Nárůst zaregistrovaných žádostí o podporu indikuje reálný předpoklad pro naplnění, případně i překročení stanovených cílů dosažení energetické účinnosti v segmentu

veřejných budov. V objektech **hl. m. Prahy** bylo v oblasti energetických úspor podpořeno 16 projektů v objemu 439 mil. Kč. Byla posílena absorpční kapacita rozšířením okruhu žadatelů o městské části a byla přijata další opatření pro využití disponibilních prostředků. I když jsou registrovány nové projekty a další jsou reálně připravovány, dosažení předpokládaných cílů DoP je však spíše ohroženo. Ve prospěch **snížení energetické náročnosti v bytových domech** bylo podpořeno 684 projektů v hodnotě 1,4 mld. Kč, proplaceno bylo 107 mil. Kč. V roce 2017 po zjištění nedostatečného čerpání bylo přistoupeno k realokaci ve výši 3 mld. Kč mimo cíl nízkouhlíková ekonomika (TC 4), avšak nadále budou hledány možnosti celkového využití alokovaných prostředků. Pro zvýšení absorpční kapacity byla zároveň přijata opatření ke zjednodušení administrace podávaných žádostí o podporu a rozšíření okruhu příjemců. V posledních měsících roku 2017 došlo k výraznému nárůstu počtu zaregistrovaných žádostí o podporu ze strany vlastníků bytových domů. Rovněž opatření **Akvakultura poskytující environmentální služby**, jež je realizováno vysazováním úhoře říčního, má podíl na naplňování věcných cílů v této oblasti. Závazek příjemců dosahuje 2 041 kg množství vysazeného úhoře, tj. cca cílovou hodnotu opatření. Značný vliv má i podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na **zemědělství a lesnictví**. Celkem bylo podpořeno 87 614 operací a dosud proplaceno 15,728 mld. Kč. Největší objem prostředků je soustředěn na Agroenvironmentálně-klimatická opatření a na Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními. Velký zájem byl zaznamenán u podpory Zachování postupů ekologického zemědělství.

4 Plnění pravidla n+3

4.1 Plnění pravidla n+3 programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost

Pravidlo n+3 je považováno za **kontrolní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů**. Podle tohoto pravidla musí být alokace na rok n, vyčerpána do konce roku n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků, tzv. automatické zrušení závazku, neboli snížení alokace roku n o nevyčerpané finanční prostředky a nemožnost jejich následného využití v rámci čerpání ESI fondů členským státem, resp. konkrétním programem. Podle nového nastavení vyhodnocování plnění pravidla n+3 ze strany EK se bude plnění hodnotit na úrovni programu. Tuto změnu reflektuje i tabulka č. 3 Stav pravidla n+3, do které byl vložen součtový řádek za celý program, z kterého je možné zjistit aktuální stav plnění pravidla n+3 v jednotlivém programu.

Vzhledem ke skutečnosti, že žádný program v cíli Investice pro růst a zaměstnanost nebyl schválen ze strany EK v roce 2014, tak alokace roku 2014 se převedla k alokaci roku 2015, tudíž vykazování pravidla n+3 probíhá až v roce 2018. Termíny, do kdy musí být vyčerpány jednotlivé roční závazky, znázorňuje tabulka č. 2.

Tabulka 2 Pravidlo n+3 – datum plnění

Alokace roku n (roční závazek)	Datum plnění pravidla n+3
2014	31. 12. 2017 ⁶
2015	31. 12. 2018
2016	31. 12. 2019
2017	31. 12. 2020
2018	31. 12. 2021
2019	31. 12. 2022
2020	15. 2. 2025

Aktuální stav plnění pravidla n+3 na úrovni jednotlivých programů je uveden v tabulce č. 3. K 31. prosinci 2017 splnil pravidlo n+3 pro rok 2018 již Program rozvoje venkova (limit čerpání 2018 splněn na 157,4 % jeho hodnoty), dále OP Zaměstnanost (101,2 % hodnoty limitu čerpání), OP Technická pomoc (100,8 % hodnoty limitu čerpání) a OP Doprava (100,3 % hodnoty limitu čerpání).

⁶ Relevantní pouze pro OP PS BY-ČR v cíli Evropská územní spolupráce, jedná o limit čerpání pro rok 2017, protože program byl ze strany EK schválen v roce 2014. Ostatní programy obou cílů mají alokaci na rok 2014 nulovou.

Tabulka 3 Stav pravidla n+3

Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK		Limit čerpání pro rok 2018	Zbývajících objem žádostí o platbu pro plnění pravidla n+3	Plnění limitu čerpání pro rok 2018
–	–	–	EUR	EUR	%	EUR	EUR	ANO / NE
a	b	c	d	e	f=e/d	g	h=g-e	i
OP PIK	EFRR	Méně rozvinuté regiony	4 071 198 860	267 034 475,74	6,56	683 773 654,28	416 739 178,54	NE
OP VVV	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 296 257 804	72 979 878,95	5,63	217 711 529,83	144 731 650,88	NE
OP VVV	EFRR	Více rozvinuté regiony	130 826 531	2 562 359,16	1,96	21 972 825,41	19 410 466,25	NE
OP VVV	ESF	Méně rozvinuté regiony	1 098 038 194	35 477 734,71	3,23	184 419 776,37	148 942 041,66	NE
OP VVV	ESF	Více rozvinuté regiony	76 855 854	1 373 164,90	1,79	12 908 239,14	11 535 074,24	NE
OP VVV			2 601 978 383	112 393 137,72	4,32	437 012 370,75	324 619 233,03	NE
OP Z	ESF	Méně rozvinuté regiony	1 911 025 257	336 008 904,46	17,58	321 558 400,58	-	ANO
OP Z	ESF	Více rozvinuté regiony	94 000 000	13 524 600,65	14,39	15 787 664,99	2 263 064,34	NE
OP Z	YEI	Nerelevantní	13 599 984	2 570 312,26	18,90	8 244 990,30	5 674 678,04	NE
OP Z			2 018 625 241	352 103 817,37	17,44	345 591 055,87	-	ANO
OP D	EFRR	Méně rozvinuté regiony	848 178 111	130 066 932,23	15,33	142 454 805,99	12 387 873,76	NE
OP D	FS	Nerelevantní	3 430 258 592	614 327 505,30	17,91	597 767 902,03	-	ANO
OP D			4 278 436 703	744 394 437,53	17,40	740 222 708,02	-	ANO
OP ZP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	371 134 579	3 720 594,61	1,00	62 333 493,43	58 612 898,82	NE
OP ZP	FS	Nerelevantní	2 135 346 155	195 589 334,10	9,16	347 390 790,66	151 801 456,56	NE
OP ZP			2 506 480 734	199 309 928,71	7,95	409 724 284,09	210 414 355,38	NE
IROP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	4 339 556 774	115 467 676,75	2,66	728 845 406,69	613 377 729,94	NE
IROP	EFRR	Více rozvinuté regiony	22 700 635	0,00	0,00	3 812 658,12	3 812 658,12	NE
IROP			4 362 257 409	115 467 676,75	2,65	732 658 064,81	617 190 388,06	NE
OP PPR	EFRR	Více rozvinuté regiony	144 394 959	1 191 221,21	0,82	24 251 694,00	23 060 472,79	NE
OP PPR	ESF	Více rozvinuté regiony	45 099 738	2 216 193,72	4,91	7 574 675,17	5 358 481,45	NE
OP PPR			189 494 697	3 407 414,93	1,80	31 826 369,17	28 418 954,24	NE
OP TP	FS	Nerelevantní	209 704 582	38 143 972,41	18,19	37 641 054,61	-	ANO
PRV	EZFRV	Nerelevantní	2 175 453 956	628 856 486,05	28,91	372 764 924,86	-	ANO

Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK		Limit čerpání pro rok 2018	Zbývajících objem žádostí o platbu pro plnění pravidla n+3	Plnění limitu čerpání pro rok 2018
–	–	–	EUR	EUR	%	EUR	EUR	ANO / NE
a	b	c	d	e	f=e/d	g	h=g-e	i
OP R	ENRF	Nerelevantní	29 241 534	1 720 589,27	5,88	5 033 666,84	3 313 077,57	NE
OP PS ČR-PL	EFRR	Nerelevantní	226 221 710	2 475 677,28	1,09	4 134 111,58	1 658 434,30	NE

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR.

V případě YEI a ESF související podpory se pravidlo n+3 sleduje samostatně pro YEI, zatímco ESF související podpora se vyhodnocuje v rámci ESF celkem (ESF + ESF související podpora).

V případě PRV jsou zahrnuty také údaje za staré závazky z programového období 2004–2006 a 2007–2013.

5 Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost

5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

5.1.1 Zaměření

Cílem OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a roli zprostředkujícího subjektu převezme po agentuře CzechInvest nově založená Agentura pro podnikání a inovace. Dalšími zprostředkujícími subjekty pro realizaci nástroje ITI jsou: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/>.

Tabulka 4 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace	31,2
01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků	20,5
01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin	28,0
01.4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií	17,2
01.5 Technická pomoc	3,1

5.1.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2017 vyhlásil Řídící orgán OP PIK 159 výzev v objemu 111,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 107,8 % hlavní alokace. Pokrok za čtvrté čtvrtletí roku 2017 je 26 vyhlášených výzev s objemem 11,4 mld. Kč (příspěvek EU). Podpora se v rámci těchto výzev zaměřovala na individuální či integrované projekty v oblastech výzkumu, vývoje a inovací, úspor energie, modernizace distribučních soustav či na podporu růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <https://www.agentura-api.org/>.

5.1.3 Finanční čerpání


Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 došlo v OP PIK k uzavření 979 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 5,9 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok čerpání v tomto finančním stavu činil 5,7 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2017 v OP PIK uzavřeno 4 249 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 43,3 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 41,7 % hlavní alokace programu. Ke konci čtvrtého čtvrtletí 2017 bylo proplaceno 8,0 mld. Kč, tedy 7,7 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 dosáhla 1,9 mld. Kč, tj. 1,8 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl ke sledovanému datu 5,0 mld. Kč, tj. 4,9 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 dosáhla 1,8 mld. Kč, tj. 1,7 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci roku 2017 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 6,9 mld. Kč, tj. 6,6 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 1,9 mld. Kč, tj. 1,9 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší čerpání vykazuje prioritní osa 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků*, kde je právními akty pokryto téměř 83,9 % alokace této prioritní osy. Naopak nejnižší čerpání v tomto finančním stavu ke sledovanému datu vykazuje prioritní osa 3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin*, kde hodnota finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory pokrývá 20,2 % hlavní alokace této prioritní osy. Obdobná situace je i v následujících finančních stavech čerpání.

Stav čerpání OP PIK k 31. prosinci 2017 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání na jednotlivých prioritních osách uvádí tabulka č. 5.

Graf 6 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v mld. CZK
k 31. 12. 2017

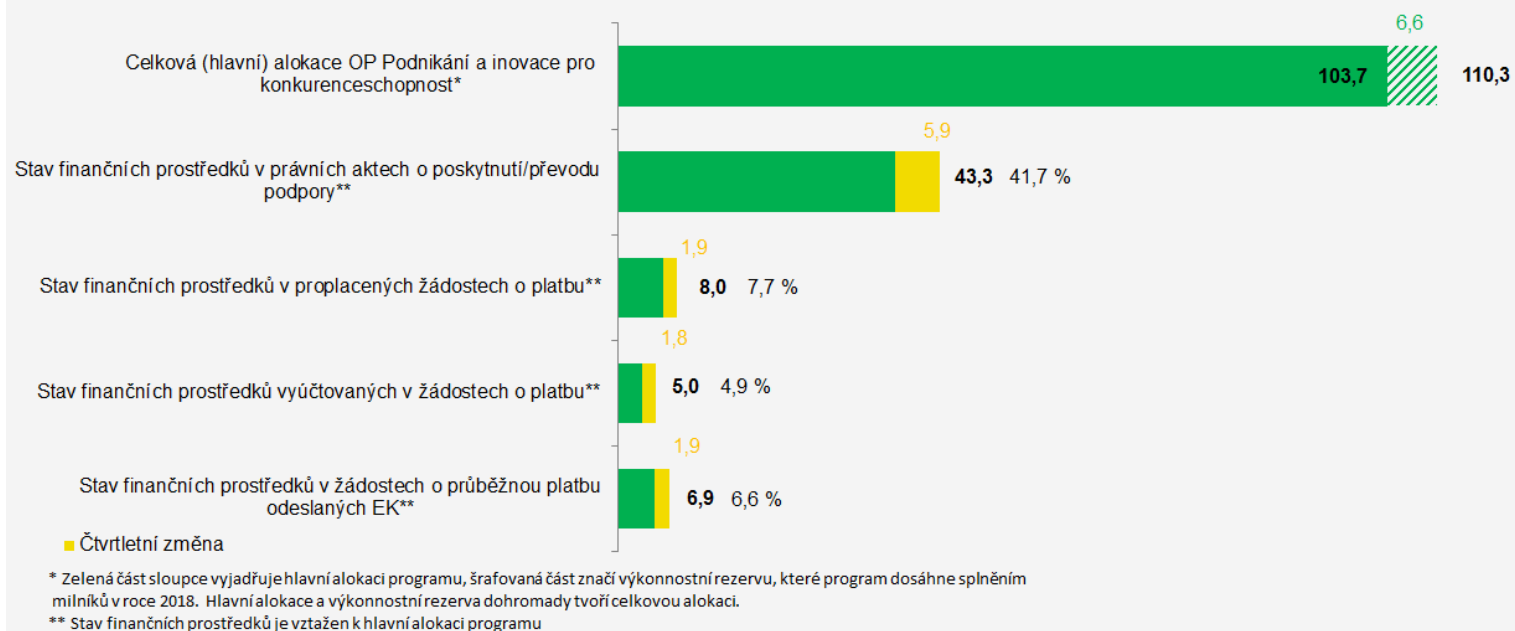

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 5 Stav čerpání programu

Prioritní osa / priorita	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
01.1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	32 315	4 545	51 431	159,15	1 587	14 127	43,72	1 633	5,05	1 633	5,05	1 516	4,69
01.2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	21 303	4 328	25 411	119,28	1 451	17 867	83,87	4 344	20,39	1 778	8,35	3 799	17,84
01.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	29 069	2 897	23 049	79,29	629	5 858	20,15	951	3,27	474	1,63	934	3,21
01.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	17 823	968	9 186	51,54	565	4 336	24,33	774	4,34	770	4,32	722	4,05
01.5	EFRR	Méně rozvinuté regiony	3 200	20	1 145	35,77	17	1 107	34,59	294	9,19	385	12,03	414	12,94
01	EFRR	Méně rozvinuté regiony	103 710	12 758	110 221	106,28	4 249	43 295	41,75	7 995	7,71	5 039	4,86	7 386	7,12

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.1.4 Plnění indikátorů

Z jednotlivých indikátorů výkonnostního rámce OP PIK vykazuje nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátor *10000 Počet podniků pobírajících podporu* na prioritní ose 1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace*, tento indikátor vykázal k 31. prosinci 2017 plnění ve výši 9,5 % cílové hodnoty tohoto indikátoru. Naopak nejnižší procentuální plnění cílové hodnoty vykázal k uvedenému datu stejný indikátor na prioritní ose 4 *Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií*, který vykázal plnění ve výši 2,0 % cílové hodnoty tohoto indikátoru.

Tabulka č. 6 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP PIK.

Tabulka 6 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
01.1	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	1 970	1 282	187	9,49
01.1	20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	2 950	216	225	7,63
01.2	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	7 370	1 677	597	8,10
01.3	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	3 210	570	98	3,05
01.4	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	595	476	12	2,02

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.1.5 Plnění výkonnostního rámce


Z hlediska jednotlivých prioritních os v rámci OP PIK k 31. prosinci 2017 dosahoval nejvyššího procentuálního plnění finanční milník na prioritní ose 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků*, plnění tohoto finančního milníku dosáhlo 76,1 % hodnoty tohoto milníku. Plnění finančních milníků na ostatních prioritních osách nepřekračuje 21 % hodnoty daného finančního milníku.

Z hlediska plnění věcných milníků je v případě prioritních os 1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace* a 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků* dosahováno hodnot v rozmezí 44,2 % až 50,0 % z výše jednotlivých věcných milníků na dané prioritní ose. Věcný milník na prioritní ose 3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin* vykazuje k 31. prosinci 2017 plnění na 36,3 % hodnoty věcného milníku. Nejnižší podíl plnění věcného milníku byl k uvedenému datu vykázán na prioritní ose 4 *Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií*, zde plnění dosahuje pouze 6 % hodnoty věcného milníku.

Plnění jednotlivých věcných a finančních milníků k 31. prosinci 2017 na jednotlivých prioritních osách OP PIK ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Graf 7 Plnění výkonnostního rámce PO 1

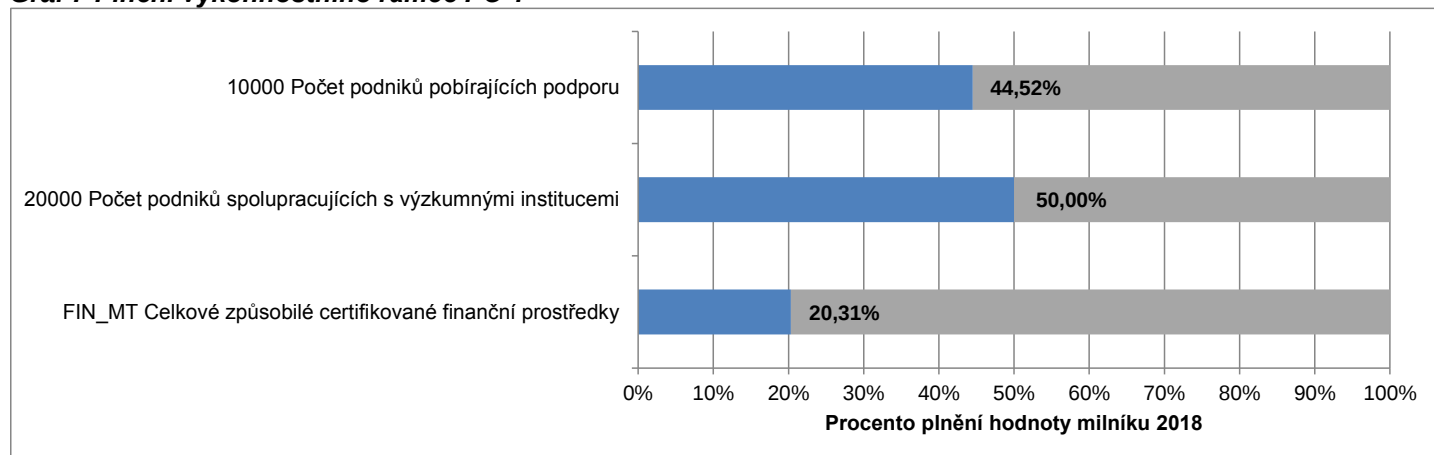


Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Graf 8 Plnění výkonnostního rámce PO 2

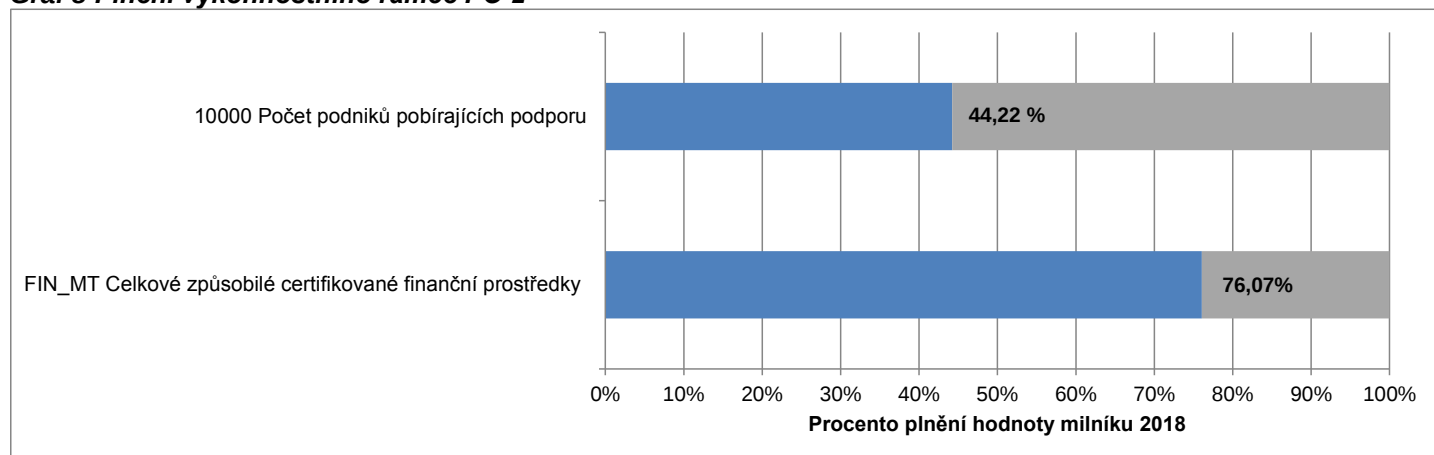


Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Graf 9 Plnění výkonnostního rámce PO 3

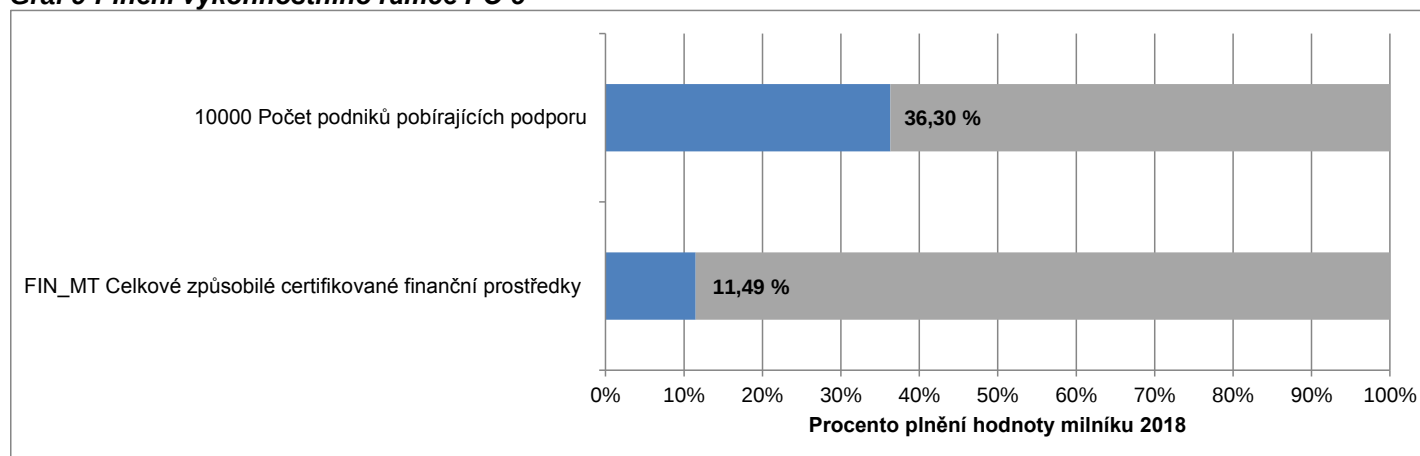

Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Graf 10 Plnění výkonnostního rámce PO 4

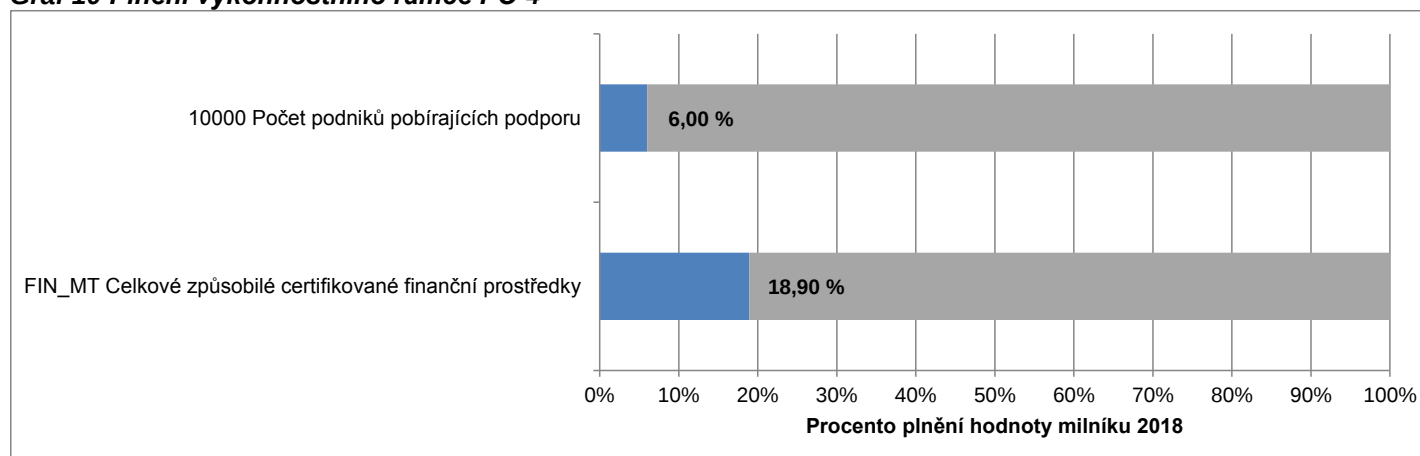

5.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

5.2.1 Zaměření

Cílem OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je přispět k posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zprostředkujícími subjekty pro realizaci nástroje ITI jsou: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>.

Tabulka 7 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	36,2
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	27,6
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	32,5
02.4 Technická pomoc	3,7

5.2.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2017 vyhlásil Řídicí orgán OP VVV 46 výzev 63,1 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 95,2 % hlavní alokace programu. Pokrok za čtvrté čtvrtletí roku 2017 jsou 4 vyhlášené výzvy s objemem 7,1 mld. Kč (příspěvek EU). Vyhlášené výzvy jsou zaměřeny na podporu místních akčních plánů v oblasti vzdělávání, na podporu rozvoje studijního prostředí a na projekty technické pomoci. Jedna z výzev cílí rovněž na komplementární podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 v Horizontu 2020. Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách řídicího orgánu: <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv>.

5.2.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 došlo u OP VVV k uzavření 1 101 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 5,6 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 8,5 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2017 v OP VVV uzavřeno 6 798 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 33,0 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 49,7 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2017 bylo proplaceno 10,4 mld. Kč, tedy 15,8 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 3,2 mld. Kč, tedy 4,8 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 3,3 mld. Kč, tj. 5,0 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 1,3 mld. Kč, tj. 1,9 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci roku 2017 odeslány žádosti v celkové hodnotě 2,9 mld. Kč, tj. 4,3 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 1,2 mld. Kč, tj. 1,8 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší podíl prostředků pokrytých právními akty vykazuje prioritní osa 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR)* v kategorii méně rozvinutých regionů, kde je zasmluvněno 6,2 mld. Kč, což odpovídá 72,8 % vyčleněné hlavní alokace. Naopak nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 31. prosinci 2017 zaznamenán u stejné prioritní osy, fond ESF, v kategorii více rozvinutých regionů, kde v tomto finančním stavu bylo pouze 24,6 % hodnoty hlavní alokace.

Stav čerpání OP VVV k 31. prosinci 2017 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání na jednotlivých prioritních osách, v dělení na fond a kategorii regionu, uvádí tabulka č. 8.

Graf 11 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 8 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
–	–	–	mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
02.1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	22 257	578	59 865	268,97	128	11 612	52,17	4 217	18,95	1 505	6,76	1 505	6,76
02.1	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 727	309	9 827	569,03	56	1 139	65,94	325	18,84	36	2,07	36	2,07
02.2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	8 463	115	9 377	110,80	85	6 158	72,76	388	4,58	1	0,01	1	0,01
02.2	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 438	50	868	60,36	31	365	25,39	24	1,66	0	0,00	0	0,00
02.2	ESF	Méně rozvinuté regiony	7 460	311	6 222	83,40	157	3 981	53,37	787	10,55	72	0,97	70	0,94
02.2	ESF	Více rozvinuté regiony	936	121	438	46,75	48	231	24,63	45	4,79	1	0,11	1	0,11
02.3	ESF	Méně rozvinuté regiony	20 512	6 951	14 858	72,44	5 938	8 046	39,23	3 927	19,15	1 096	5,34	1 061	5,17
02.3	ESF	Více rozvinuté regiony	1 022	877	892	87,29	636	415	40,64	184	17,96	41	4,01	39	3,86
02.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	2 300	23	1 618	70,34	15	957	41,62	514	22,35	514	22,35	511	22,21
02.4	EFRR	Více rozvinuté regiony	167	23	118	70,34	15	70	41,62	37	22,35	37	22,35	37	22,21
02	EFRR	Méně rozvinuté regiony	33 021	716	70 861	214,59	228	18 727	56,71	5 119	15,50	2 019	6,12	2 016	6,11
02	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 333	382	10 813	324,44	102	1 574	47,22	387	11,60	73	2,20	73	2,19
02	ESF	Méně rozvinuté regiony	27 971	7 262	21 080	75,36	6 095	12 027	43,00	4 714	16,85	1 168	4,17	1 130	4,04
02	ESF	Více rozvinuté regiony	1 958	998	1 330	67,91	684	646	32,99	228	11,66	42	2,15	41	2,07
02		–	66 283	8 520	104 083	157,03	6 798	32 974	49,75	10 448	15,76	3 302	4,98	3 260	4,92

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e *Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.*

e, h *Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond kategorie regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.*

5.2.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění indikátorů výkonnostního rámce OP VVV bylo dosaženo k 31. prosinci 2017 v případě indikátoru *60000 Celkový počet účastníků* na prioritní ose 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání*, v kategorii méně rozvinutých regionů, kde plnění tohoto indikátoru dosáhlo výše 6,3 % jeho cílové hodnoty. Nulové plnění cílové hodnoty bylo ke sledovanému datu vykázáno v případě indikátorů výkonnostního rámce na prioritní ose 1 *Posilování kapacit pro kvalitní výzkum* a také v případě indikátorů *30600 Pořízené informační zdroje* a *52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem* na prioritní ose 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj*, v obou kategoriích regionů.

Tabulka č. 9 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP VVV.

Tabulka 9 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
02.1	24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Infrastruktury	0	36	65,4	0	0
02.1	24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence	EFRR	Více rozvinuté regiony	Infrastruktury	0	4	15,6	0	0
02.2	30600 Pořízené informační zdroje	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Informační zdroje	0	68	19,3	0	0
02.2	30600 Pořízené informační zdroje	EFRR	Více rozvinuté regiony	Informační zdroje	0	32	1,7	0	0
02.2	52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Studenti	0	82 000	100 011,1	0	0
02.2	52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	EFRR	Více rozvinuté regiony	Studenti	0	48 000	9 770,9	0	0
02.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	7 253	6 670,0	53,8	0,74
02.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	4 647	1 017,7	0,3	0,01
02.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	41 862	66 751,0	2 635	6,29
02.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	4 938	5 340,8	56,9	1,15

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.2.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejnižší, respektive nulové hodnoty plnění finančních milníků k 31. prosinci 2017 byly vykázány v případě prioritní osy 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj*, fond EFRR, v obou kategoriích regionů. Nejvyššího plnění finančního milníku rámci OP VVV bylo dosaženo ke sledovanému datu na prioritní ose 1 *Posilování kapacit pro kvalitní výzkum*, fond EFRR, kategorie méně rozvinutých regionů, kde byl finanční milník plněn na 52,2 % jeho hodnoty, dále u finančního milníku na prioritní ose 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání*, fond ESF, kategorie méně rozvinuté regiony, kde byl finanční milník plněn na 44,9 %. Plnění finančních milníků na zbývajících prioritních osách OP VVV, v kombinaci fond / kategorie regionu, nepřesáhlo 10 % hodnoty jednotlivých milníků.

Obdobně jako u finančních milníků byly u věcných milníků nulové hodnoty vykázány k 31. prosinci 2017 na prioritní ose 2 osy 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj*, fond EFRR, v obou kategoriích regionů, nulové hodnoty byly vykázány i na prioritní ose 1 *Posilování kapacit pro kvalitní výzkum* v obou kategoriích regionů. Nejvyšší hodnota plnění věcného milníku byla k uvedenému datu vykázána v případě prioritní osy 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání*, fond ESF, kategorie méně rozvinutých regionů, kde byl věcný milník plněn na 18,9 % procenta. Plnění věcných milníků na zbývajících prioritních osách OP VVV, v kombinaci fond / kategorie regionu, nepřesáhlo 4 % hodnoty jednotlivých milníků.

Plnění jednotlivých věcných a finančních milníků k 31. prosinci 2017 na jednotlivých prioritních osách OP VVV, v kombinaci fond / kategorie regionu, ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 12 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR – Méně rozvinuté regiony

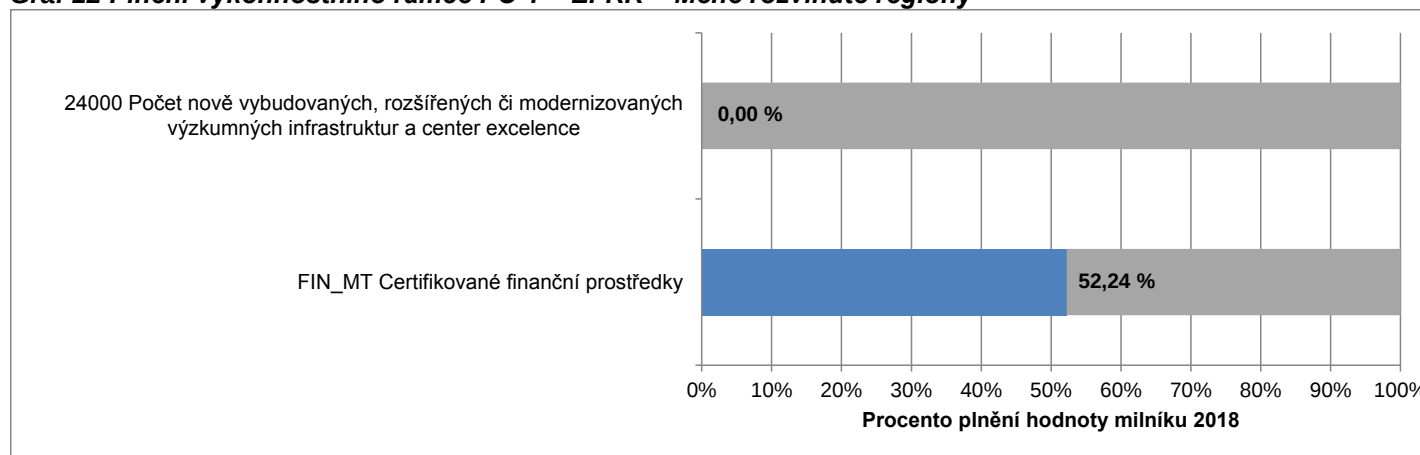


Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – EFRR – Více rozvinuté regiony

Graf 13 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR – Více rozvinuté regiony

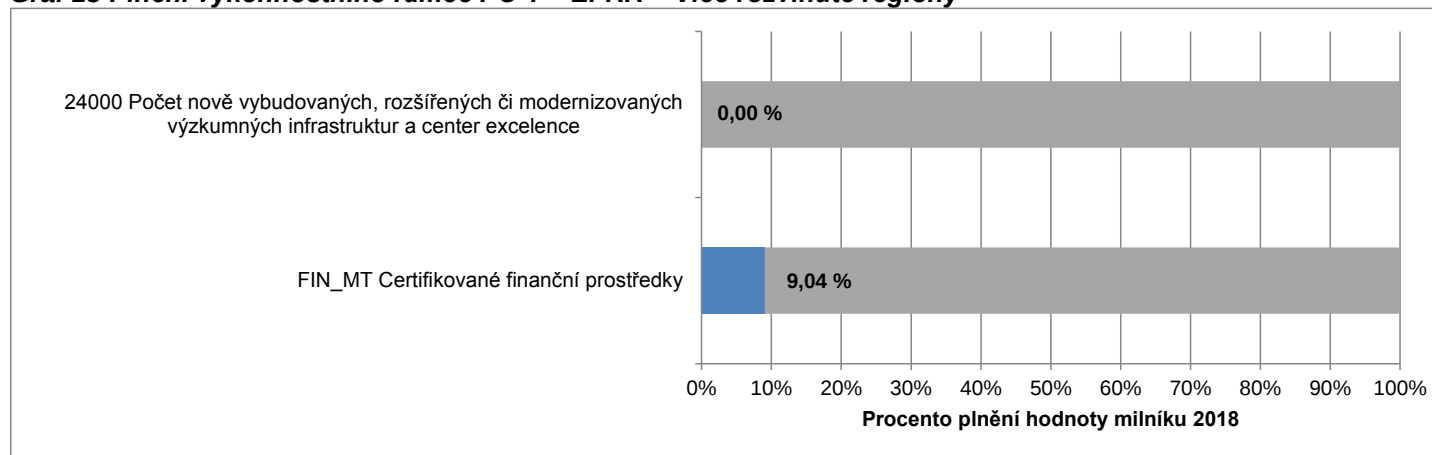


Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 14 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - ESF – Méně rozvinuté regiony

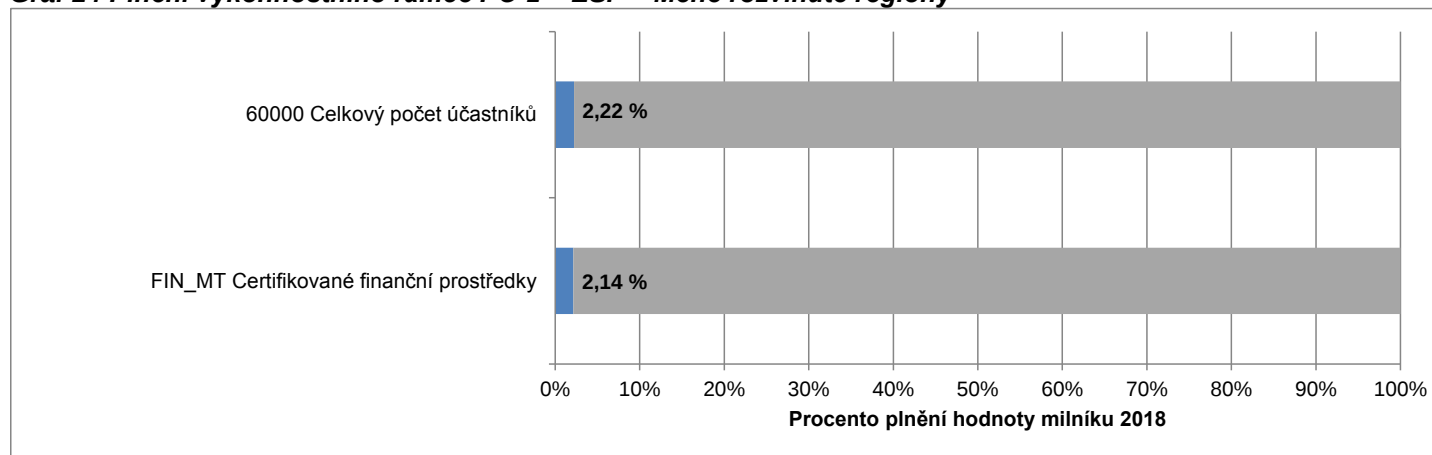

Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 15 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - ESF – Více rozvinuté regiony

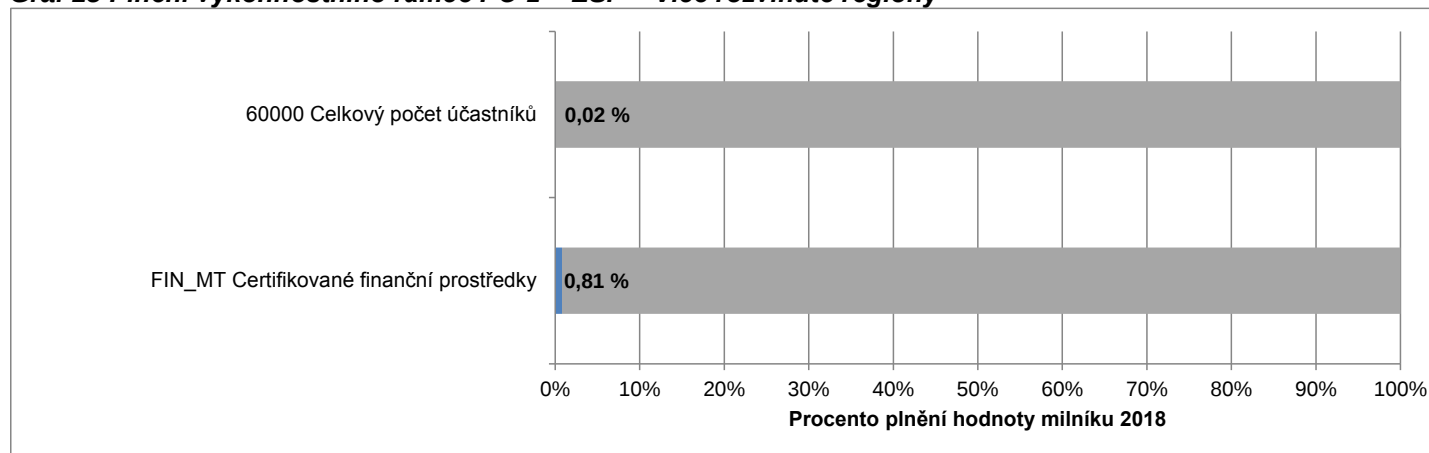

Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – EFRR – Méně rozvinuté regiony


K 31. prosinci 2017 je plnění věcných i finančních milníků na této prioritní ose / fondu / kategorii regionů nulové.

Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – EFRR – Více rozvinuté regiony

K 31. prosinci 2017 je plnění věcných i finančních milníků na této prioritní ose / fondu / kategorii regionů nulové.


Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 16 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Méně rozvinuté regiony

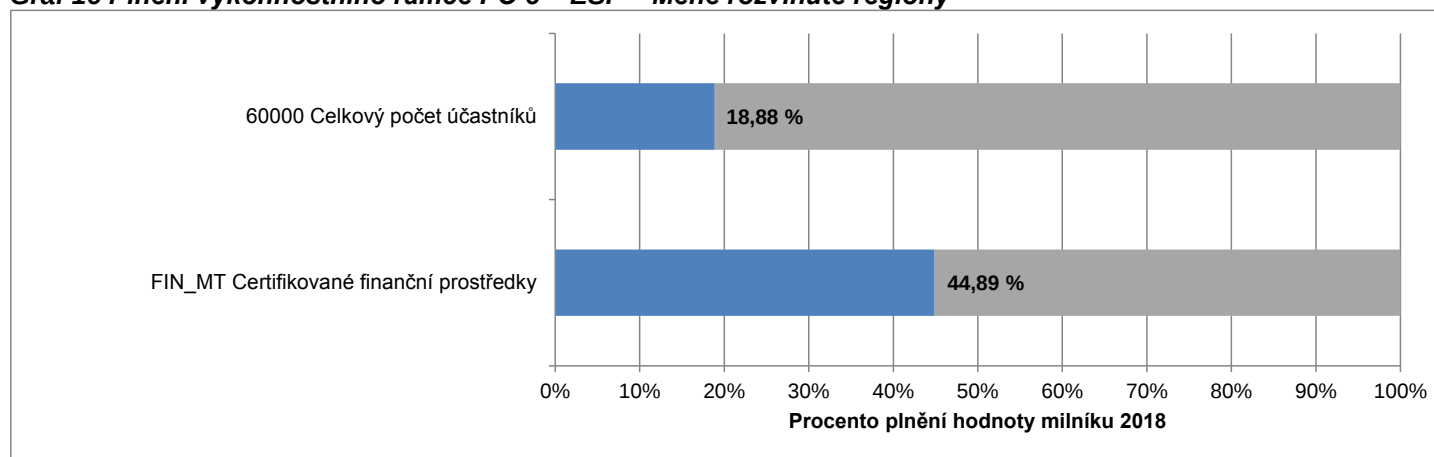

Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 17 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Více rozvinuté regiony

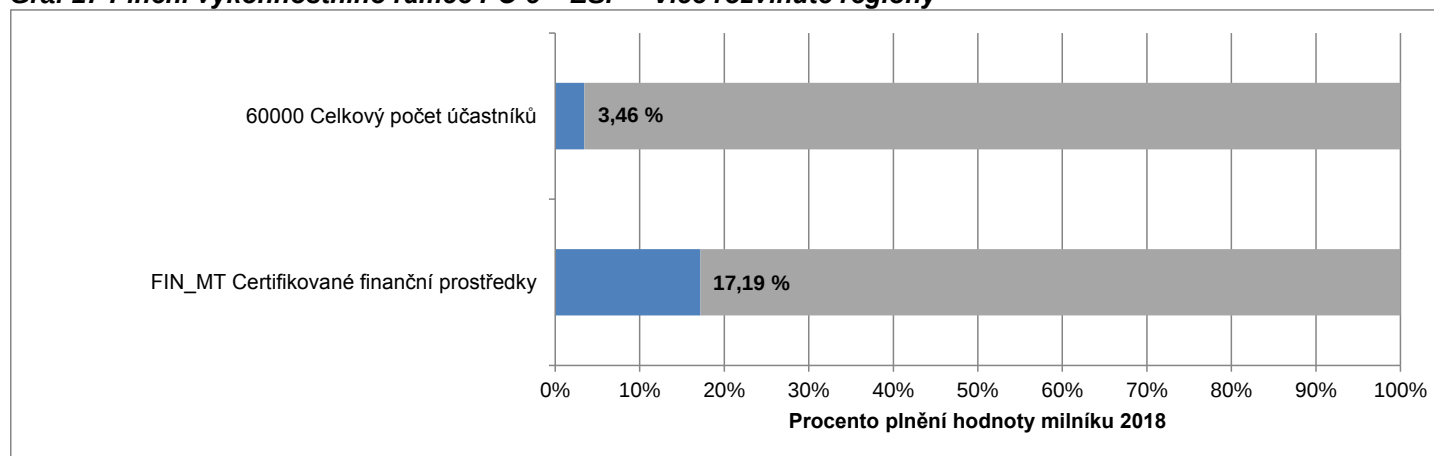

5.3 Operační program Zaměstnanost

5.3.1 Zaměření

Cílem OP Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. Řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020>.

Tabulka 10 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly	61,4
03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou	26,6
03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce	2,0
03.4 Efektivní veřejná správa	5,9
03.5 Technická pomoc	4,2

5.3.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2017 vyhlásil ŘO OPZ 89 výzev v objemu 55,3 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 107,6% hlavní alokace. Pokrok za čtvrté čtvrtletí roku 2017 jsou 3 vyhlášené výzvy v objemu 1,6 mld. Kč (příspěvek EU). Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz>.

Dvě výzvy byly vyhlášené v rámci prioritní osy 1 *Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly*. Jedna z těchto výzev je zaměřena na podporu zaměstnanosti mládeže v rámci YEI (Iniciativa na podporu mládeže) a je cílena do třech krajů Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský. Celková alokace této výzvy je 70 mil. Kč. Druhá výzva vyhlášená v rámci této prioritní osy je zacílena na age management tj. zavádění konceptu age managementu u zaměstnavatelů, podporu rozvoje řízení lidských zdrojů, motivační poradenství, bilanční diagnostika aj. Jedná se o kolovou výzvu oproti první zmíněné, která je průběžná. Celková alokace výzvy je 300 mil. Kč.

Třetí výzva vyhlášená v tomto čtvrtletí v rámci prioritní osy 3 *Sociální inovace a mezinárodní spolupráce* je zaměřena na vývoj nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy, pilotní testování nového řešení v praxi, advokační práce, evaluace. Jedná se o průběžnou výzvu s celkovou alokací 200 mil. Kč.

5.3.3 Finanční čerpání


Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 bylo v OP Z uzavřeno 231 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 2,2 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 4,4 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2017 v OP Z uzavřeno 3 365 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 37,5 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 73,0 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2017 bylo proplaceno 15,1 mld. Kč, tedy 29,4 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 3,5 mld. Kč, tedy 6,8 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 11,2 mld. Kč, tj. 21,7 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 2,5 mld. Kč, tj. 4,9 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci roku 2017 odeslány žádosti v celkové hodnotě 9,3 mld. Kč, tj. 17,4 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 1,6 mld. Kč, tj. 3,1 % hlavní alokace programu.

Na úrovni prioritních os byl k 31. prosinci 2017 nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory zaznamenán v případě prioritní osy 5 *Technická pomoc*, kde podíl finančních prostředků v tomto finančním stavu v obou kategoriích dosáhl hodnoty 106,0 % hlavní alokace. Naopak nejnižší podíl finančních prostředků byl zaznamenán ke sledovanému datu v případě prioritní osy 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou*, v kategorii více rozvinutých regionů, kde bylo v tomto finančním stavu 41,6 % hlavní alokace prioritní osy v této kategorii regionu.

Stav čerpání OP Z k 31. prosinci 2017 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání na jednotlivých prioritních osách, v dělení na kategorii regionu, uvádí tabulka č. 11.

Graf 18 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Zaměstnanost v mld. CZK k 31. 12. 2017

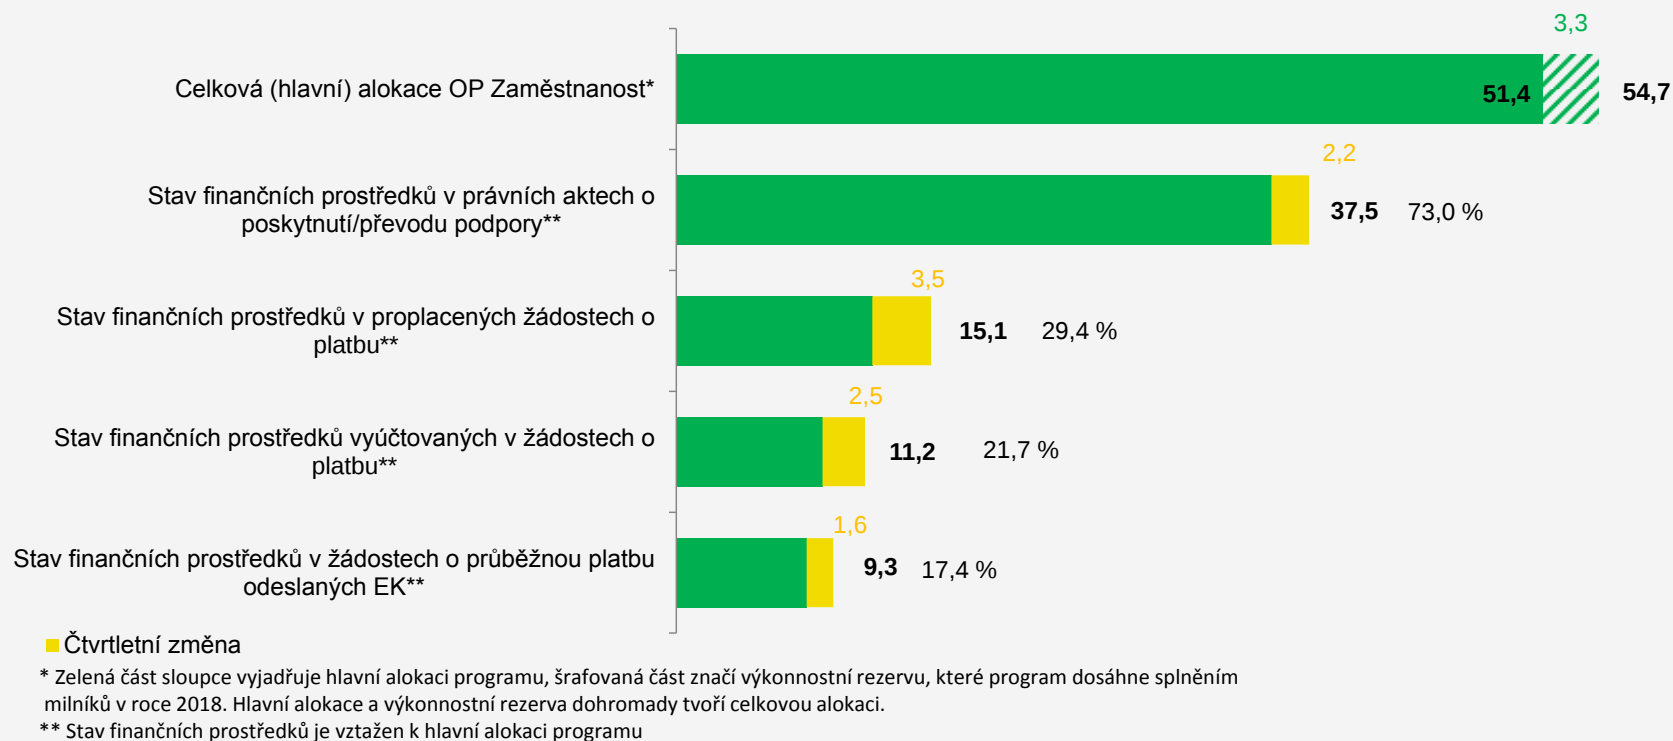

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 11 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	G	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
03.1	ESF	Méně rozvinuté regiony	29 799	5 343	29 846	100,16	2 365	22 607	75,87	9 292	31,18	8 157	27,37	7 403	24,84
03.1	ESF	Více rozvinuté regiony	1 064	457	1 179	110,83	138	736	69,18	400	37,64	355	33,41	323	30,40
03.1	YEI + ESF související	Nerelevantní	693	6	742	107,14	5	733	105,82	206	29,70	222	32,02	136	19,63
03.2	ESF	Méně rozvinuté regiony	12 678	2 509	16 149	127,38	814	8 246	65,04	3 880	30,60	1 634	12,89	1 357	10,70
03.2	ESF	Více rozvinuté regiony	982	169	868	88,38	59	409	41,60	106	10,81	60	6,10	55	5,65
03.3	ESF	Méně rozvinuté regiony	933	365	1 793	192,24	127	597	64,01	289	30,98	135	14,44	101	10,83
03.3	ESF	Více rozvinuté regiony	79	365	152	192,95	127	51	64,09	25	31,06	11	14,50	9	10,83
03.4	ESF	Méně rozvinuté regiony	2 866	387	3 461	120,75	165	1 740	60,72	497	17,35	219	7,66	149	5,19
03.4	ESF	Více rozvinuté regiony	169	93	224	132,04	43	118	69,75	33	19,37	17	10,01	11	6,58
03.5	ESF	Méně rozvinuté regiony	2 058	6	2 182	106,00	6	2 182	106,00	353	17,16	353	17,16	350	17,03
03.5	ESF	Více rozvinuté regiony	100	6	106	105,93	6	106	106,93	17	17,14	17	17,14	17	17,02
03	ESF	Méně rozvinuté regiony	48 335	8 610	53 431	110,54	3 477	35 372	73,18	14 311	29,61	10 498	21,72	9 360	19,36
03	ESF	Více rozvinuté regiony	2 395	1 090	2 529	105,62	373	1 419	59,28	581	24,27	461	19,25	416	17,36
03	YEI + ESF související	Méně rozvinuté regiony	693	6	742	107,14	5	733	105,82	206	29,70	222	32,02	136	19,63
03	-	-	51 422	9 100	56 703	110,27	3 596	37 525	72,97	15 098	29,36	11 181	21,74	9 912	19,28

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond kategorie regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

5.3.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce OP Z je dosaženo k 31. prosinci 2017 v případě indikátoru *60000 Celkový počet účastníků* na prioritní ose 1 *Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly* – YEI, tento indikátor vykazuje ke sledovanému datu plnění ve výši 57, % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší procentuální plnění cílové hodnoty bylo k 31. prosinci 2017 vykázano v případě stejného indikátoru na prioritní ose 4 *Efektivní veřejná správa*, v kategorii více rozvinutých regionů, uvedený indikátor vykázal plnění ve výši 0,1 % jeho cílové hodnoty.

Tabulka č. 12 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP Z.

Tabulka 12 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
03.1	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	334 141	350 833,0	68 885,0	20,62
03.1	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	10 059	11 815,0	4 046,0	40,22
03.1	60000 Celkový počet účastníků	YEI	Nerelevantní	Osoby	0	3 100	3 650,0	1 791,0	57,77
03.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	188 151	60 904,9	9 828,4	5,22
03.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	20 372	2 744,5	288,0	1,41
03.2	67001 Kapacita podpořených služeb	ESF	Méně rozvinuté regiony	Místa	0	34 393	21 261,0	12 148,0	35,32
03.2	67001 Kapacita podpořených služeb	ESF	Více rozvinuté regiony	Místa	0	4 252	2 200,3	956,6	22,50
03.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	2 204	3 410,4	692,8	31,43
03.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	296	456,6	92,8	31,35
03.4	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	24 331	8 489,0	128,0	0,53
03.4	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	2 444	1 442,0	3,0	0,12
03.4	68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření	ESF	Méně rozvinuté regiony	instituce	0	205	682,8	79,7	38,88
03.4	68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření	ESF	Více rozvinuté regiony	instituce	0	21	117,8	10,8	51,43

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.3.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění finančního milníku k 31. prosinci 2017 bylo v rámci OP Z dosaženo v případě prioritní osy 1 *Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly*, fond ESF, kategorie více rozvinuté regiony, zde byl finanční milník plněn na 133,3 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší hodnoty bylo dosaženo v případě prioritní osy 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou*, kategorie více rozvinuté regiony, kde byl finanční milník plněn na 6,3 % jeho hodnoty. Ostatní finanční milníky byly plněny v rozsahu 21,0 % až 109,0 % jejich hodnoty.

Z hlediska věcných milníků bylo nejvyšší hodnoty plnění k 31. prosinci 2017 dosaženo v případě prioritní osy 4 *Efektivní veřejná správa*, kategorie více rozvinuté regiony, kdy jeden z věcných milníků byl plněn na 270,0 % jeho hodnoty. Na této prioritní ose, rovněž v kategorii méně rozvinuté regiony, byl identifikován věcný milník s nejnižší hodnotou plnění (pouze 0,6 % hodnoty věcného milníku). Ostatní věcné milníky jsou plněny v rozsahu hodnot od 2,6 % do 194,4 % hodnot jednotlivých věcných milníků.

Plnění finančních i věcných indikátorů OP Z k 31. prosinci 2017 na jednotlivých prioritních osách, v kombinaci fond / kategorie regionu, ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 19 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – ESF – Méně rozvinuté regiony

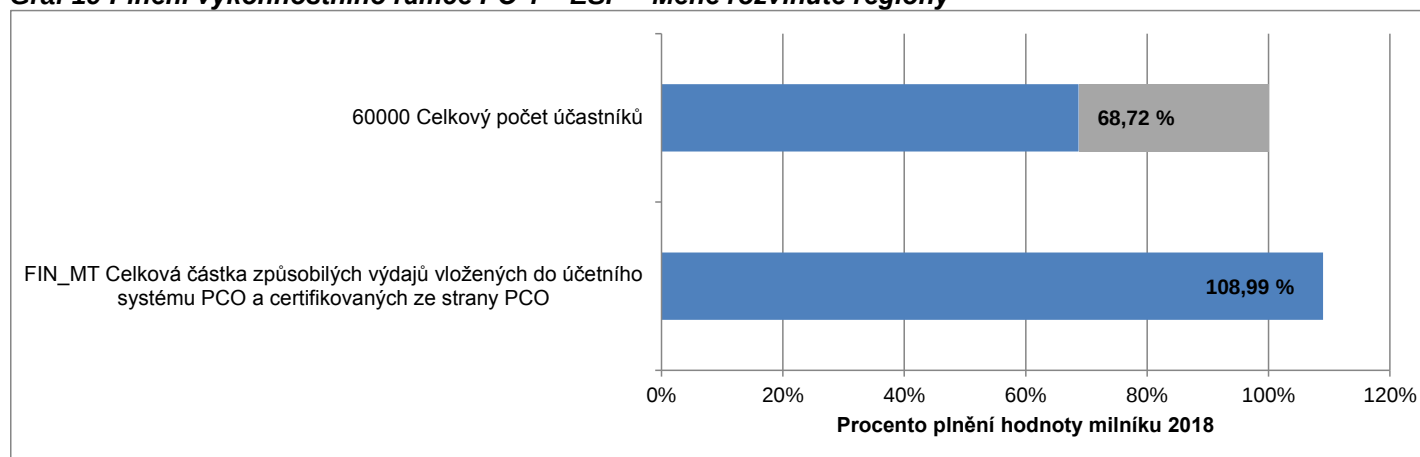


Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 20 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – ESF – Více rozvinuté regiony

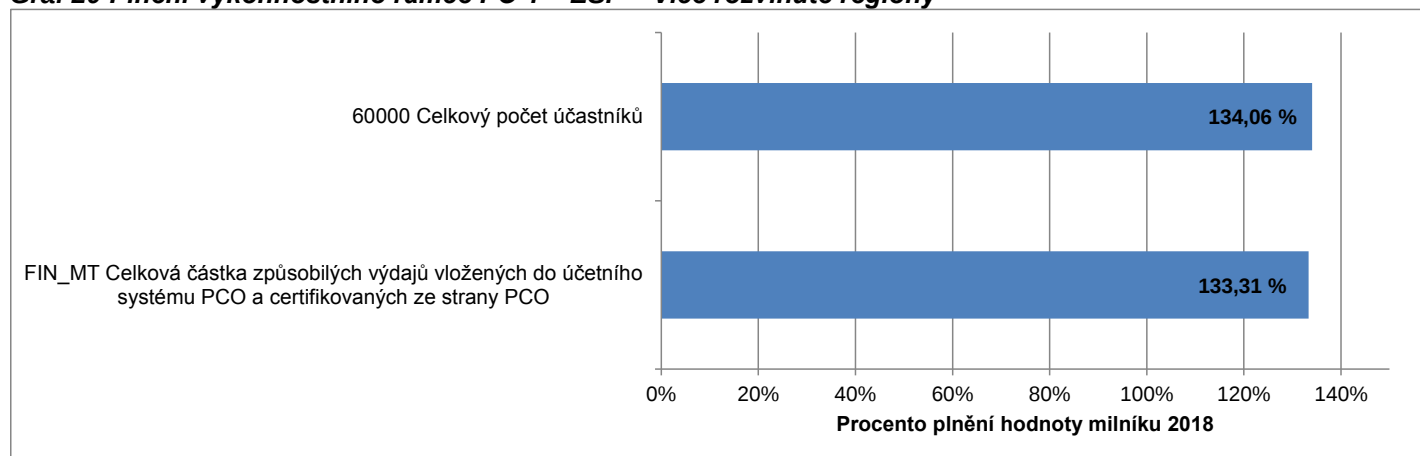


Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – YEI

Graf 21 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – YEI

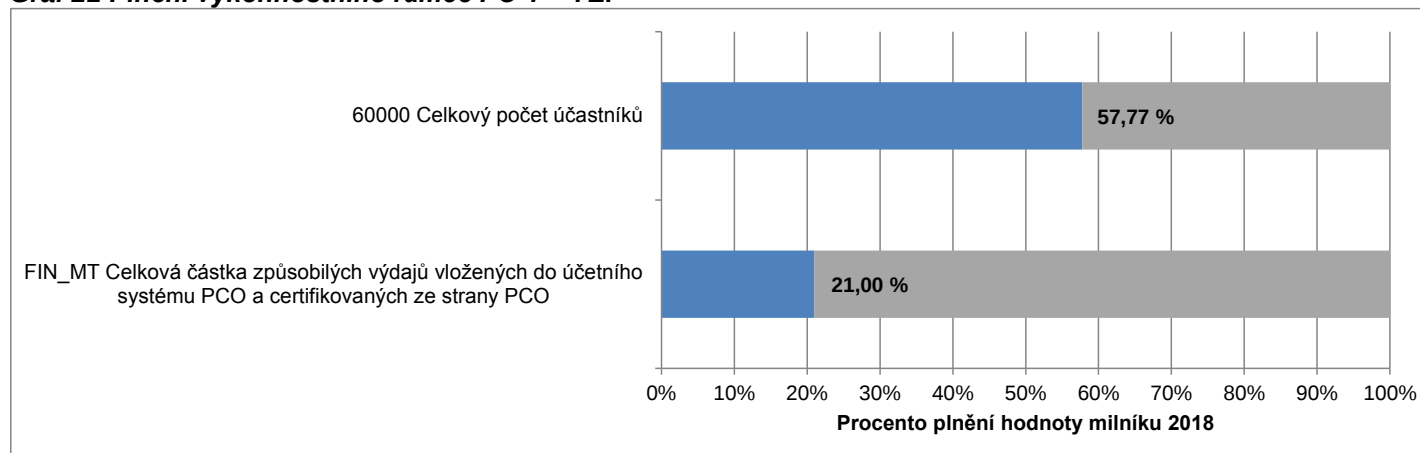


Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 22 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – ESF – Méně rozvinuté regiony

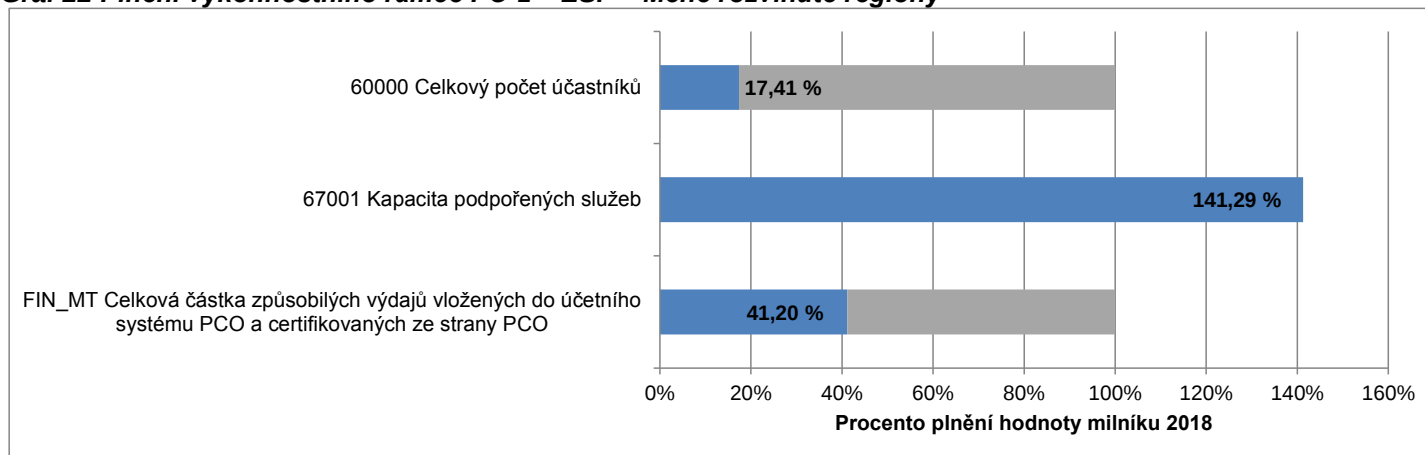


Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 23 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – ESF – Více rozvinuté regiony

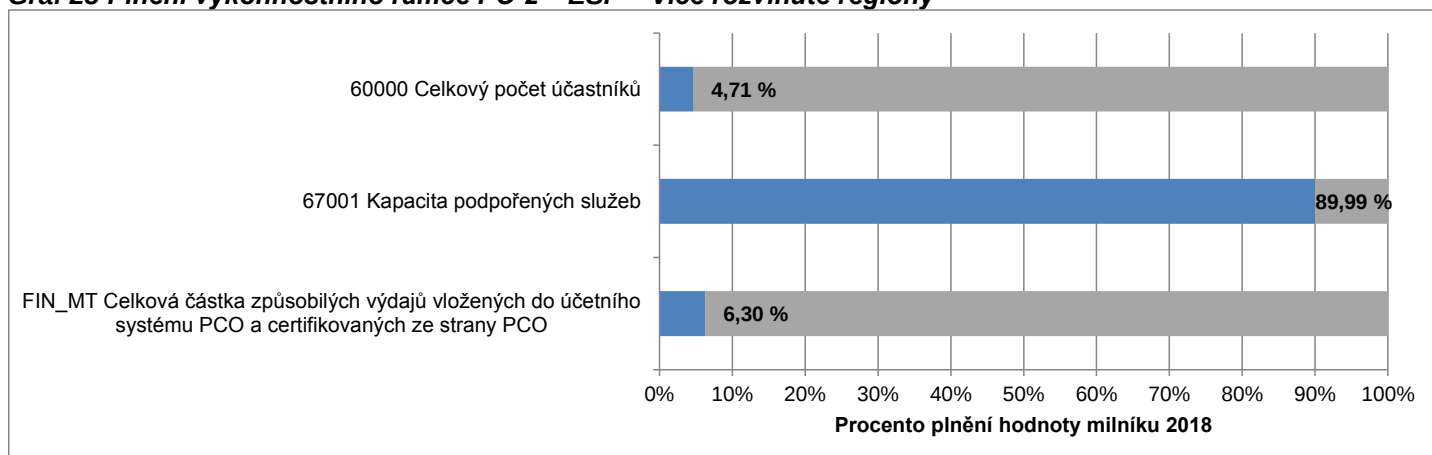


Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 24 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Méně rozvinuté regiony

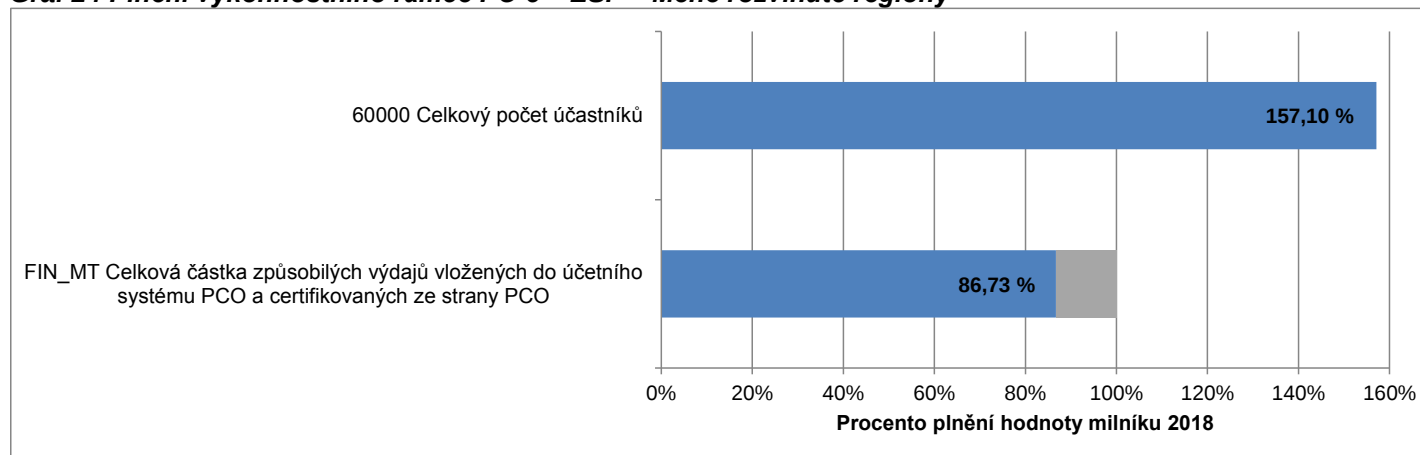


Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 25 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Více rozvinuté regiony

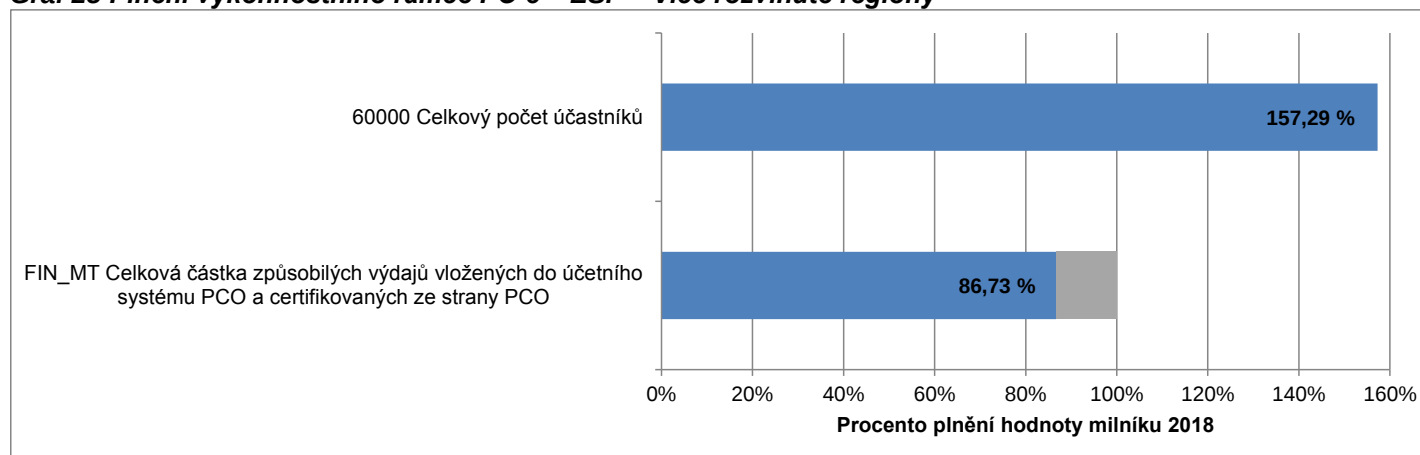


Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 26 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – ESF – Méně rozvinuté regiony

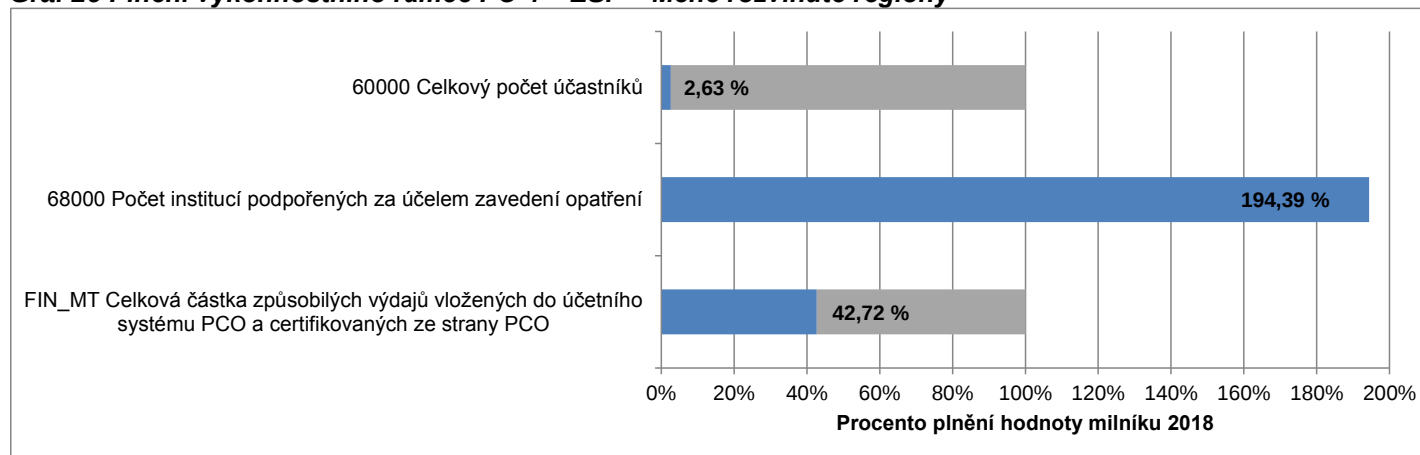

Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 27 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – ESF – Více rozvinuté regiony

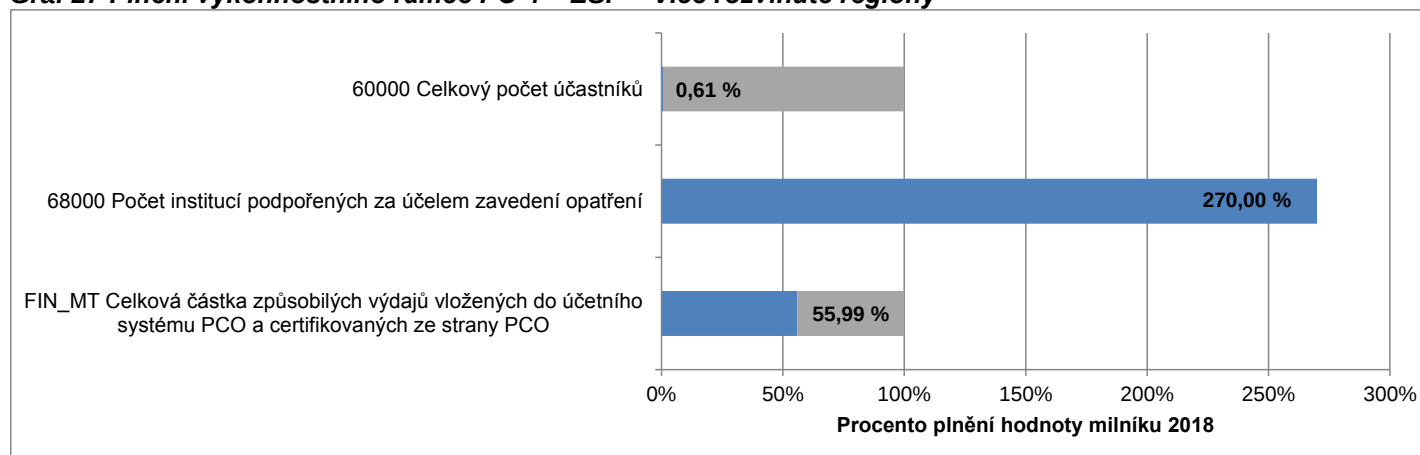

5.4 Operační program Doprava

5.4.1 Zaměření

OP Doprava (OP D) představuje v programovém období 2014–2020 hlavní nástroj pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo dopravy, zprostředkujícím subjektem Státní fond dopravní infrastruktury.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.opd.cz/>.

Tabulka 13 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	51,0
04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	27,5
04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	19,8
04.4 Technická pomoc	1,6

5.4.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2017 vyhlásil Řídicí orgán OP D 37 výzev v objemu 142,7 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 130,9 % hlavní alokace. Pokrok za čtvrté čtvrtletí roku 2017 představuje 7 vyhlášených výzev o objemu 1,3 mld. Kč (příspěvek EU). Alokace vyhlášených výzev směřovala zvláště na modernizaci kolejových vozidel (výměna brzdových špalíků, vybavování vozidel ETCS a GSM-R jednotkami atd.) Dále pak jedna výzva směřovala k podpoře rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic pro alternativní pohony. Podrobnosti k výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://web.opd.cz/vyzvy/>.

5.4.3 Finanční čerpání


Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 bylo v OP D uzavřeno 15 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 2,2 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 2,0 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2017 v OP D uzavřeno 94 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 55,1 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 50,6 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2017 bylo proplaceno 27,8 mld. Kč, tedy 25,5 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 4,9 mld. Kč, tedy 4,5 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 22,0 mld. Kč, tj. 20,2 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 4,9 mld. Kč, tj. 4,5 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci roku 2017 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 19,6 mld. Kč, tj. 17,4 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 4,8 mld. Kč, tj. 4,4 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory k 31. prosinci byl na prioritní ose 2 *Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu*, k uvedenému datu bylo v tomto finančním stavu 93,3 % hlavní alokace této prioritní osy. Naopak nejmenší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl ke sledovanému datu vykázán na prioritní ose 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T*, kde tento finanční stav dosáhl hodnoty 31,8 % hlavní alokace této prioritní osy.

Stav čerpání OP D k 31. prosinci 2017 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání na úrovni jednotlivých prioritních os je uveden v tabulce č. 14.

Graf 28 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Doprava v mld. CZK k 31. 12. 2017

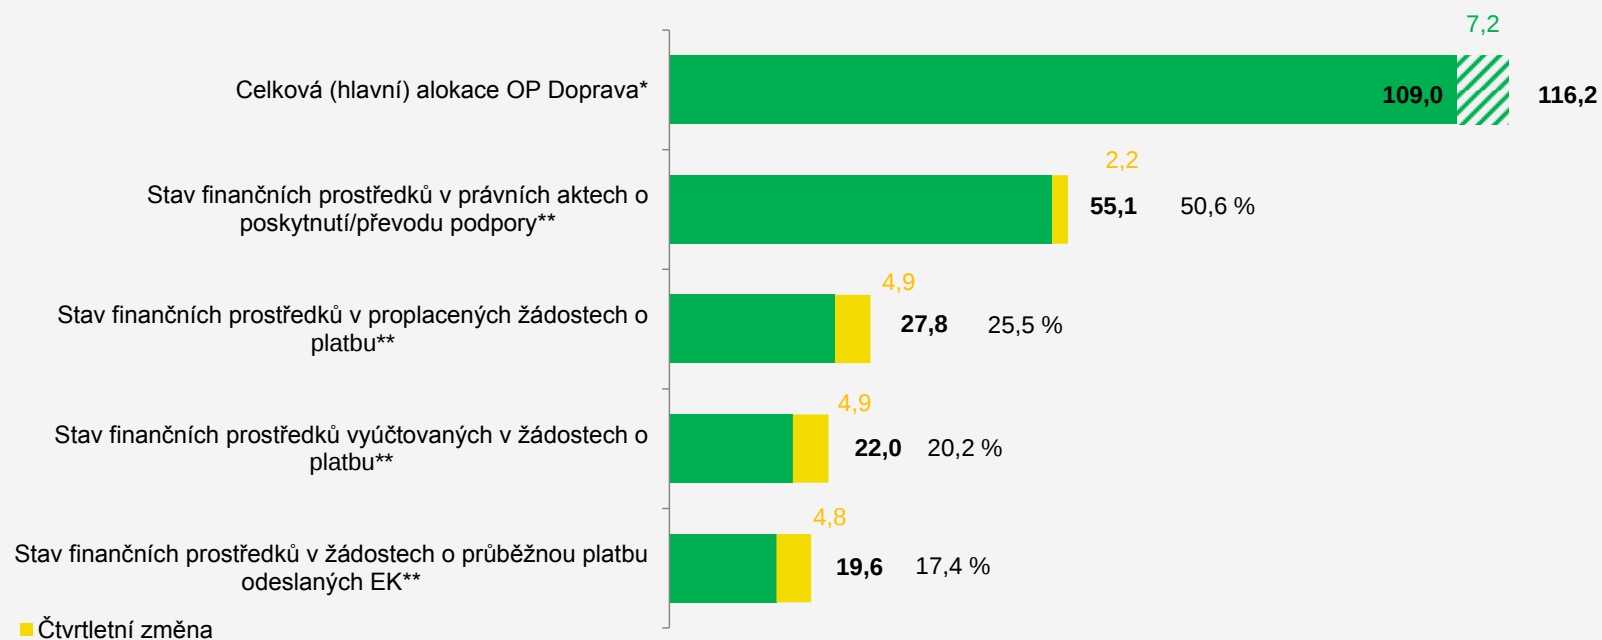

* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 14 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	G	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
04.1	FS	Nerelevantní	55 573	127	49 534	89,13	49	18 984	34,00	13 258	23,86	11 447	20,60	11 037	19,86
04.2	FS	Nerelevantní	30 015	39	38 651	128,77	24	28 000	93,29	9 714	32,36	6 668	22,22	5 208	17,35
04.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	21 606	25	10 484	48,52	18	6 880	31,84	4 759	22,03	3 792	17,55	3 463	16,03
04.4	FS	Nerelevantní	1 794	3	1 351	75,30	3	1 351	75,30	71	3,95	91	5,07	71	3,95
04	EFRR	Méně rozvinuté regiony	21 606	25	10 484	48,52	18	6 880	31,84	4 759	22,03	3 792	17,55	3 463	16,03
04	FS	Nerelevantní	87 382	169	89 536	102,46	76	48 246	55,21	23 043	26,37	18 206	20,83	16 316	18,67
04	-	-	108 989	194	100 020	91,77	94	55 126	50,58	27 802	25,51	21 998	20,18	19 779	18,15

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

5.4.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce OP D k 31. prosinci 2017 dosáhl indikátor výkonnostního rámce 70100 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí na prioritní ose 1 *Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu*, který ke sledovanému datu vykázal plnění ve výši 104,3 % jeho cílové hodnoty. Naopak nulové plnění vykázal indikátor 70201 Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS na stejné prioritní ose.

Tabulka č. 15 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP D.

Tabulka 15 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
04.1	70100 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	140	224,8	146,0	104,29
04.1	70201 Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	930	412,8	0	0
04.2	72200 Celková délka nově postavených silnic	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	95	90,2	19,4	25,87
04.2	72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	48	66,3	13,6	20,00
04.3	72200 Celková délka nově postavených silnic	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet kilometrů	0	28	44,8	9,9	35,36
04.3	72302 Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TEN-T	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet kilometrů	0	12	21,6	7,9	65,83

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.4.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění finančního milníku bylo dosaženo na prioritní ose 1 *Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu*, zde byl finanční milník plněn na 103,7 % jeho hodnoty. Finanční milník na prioritní ose 2 *Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu* byl plněn na 91,4 % jeho hodnoty, finanční milník na prioritní ose 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T* byl plněn na 86,2 % jeho hodnoty.

Z hlediska věcných milníků bylo k 31. prosinci 2017 dosaženo nejvyšší hodnoty plnění u jednoho věcného milníku na prioritní ose 1 *Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu*, kde byl jeden z věcných milníků plněn na 365,0 % jeho hodnoty. Zároveň na této prioritní ose bylo dosaženo i nejnižší hodnoty plnění, kdy druhý věcný milník této prioritní osy vykázal nulovou hodnotu plnění ke sledovanému datu. Ostatní věcné milníky vykázaly plnění v rozsahu od 61,8 % do 197,5 % hodnot jednotlivých věcných milníků.

Plnění finančních i věcných milníků na jednotlivých prioritních osách OP D k 31. prosinci 2017 ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Graf 29 Plnění výkonnostního rámce PO 1

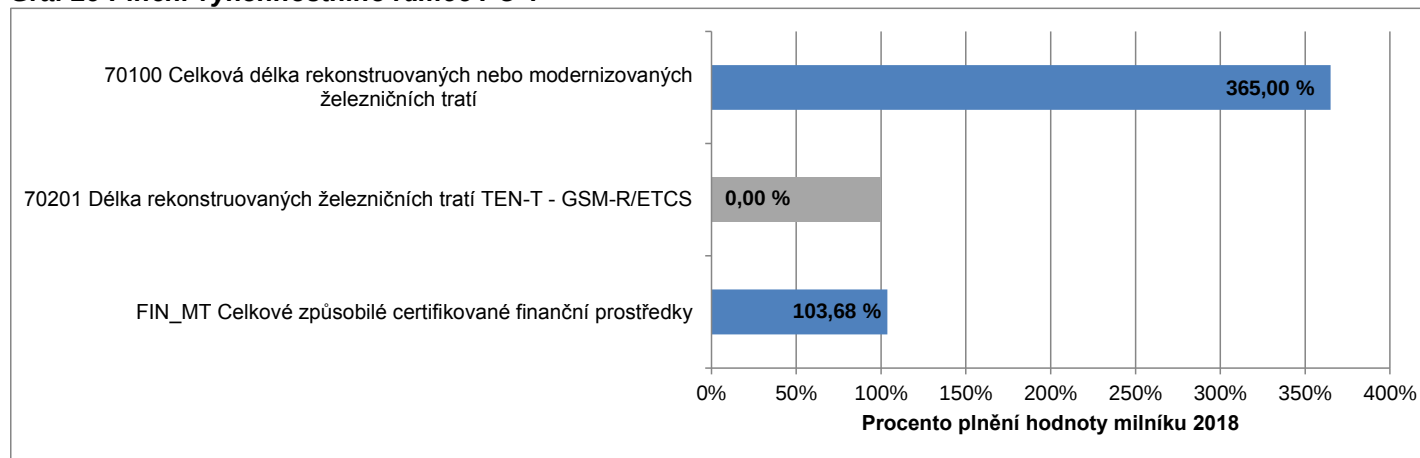


Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

Graf 30 Plnění výkonnostního rámce PO 2

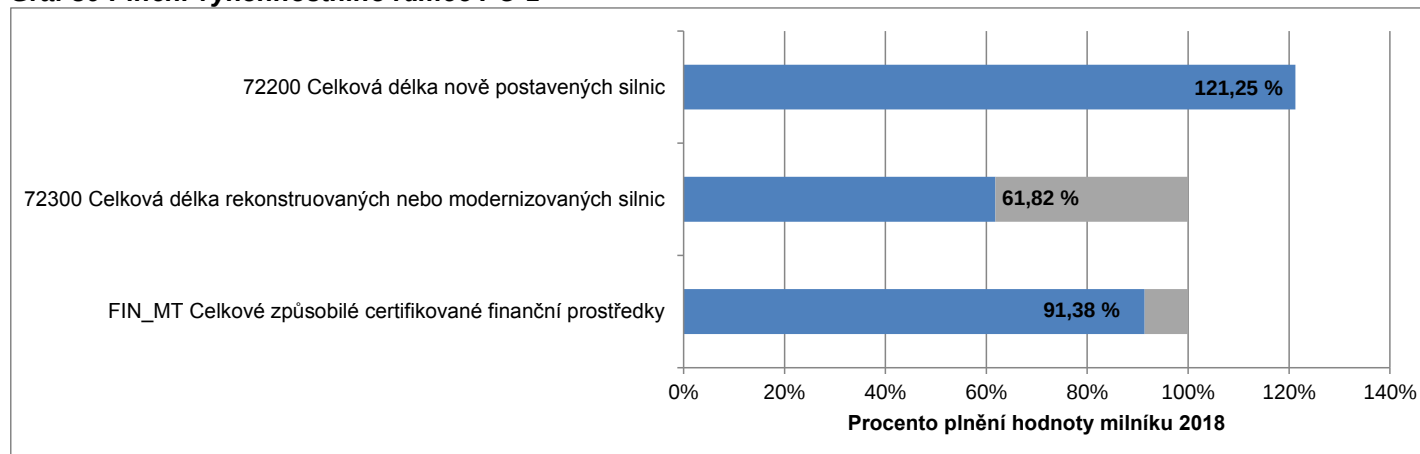

Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Graf 31 Plnění výkonnostního rámce PO 3

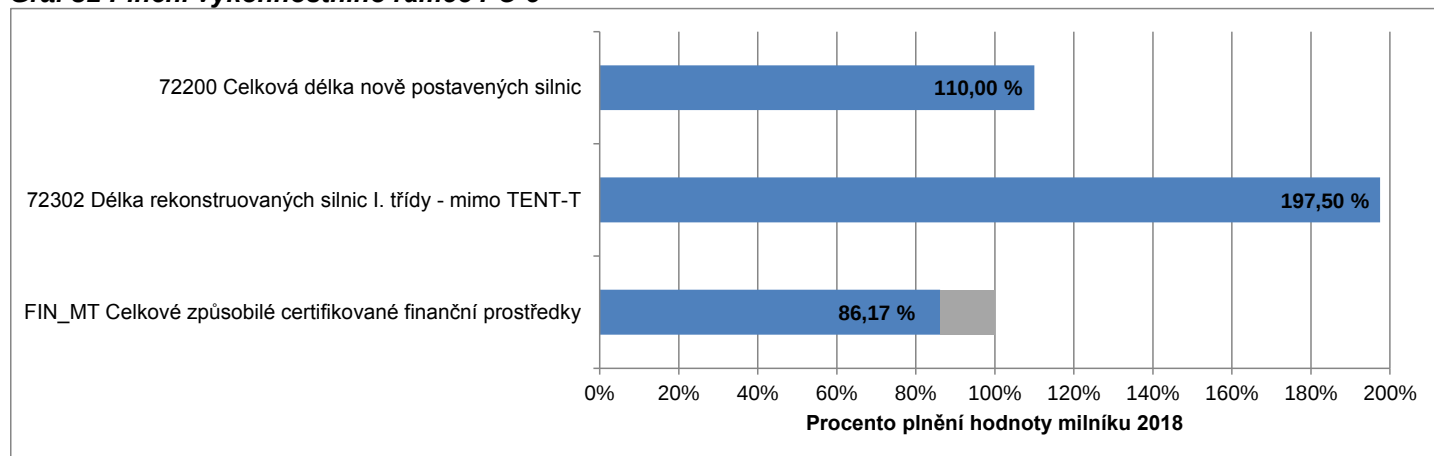

5.5 Operační program Životní prostředí

5.5.1 Zaměření

Hlavním cílem OP Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4, kde je zprostředkujícím subjektem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.opzp.cz.

Tabulka 16 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní	28,6
05.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech	18,3
05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	17,1
05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu	13,2
05.5 Energetické úspory	19,8
05.6 Technická pomoc	2,9

5.5.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2017 vyhlásil Řídicí orgán OP ŽP 93 výzev v objemu 61,5 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 96,3 % hlavní alokace. Pokrok za čtvrté čtvrtletí roku 2017 představuje 6 vyhlášených výzev s objemem 1,3 mld. Kč (příspěvek EU). Alokace vyhlášených výzev směřovala zvláště na podporu aktivit zaměřených na ochranu a péči o přírodu a krajinu v podobě posílení biodiverzity, posílení přirozené funkce krajiny a zlepšení kvality prostředí v sídlech. Dále ve vyhlášených výzvách byla podpořena preventivní protipovodňová opatření, zajištění povodňové ochrany intravilánu a dokončení inventarizace a odstranění staré ekologické zátěže. Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://www.opzp.cz/vyzvy>.

5.5.3 Finanční čerpání


Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 bylo v OP ŽP uzavřeno 375 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 2,4 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 3,7 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2017 v OP ŽP uzavřeno 3 252 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 26,9 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 42,1 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2017 bylo proplaceno 9,0 mld. Kč, tedy 14,0 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 2,5 mld. Kč, tedy 3,8 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 6,6 mld. Kč, tj. 10,4 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 2,8 mld. Kč, tj. 4,3 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci roku 2017 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 5,2 mld. Kč, tj. 8,0 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 2,3 mld. Kč, tj. 3,5 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 31. prosinci 2017 vykázán v rámci OP ŽP na prioritní ose 2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech*, kde tento finanční stav dosahuje 75,2 % hlavní alokace této prioritní osy. Nejnižší podíl, respektive nulový podíl, byl k uvedenému datu vykázán na prioritní ose 5 *Energetické úspory (EFRR)*.

Stav čerpání OP ŽP k 31. prosinci 2017 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání OP ŽP po jednotlivých prioritních osách, v dělení dle fondů, je uveden v tabulce č. 17.

Graf 32 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Životní prostředí v mld. CZK k 31. 12. 2017

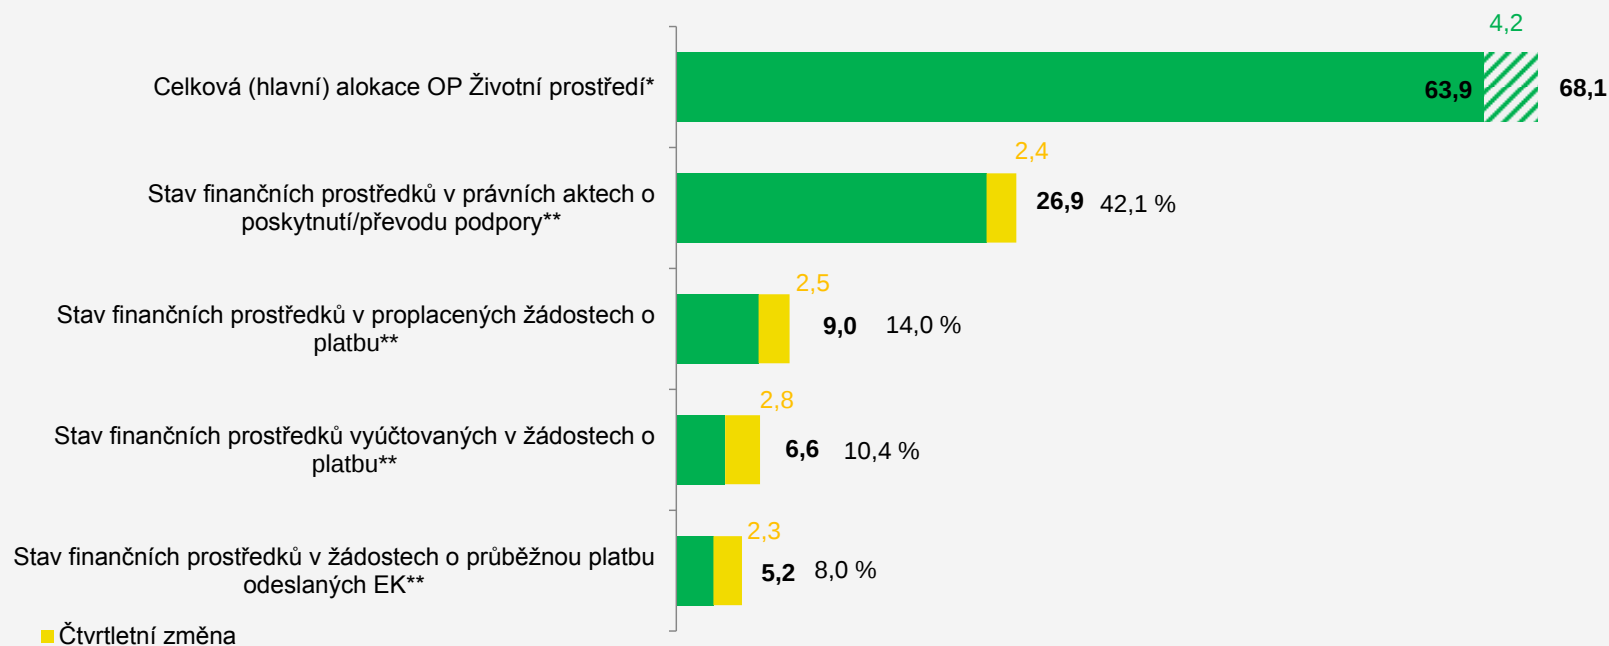

* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztážen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 17 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
05.1	FS	Nerelevantní	18 285	1 083	14 304	78,23	716	9 689	52,99	1 628	8,90	1 624	8,88	1 246	6,82
05.2	FS	Nerelevantní	11 697	308	12 121	103,63	155	8 798	75,21	5 395	46,12	3 059	26,15	2 924	25,00
05.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	553	25	393	71,09	5	48	8,62	36	6,50	36	6,50	28	5,04
05.3	FS	Nerelevantní	10 386	2 461	9 649	92,91	1 030	3 621	34,87	979	9,43	977	9,41	748	7,21
05.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	8 422	1 225	6 218	73,83	463	1 196	14,21	114	1,35	114	1,35	75	0,90
05.5	EFRR	Méně rozvinuté regiony	479	3	134	28,05	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05.5	FS	Nerelevantní	12 147	1 822	6 955	57,26	842	2 309	19,01	334	2,75	338	2,78	151	1,24
05.6	FS	Nerelevantní	1 881	49	1 476	78,51	41	1 220	64,85	469	24,96	469	24,96	469	24,96
05	FS	Nerelevantní	54 396	5 678	44 507	81,82	2 784	25 636	47,13	8 805	16,19	6 468	11,89	5 539	10,18
05	EFRR	Méně rozvinuté regiony	9 454	1 253	6 745	71,35	468	1 244	13,16	150	1,59	150	1,59	103	1,09
05	-	-	63 850	6 931	51 252	80,27	3 252	26 880	42,10	8 955	14,03	6 618	10,36	5 643	8,84

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.5.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty bylo u indikátorů výkonnostního rámce OP ŽP dosaženo k 31. prosinci 2017 v případě indikátoru 43200 *Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním* na prioritní ose 1 *Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní*, tento indikátor vykázal plnění ve výši 50,0 % jeho cílové hodnoty. Naopak nulové plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu vykázal indikátor 44101 *Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu* na prioritní ose 3 *Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika* a indikátor 32705 *Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby* na prioritní ose 5 *Energetické úspory*.

Tabulka č. 18 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP ŽP.

Tabulka 18 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
05.1	42205 Nárhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV	FS	Nerelevantní	Ekvivalentní obyvatelé	0	80 000	231 199,0	16 640,0	20,80
05.1	43200 Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním	FS	Nerelevantní	Osoby	0	80 000	208 627,0	40 026,0	50,03
05.2	36101 Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	FS	Nerelevantní	Stacionární zdroje	0	80 400	55 350,0	10 537,0	13,11
05.3	40102 Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů	FS	Nerelevantní	tuny za rok	0	2 000 000	93 385,1	2 365,0	0,12
05.3	40103 Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů	FS	Nerelevantní	tuny za rok	0	400 000	120 891,7	6 909,8	1,73
05.3	44101 Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu	FS	Nerelevantní	Plocha v m2	0	500 000	259 058,7	0	0
05.4	46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	EFRR	Méně rozvinuté regiony	ha	0	14 070	24 662,0	117,2	0,83
05.5	32701 Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	FS	Nerelevantní	GJ/rok	0	2 000 000	385 660,0	247,3	0,01
05.5	32705 Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Projekty	0	25	0	0	0

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.5.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšších hodnot plnění finančních milníků v rámci OP ŽP k 31. prosinci 2017 bylo dosaženo v případě prioritní osy 2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech*, zde byl finanční milník plněn na 139,4 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší hodnota, respektive nulová hodnota plnění věcného milníku byla ke sledovanému datu vykazována v případě prioritní osy 5 *Energetické úspory*, fond EFRR, kategorie méně rozvinuté regiony. Plnění zbývajících finančních milníků se pohybuje v rozsahu od 4,8 % do 38,8 % jejich hodnoty.

V případě věcných milníků bylo k 31. prosinci 2017 dosaženo nejvyšších hodnot plnění v rámci OP ŽP na prioritní ose 1 *Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní*, kdy plnění dvou věcných milníků na této prioritní ose dosáhlo 181,9 % a 83,2 % jejich hodnoty. Naopak nulová hodnota plnění věcného milníku byla identifikována v případě prioritní osy 5 *Energetické úspory*, fond EFRR, kategorie méně rozvinuté regiony, nulovou hodnotu plnění vykazuje i jeden z věcných milníků na prioritní ose 3 *Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika*, fond FS. Ostatní věcné milníky vykazují ke sledovanému datu plnění v rozsahu od 0,05 % do 52,7 % jejich hodnoty.

Plnění jednotlivých finančních i věcných milníků na jednotlivých prioritních osách OP ŽP k 31. prosinci 2017 ilustrují níže uvedené grafy.


Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Graf 33 Plnění výkonnostního rámce PO 1

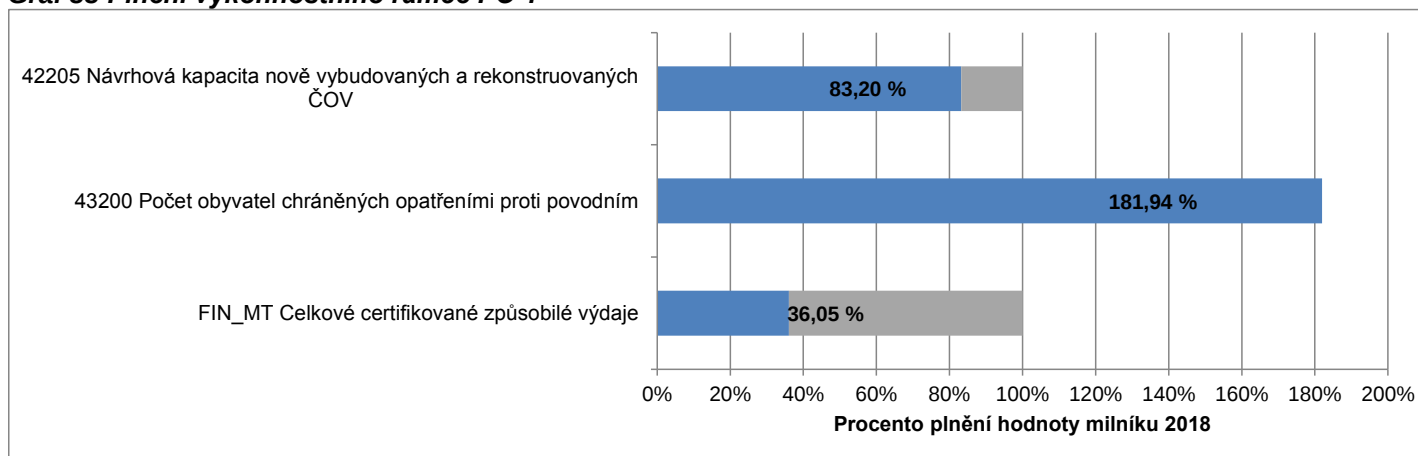


Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Graf 34 Plnění výkonnostního rámce PO 2

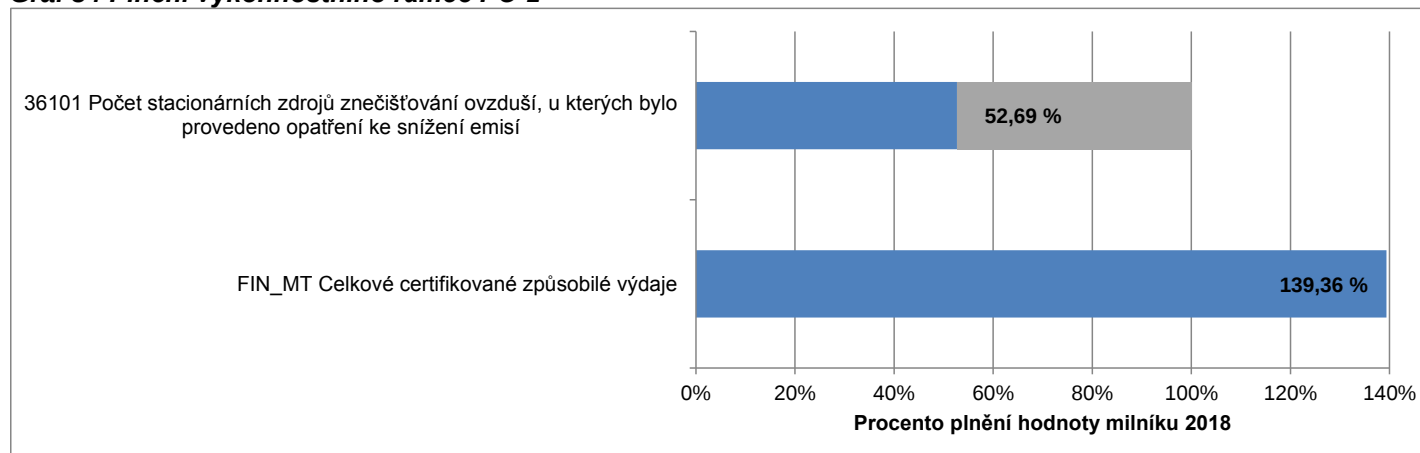


Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 35 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR – Méně rozvinuté regiony

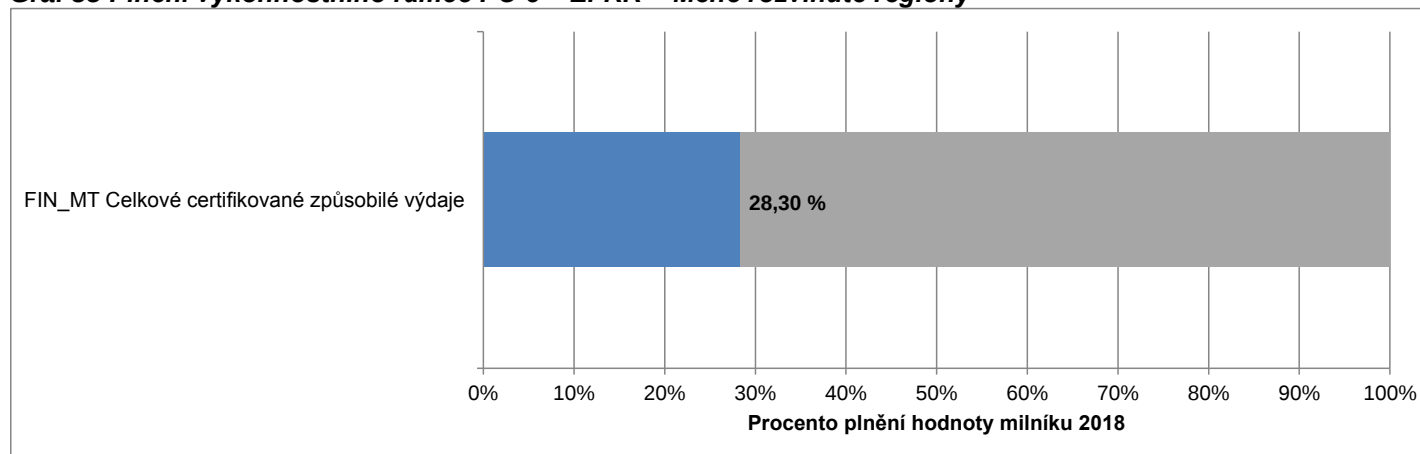


Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – FS

Graf 36 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – FS

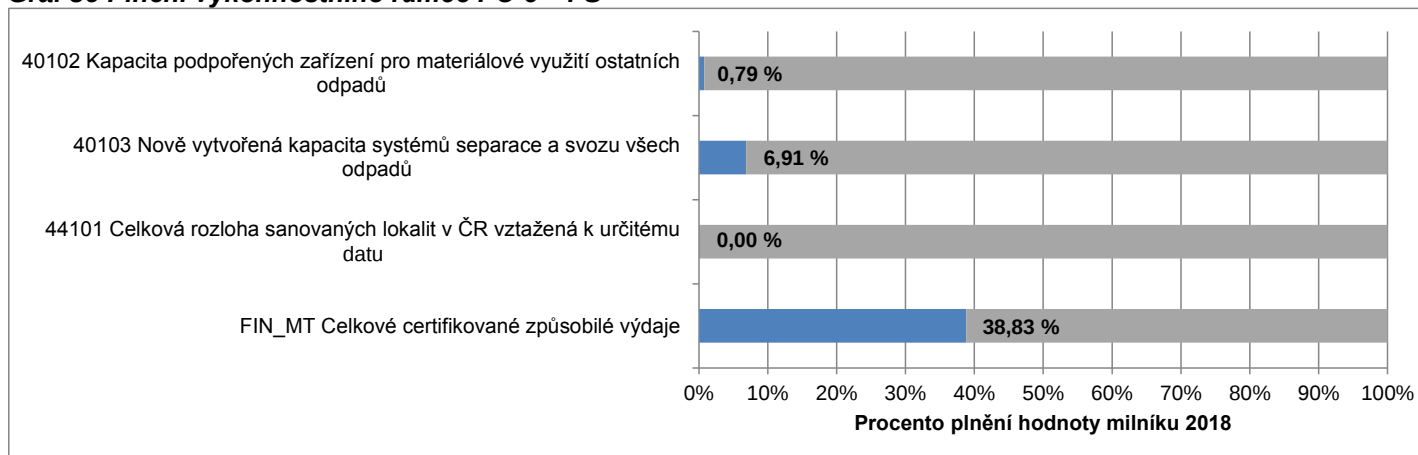


Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Graf 37 Plnění výkonnostního rámce PO 4

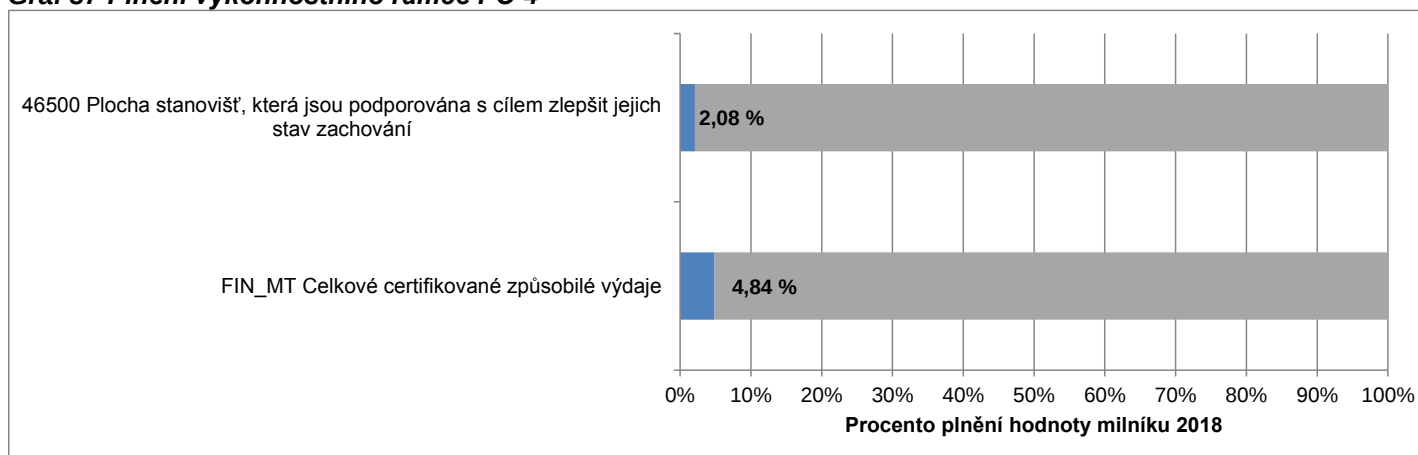

Prioritní osa 5 Energetické úspory - FS

Graf 38 Plnění výkonnostního rámce PO 5 – FS

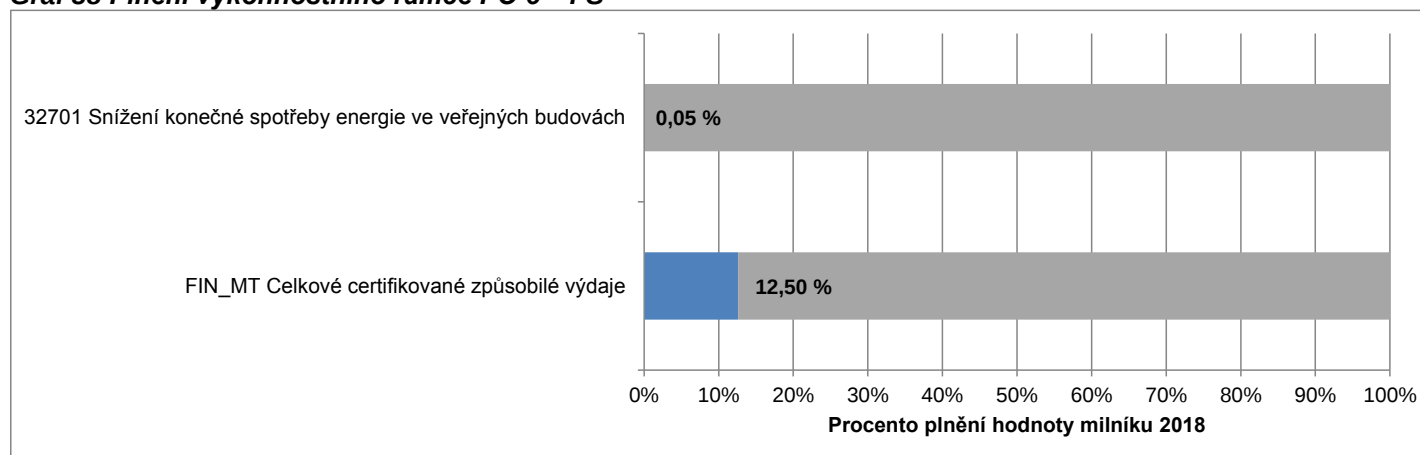

Prioritní osa 5 Energetické úspory – EFRR – Méně rozvinuté regiony

K 31. prosinci 2017 je plnění věcných i finančních milníků na této prioritní ose / fondu / kategorii regionů nulové.

5.6 Integrovaný regionální operační program

5.6.1 Zaměření

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Zprostředkujícími subjekty jsou: Centrum pro regionální rozvoj ČR, dále pro realizaci nástroje ITI jsou to: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.dotaceEU.cz/irop.

Tabulka 19 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony	33,7
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	37,5
06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí	17,2
06.4 Komunitně vedený místní rozvoj	8,4
06.5 Technická pomoc	3,2

5.6.2 Přehled vyhlášených výzev

K. 31. prosinci 2017 vyhlásil Řídicí orgán IROP 77 výzev v objemu 114,3 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 102,8 % hlavní alokace programu. Pokrok za čtvrté čtvrtletí roku 2017 je 1 vyhlášená výzva, která je zaměřena na podporu deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. Objem vyhlášených výzev se zvýšil o 2,0 mld. Kč (příspěvek EU). Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy>.


5.6.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 bylo v IROP uzavřeno 586 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 8,6 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 7,7 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2017 v IROP uzavřeno 2 920 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 46,5 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 41,9 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2017 bylo proplaceno 3,0 mld. Kč, tedy 2,7 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 1,4 mld. Kč, tedy 1,3 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 3,2 mld. Kč, tj. 2,8 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 1,3 mld. Kč, tj. 1,1 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci roku 2017 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 3,0 mld. Kč, tj. 2,6 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 2,0 mld. Kč, tj. 1,8 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 31. prosinci 2017 vykázán v rámci IROP na prioritní ose 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, v kategorii méně rozvinutých regionů, kde tento finanční stav dosahuje 48,6 % hlavní alokace této prioritní osy. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritní ose 4 *Komunitně vedený místní rozvoj*, kde hodnota tohoto podílu byla 12,7 % alokace této prioritní osy.

Stav čerpání IROP k 31. prosinci 2017 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání IROP na úrovni jednotlivých prioritních os, v dělení dle kategorií regionů, je uveden v tabulce č. 20.

Graf 39 Stav čerpání programu

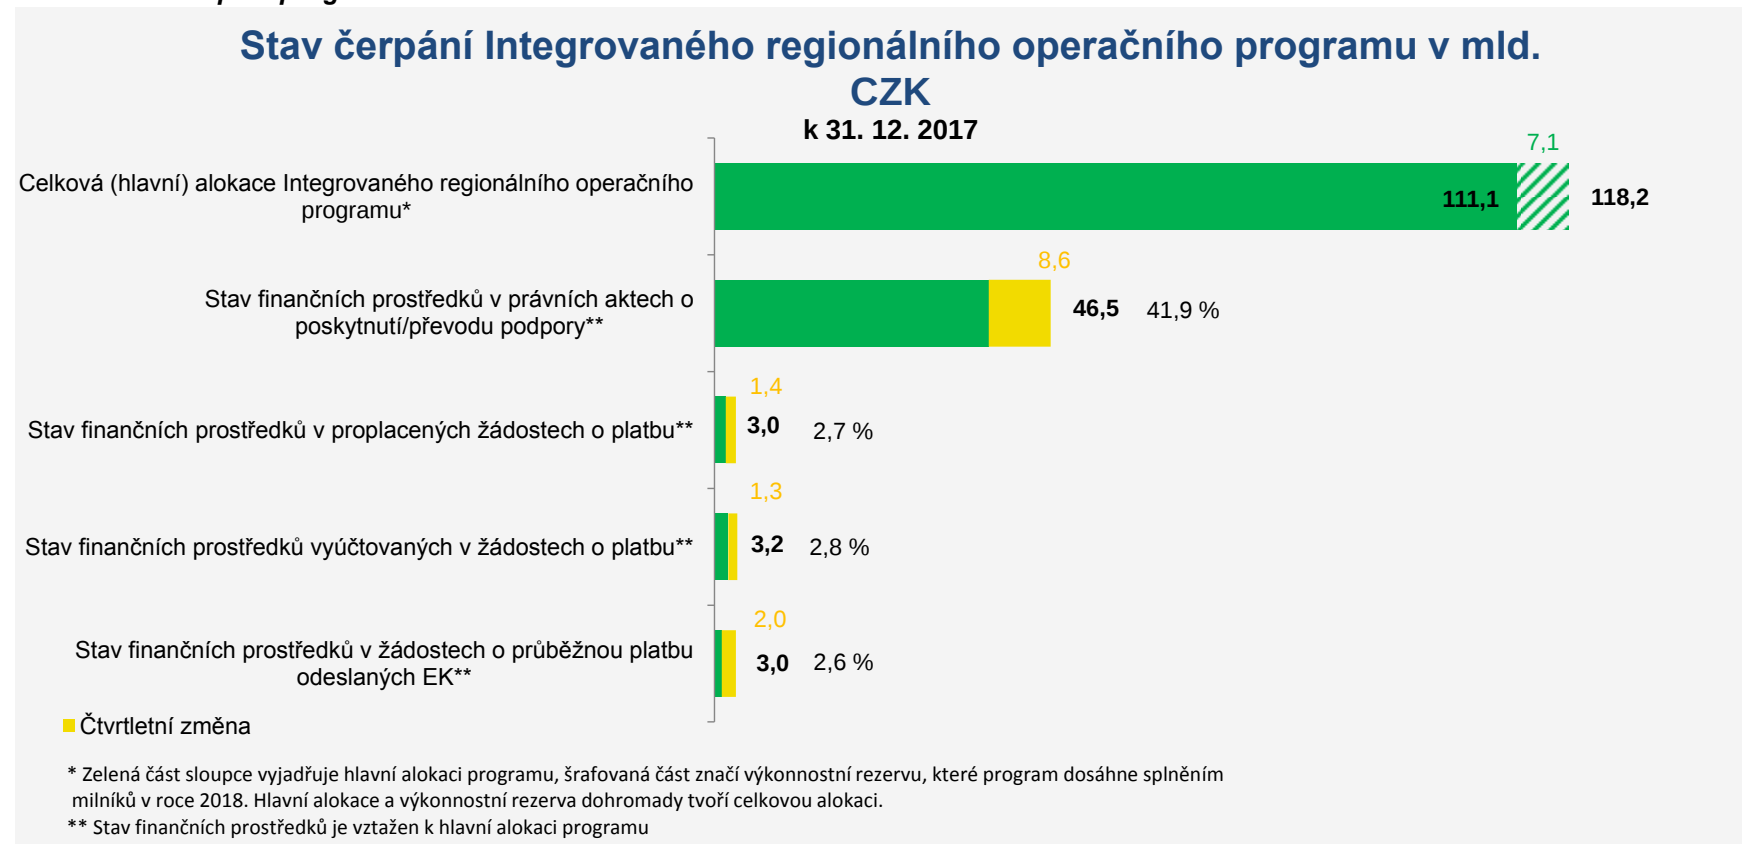

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 20 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
06.1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	37 476	1 301	34 223	91,32	614	16 330	43,57	1 818	4,85	1 962	5,23	1 750	4,67
06.2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	41 635	4 479	44 556	107,02	1 658	18 383	44,15	561	1,35	612	1,47	524	1,26
06.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	18 588	984	25 298	136,10	457	9 036	48,61	68	0,37	76	0,41	66	0,36
06.3	EFRR	Více rozvinuté regiony	578	113	1 018	176,09	17	192	33,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	9 310	791	3 000	32,23	169	1 185	12,72	130	1,40	130	1,40	125	1,34
06.5	EFRR	Méně rozvinuté regiony	3 538	31	1 774	50,16	22	1 391	39,31	376	10,62	376	10,62	376	10,62
06	EFRR	Méně rozvinuté regiony	110 546	7 586	108 852	98,47	2 920	46 324	41,91	2 953	2,67	3 156	2,85	2 840	2,57
06	EFRR	Více rozvinuté regiony	578	113	1 018	176,09	17	192	33,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06	EFRR		111 124	7 587	109 870	98,87	2 920	46 516	41,86	2 953	2,66	3 156	2,84	2 840	2,56

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond kategorií regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

5.6.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty u indikátorů výkonnostního rámce bylo k 31. prosinci 2017 dosaženo u indikátoru 90001 *Počet podpořených strategií CLLD* na prioritní ose 4 *Komunitně vedený místní rozvoj*, indikátor k uvedenému datu vykázal plnění ve výši 111,3 % jeho cílové hodnoty. Naopak nulové plnění cílové hodnoty bylo ke sledovanému datu vykázáno u indikátoru 75201 *Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě* na prioritní ose 1 *Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony* a u indikátoru 90501 *Počet revitalizovaných památkových objektů* na prioritní ose 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*.

Tabulka č. 21 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce IROP.

Tabulka 21 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
06.1	57501 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Objekty	0	86	147,0	2,0	2,33
06.1	72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet kilometrů	0	729	332,5	51,6	7,08
06.1	74801 Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Vozidla	0	620	378,0	40,0	6,45
06.1	75201 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Terminály	0	100	26,0	0	0
06.2	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	383	41,0	4,0	1,04
06.2	32401 Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Domácnosti	0	123 000	19 145,0	3 453,0	2,81
06.2	50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Zařízení	0	1 550	596,0	26,0	1,68
06.2	55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Bytové jednotky	0	5 000	519,0	11,0	0,22
06.2	57805 Podpořená pracoviště zdravotní péče	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Pracoviště	0	83	98,0	2,0	2,41
06.3	30500 Počet pořízených informačních systémů	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet IS	0	96,6	306,4	0,9	0,93
06.3	30500 Počet pořízených informačních systémů	EFRR	Více rozvinuté regiony	Počet IS	0	7,4	3,1	0,1	1,35
06.3	90200 Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Dokumenty	0	255	384,0	35,0	13,73
06.3	90501 Počet revitalizovaných památkových objektů	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Objekty	0	90	69,0	0,0	0
06.4	90001 Počet podpořených strategií CLLD	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Strategie		160	178,0	178,0	111,25

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.6.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění finančního milníku v rámci IROP k 31. prosinci 2017 bylo dosaženo na prioritní ose 1 *Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony*, kde je finanční milník plněn na 26,5 % jeho hodnoty. Jediný finanční milník vykazuje k sledovanému datu nulové hodnoty plnění, konkrétně se jedná o finanční milník na prioritní ose 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, kategorie více rozvinuté regiony. Plnění ostatních finančních milníků se pohybuje v rozmezí do 2,2 % do 9,7 % hodnoty jednotlivých finančních milníků.

Z hlediska věcných milníků dosahuje v rámci IROP nejvyšší hodnoty plnění věcný milník na prioritní ose 4 *Komunitně vedený místní rozvoj*, který je vykazuje plnění 111,3 % hodnoty toho milníku. Na prioritních osách 1 *Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony* a 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, kategorie méně rozvinuté regiony jsou i věcné milníky, které k 31. prosinci 2017 vykazují nulové hodnoty plnění. Ostatní věcné milníky jsou v rámci IROP plněny v rozsahu 2,2 % až 77,8 % jejich hodnoty.

Plnění finančních a věcných milníků na jednotlivých prioritních osách IROP k 31. prosinci 2017 ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Graf 40 Plnění výkonnostního rámce PO 1

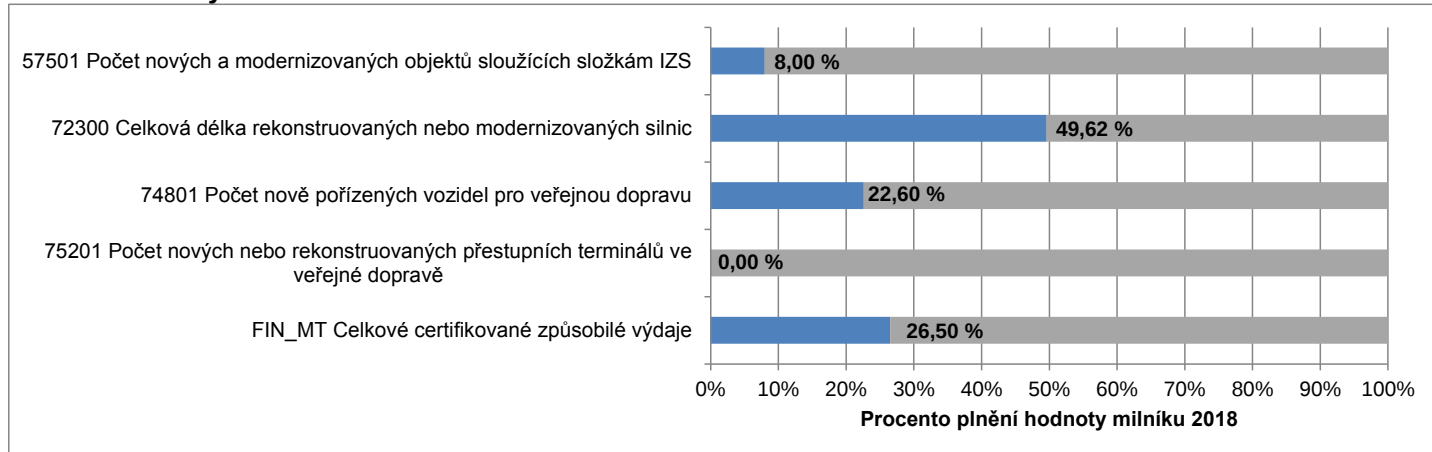


Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Graf 41 Plnění výkonnostního rámce PO 2

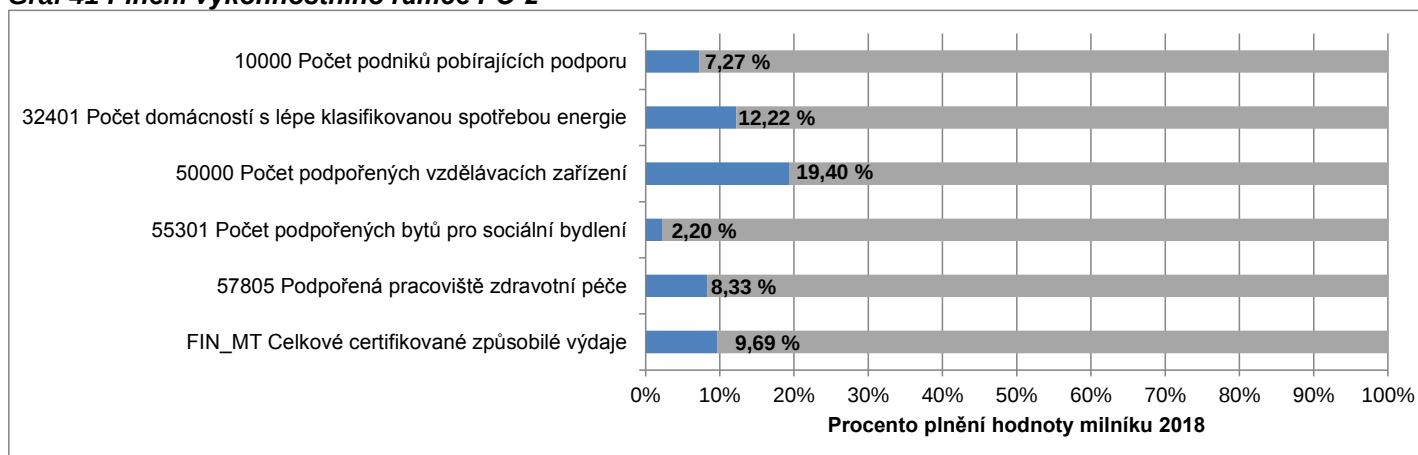


Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 42 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR - Méně rozvinuté regiony

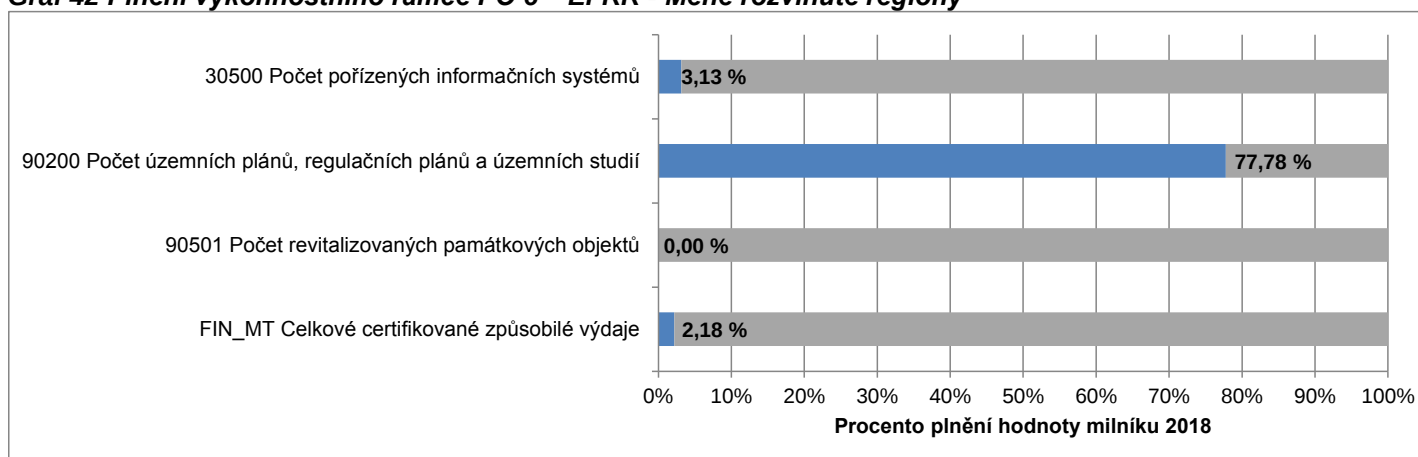


Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – EFRR – Více rozvinuté regiony

Graf 43 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR - Více rozvinuté regiony

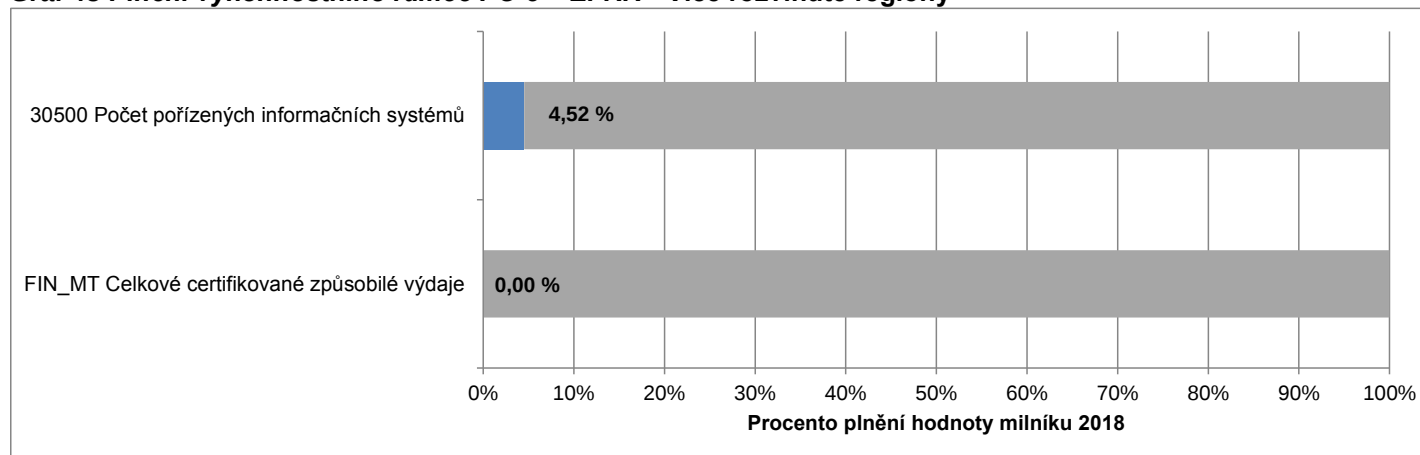

Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj

Graf 44 Plnění výkonnostního rámce PO 4

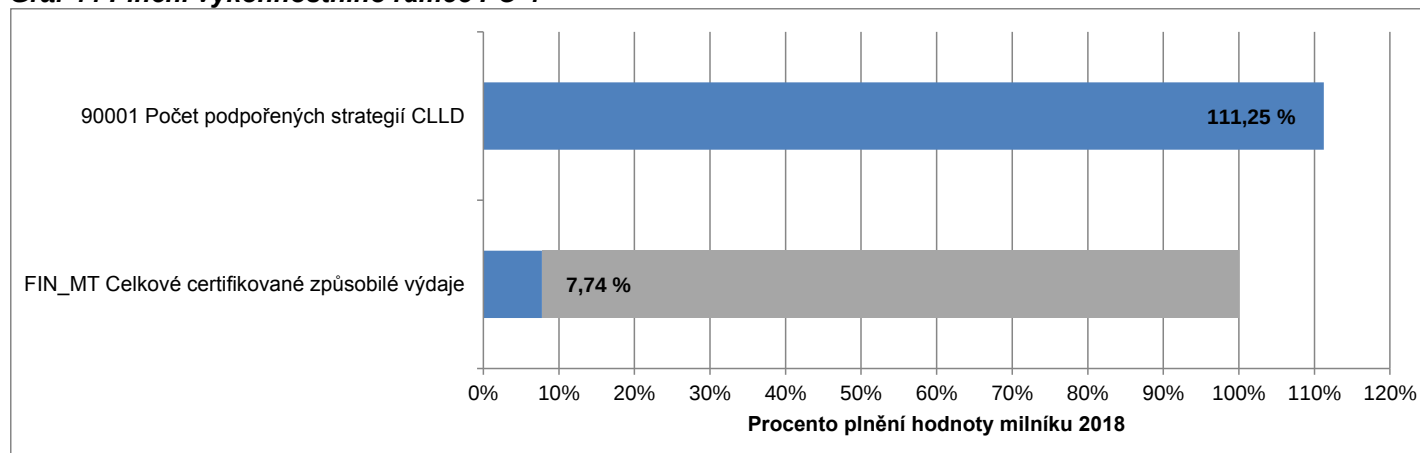

5.7 Operační program Praha - pól růstu ČR

5.7.1 Zaměření

Cílem OP Praha - pól růstu ČR (OP PPR) je zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel. Řídicím orgánem je Hlavní město Praha. Zprostředkujícím subjektem pro realizaci nástroje ITI je také Hlavní město Praha.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.prahafondy.eu/cz/opppr.html>.

Tabulka 22 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	31,0
07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	30,0
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	12,7
07.4 Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	22,0
07.5 Technická pomoc	4,3

5.7.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2017 vyhlásil Řídicí orgán OP PPR 39 výzev v objemu 5,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 119,5 % hlavní alokace. Pokrok za čtvrté čtvrtletí roku 2017 jsou 3 vyhlášené výzvy s objemem 0,3 mld. Kč (příspěvek EU). Nově vyhlášené výzvy podporují intervence v oblasti vytváření inkluzivního prostředí škol a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, navyšování kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti a dále zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách. Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://penizeproprahu.cz/vyzvy>.

5.7.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 bylo v OP PPR uzavřeno 98 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 0,6 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 12,7 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2017 v IROP uzavřeno 290 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 2,1 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 42,6 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2017 bylo proplaceno 0,5 mld. Kč, tedy 10,1 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 0,3 mld. Kč, tedy 5,3 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 0,1 mld. Kč, tj. 2,9 % hlavní

alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 0,1 mld. Kč, tj. 1,4 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci roku 2017 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 0,1 mld. Kč, tj. 1,8 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 0,04 mld. Kč, tj. 0,8 % hlavní alokace programu.


Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 31. prosinci 2017 vykázán v rámci OP PPR na prioritní ose 5 *Technická pomoc*, kde tento finanční stav dosahuje 114,1 % hlavní alokace této prioritní osy. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritní ose 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (EFRR)*, kde hodnota tohoto podílu byla 12,5 % alokace této prioritní osy.

Stav čerpání OP PPR k 31. prosinci 2017 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání jednotlivých prioritních os, v dělení dle fondů, je uveden v tabulce č. 23.

Graf 45 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Praha - pól růstu ČR v mld. CZK

k 31. 12. 2017

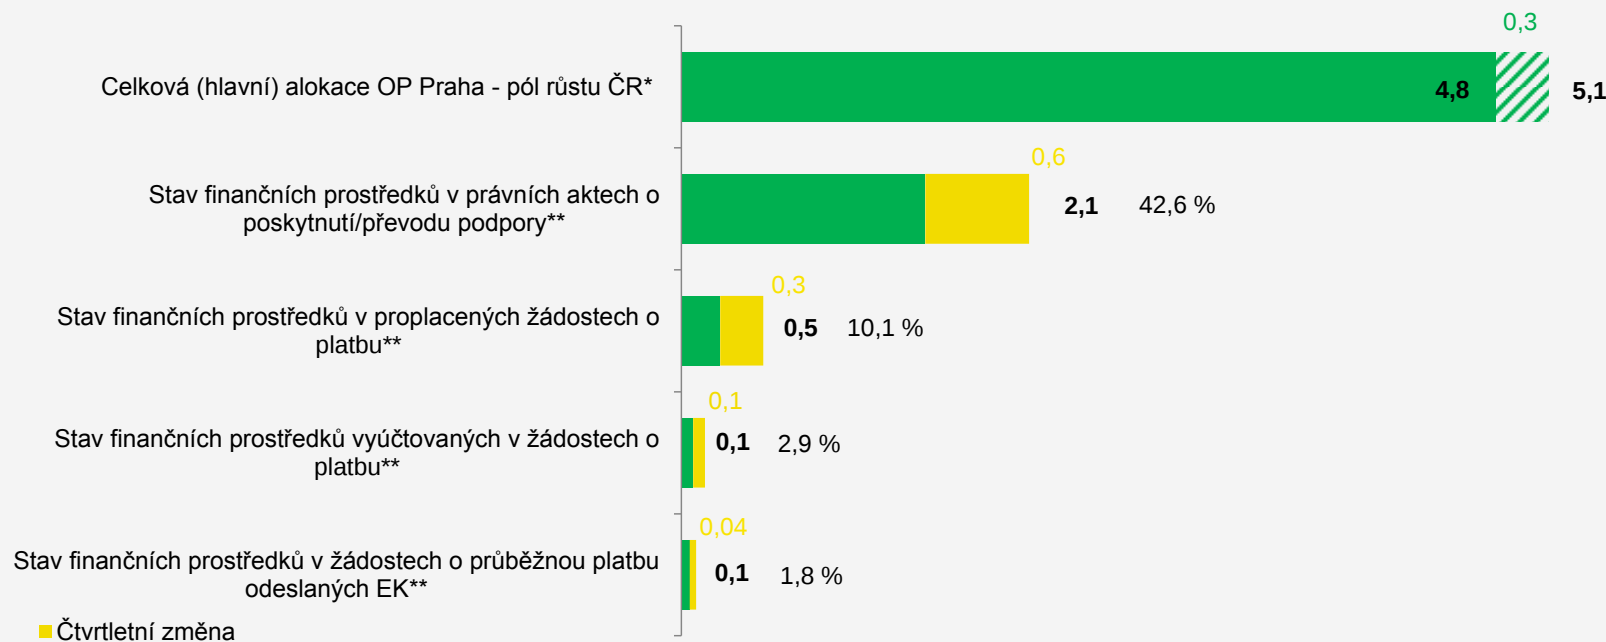

* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK

Tabulka 23 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
–	–	–	mil. CZK	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
07.1	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 496	66	1 194	79,79	39	689	46,05	183	12,23	9	0,59	9	0,59
07.2	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 448	20	606	41,87	16	439	30,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00
07.3	EFRR	Více rozvinuté regiony	299	56	179	59,85	16	37	12,46	14	4,80	3	1,01	3	1,01
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	314	127	284	90,41	82	175	55,84	70	22,33	17	5,32	16	5,08
07.4	EFRR	Více rozvinuté regiony	434	189	657	151,32	25	274	63,15	102	23,46	38	8,65	38	8,65
07.4	ESF	Více rozvinuté regiony	629	208	380	60,43	110	210	33,28	62	9,93	35	5,56	34	5,48
07.5	ESF	Více rozvinuté regiony	205	2	234	114,15	2	234	114,15	53	26,03	38	18,60	38	18,60
07	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 678	331	2 637	71,69	96	1 439	39,13	299	8,14	49	1,34	49	1,34
07	ESF	Více rozvinuté regiony	1 149	337	899	78,23	194	619	53,91	186	16,19	90	7,83	89	7,71
07	-	-	4 827	668	3 536	73,25	290	2 059	42,65	485	10,05	139	2,89	138	2,86

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.7.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty z indikátorů výkonnostního rámce OP PPR k 31. prosinci 2017 vykázal indikátor 50001 *Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení* na prioritní ose 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti*, indikátor vykázal plnění ve výši 15,0 % cílové hodnoty. Naopak nulové plnění cílové hodnoty indikátoru bylo ke sledovanému datu vykázáno u všech indikátorů výkonnostního rámce OP PPR na prioritních osách 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací*, 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory* a 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě* (v případě této prioritní osy je jedinou výjimkou indikátor 60000 *Celkový počet účastníků*, který vykázal nenulové plnění cílové hodnoty).

Tabulka č. 24 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP PPR.

Tabulka 24 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
07.1	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Více rozvinuté regiony	Podniky	0	300	483,0	0	0
07.1	20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	EFRR	Více rozvinuté regiony	Podniky	0	200	252,0	0	0
07.2	32500 Energeticky vztázná plocha zrenovovaných budov	EFRR	Více rozvinuté regiony	Plocha v m2	0	49 800	0	0	0
07.2	74001 Počet vytvořených parkovacích míst	EFRR	Více rozvinuté regiony	Parkovací místa	0	1 500	0	0	0
07.3	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Více rozvinuté regiony	Podniky	0	30	0	0	0
07.3	55201 Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	EFRR	Více rozvinuté regiony	Zařízení	0	42	6,0	0	0
07.3	55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	EFRR	Více rozvinuté regiony	Zázemí	0	112	3,0	0	0
07.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	26 500	5 047,0	79,0	0,30
07.4	50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	3 200	2 912,0	481,0	15,03
07.4	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	6 351	3 859,0	341,0	5,37

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.7.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšších hodnot plnění k 31. prosinci 2017 dosahují finanční milníky na prioritní ose 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti*, finanční milník je za fond EFRR plněn na 36,6 %, za fond ESF je finanční milník plněn na 25,1 % jeho hodnoty. Ostatní hodnoty plnění finančních milníků jsou nízké, finanční milník na prioritní ose 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě* je plněn za fond ESF na 11,5 %, za fond EFRR pouze na 1,5 % jeho hodnoty. Finanční milník na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací* je plněn na 1,8 % jeho hodnoty, plnění finančního milníku na prioritní ose 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory* vykazuje k 31. prosinci 2017 nulové hodnoty.

Obdobně jako u finančních milníků je i v případě věcných milníků dosahována nejvyšší hodnota plnění k 31. prosinci 2017 na prioritní ose 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti*, kde je věcný milník za fond EFRR plněn na 75,2 %, věcný milník za fond ESF na 35,8 % jeho hodnoty. Ze zbývajících věcných milníků je plněn již jen věcný milník na prioritní ose 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě* za fond ESF, který je plněn na 2,0 % jeho hodnoty. U ostatních věcných milníků OP PPR je k sledovanému datu vykazováno nulové plnění.

Plnění finančních a věcných milníků na jednotlivých prioritních osách OP PPR k 31. prosinci 2017 ilustrují níže uvedené grafy.

Prioritní osa 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Graf 46 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR

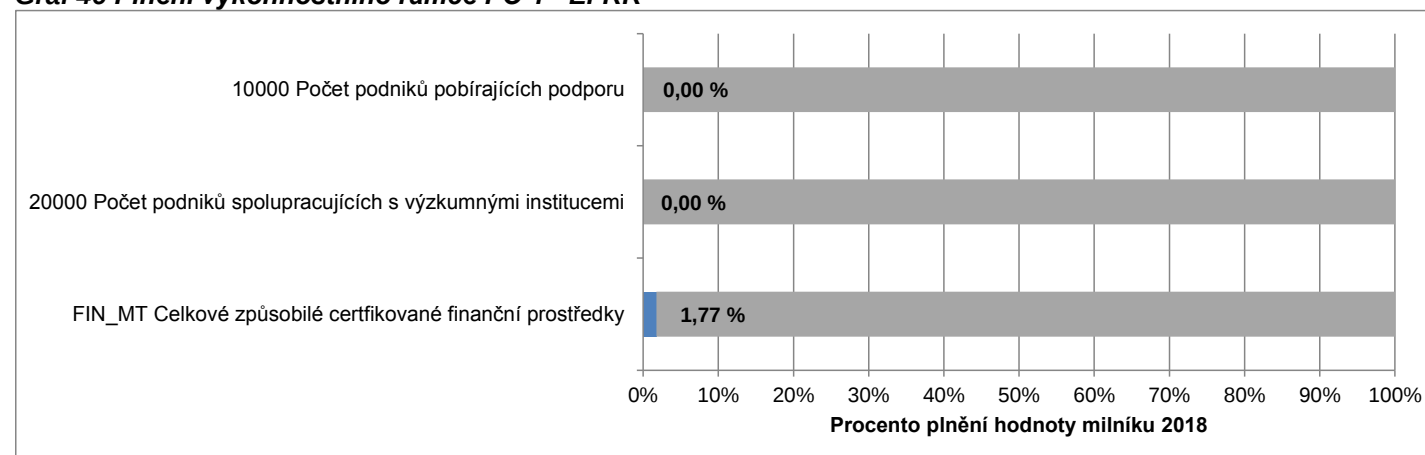


Prioritní osa 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory

K 31. prosinci 2017 je plnění věcných i finančních milníků na této prioritní ose nulové.


Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – ESF

Graf 47 Plnění výkonnostního rámce PO 3 - ESF

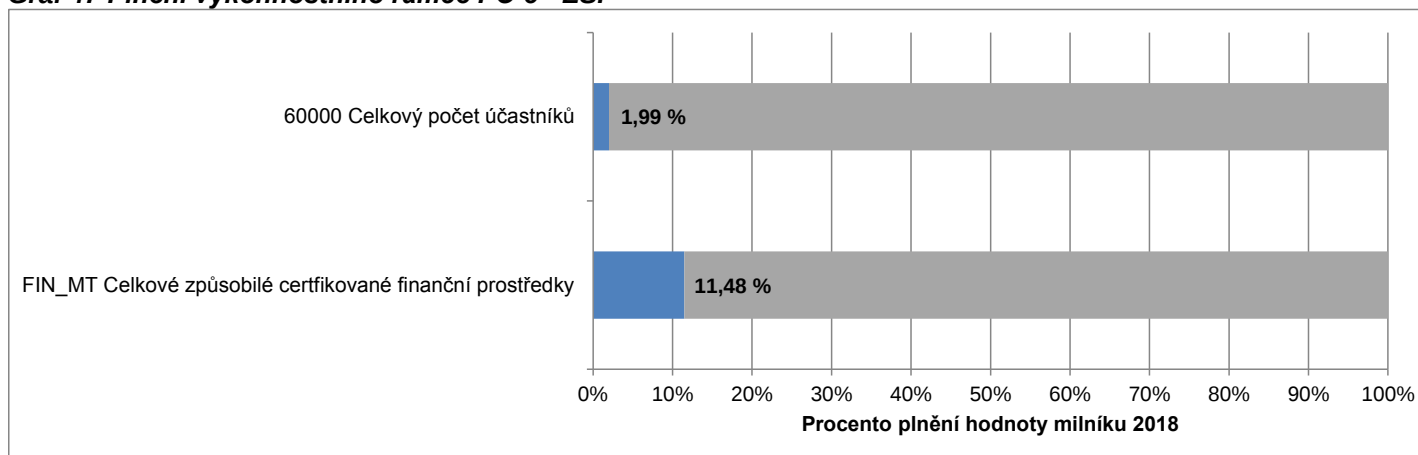


Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – EFRR

Graf 48 Plnění výkonnostního rámce PO 3 - EFRR

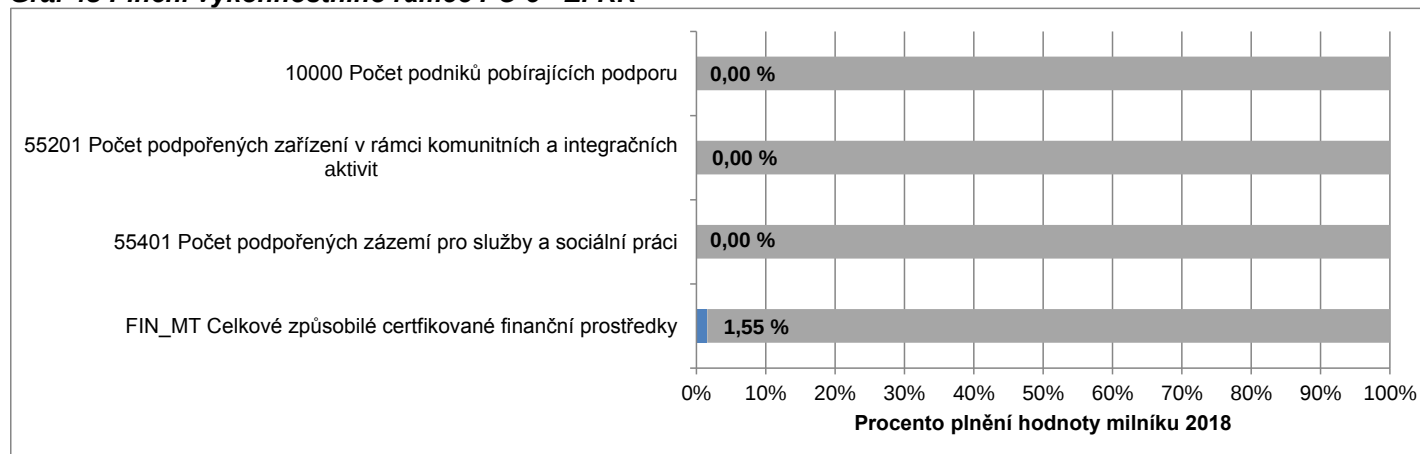


Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti - ESF

Graf 49 Plnění výkonnostního rámce PO 4 - ESF

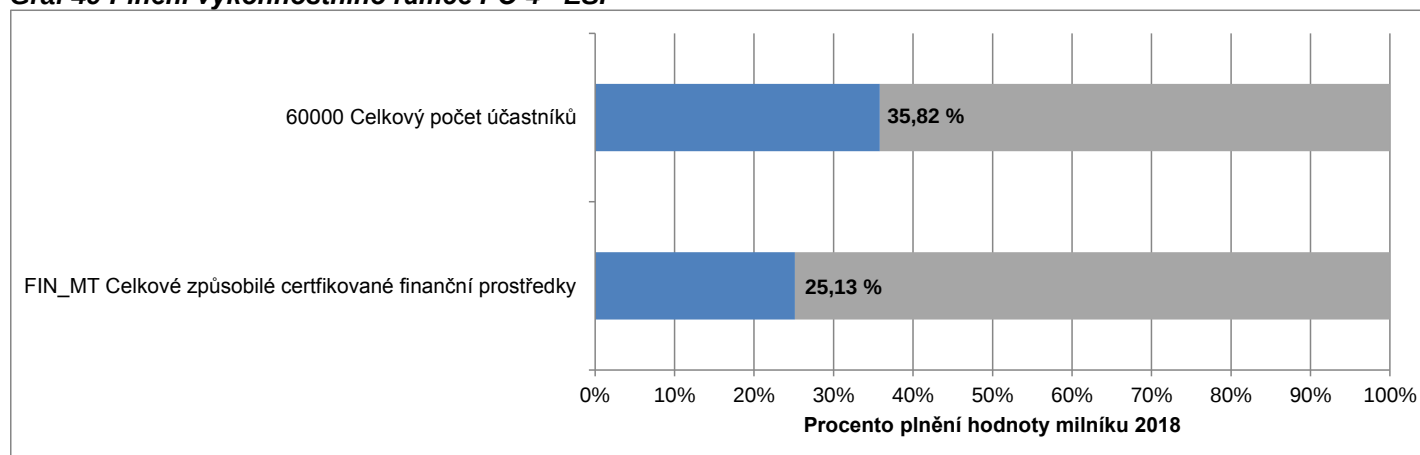

Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti - EFRR

Graf 50 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – EFRR

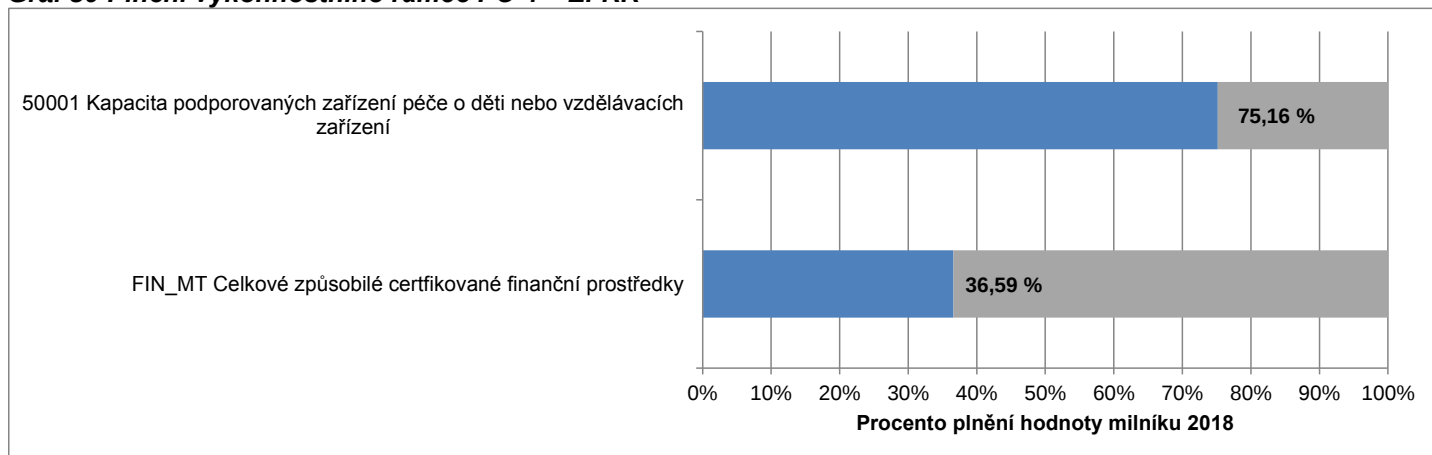

5.8 Operační program Technická pomoc

5.8.1 Zaměření

OP Technická pomoc (OP TP) je svým způsobem specifický program pro zajištění kvalitní implementace Dohody o partnerství, administrativní kapacity a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020>.

Tabulka 25 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	78,1
08.2 Jednotný monitorovací systém	21,9

5.8.2 Přehled vyhlášených výzev

Řídící orgán OP TP má ke dni 31. prosinci 2017 vyhlášeny 4 průběžné výzvy v objemu 5,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 108,0 % hlavní alokace programu. Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 nebyla vyhlášena žádná výzva. Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/>.


5.8.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 byly v OP TP uzavřeny 4 právní akty o poskytnutí / převodu podpory ve výši 0,1 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 2,6 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2017 v IROP uzavřeno 81 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 2,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 51,9 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2017 bylo proplaceno 1,3 mld. Kč, tedy 24,3 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 0,1 mld. Kč, tedy 2,6 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 1,2 mld. Kč, tj. 22,1 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 0,2 mld. Kč, tj. 3,5 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci roku 2017 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 1,0 mld. Kč, tj. 18,2 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 0,1 mld. Kč, tj. 2,4 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 31. prosinci 2017 vykázán v rámci OP TP na prioritní ose 1 *Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství*, kde tento finanční stav dosahuje 57,7 % hlavní alokace této prioritní osy. Nižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritní ose 2 *Jednotný monitorovací systém*, kde hodnota tohoto podílu byla 31,6 % alokace této prioritní osy.

Stav čerpání OP TP k 31. prosinci 2017 ilustruje graf níže, stav čerpání jednotlivých prioritních os je uveden tabulce č. 26.

Graf 51 Stav čerpání programu

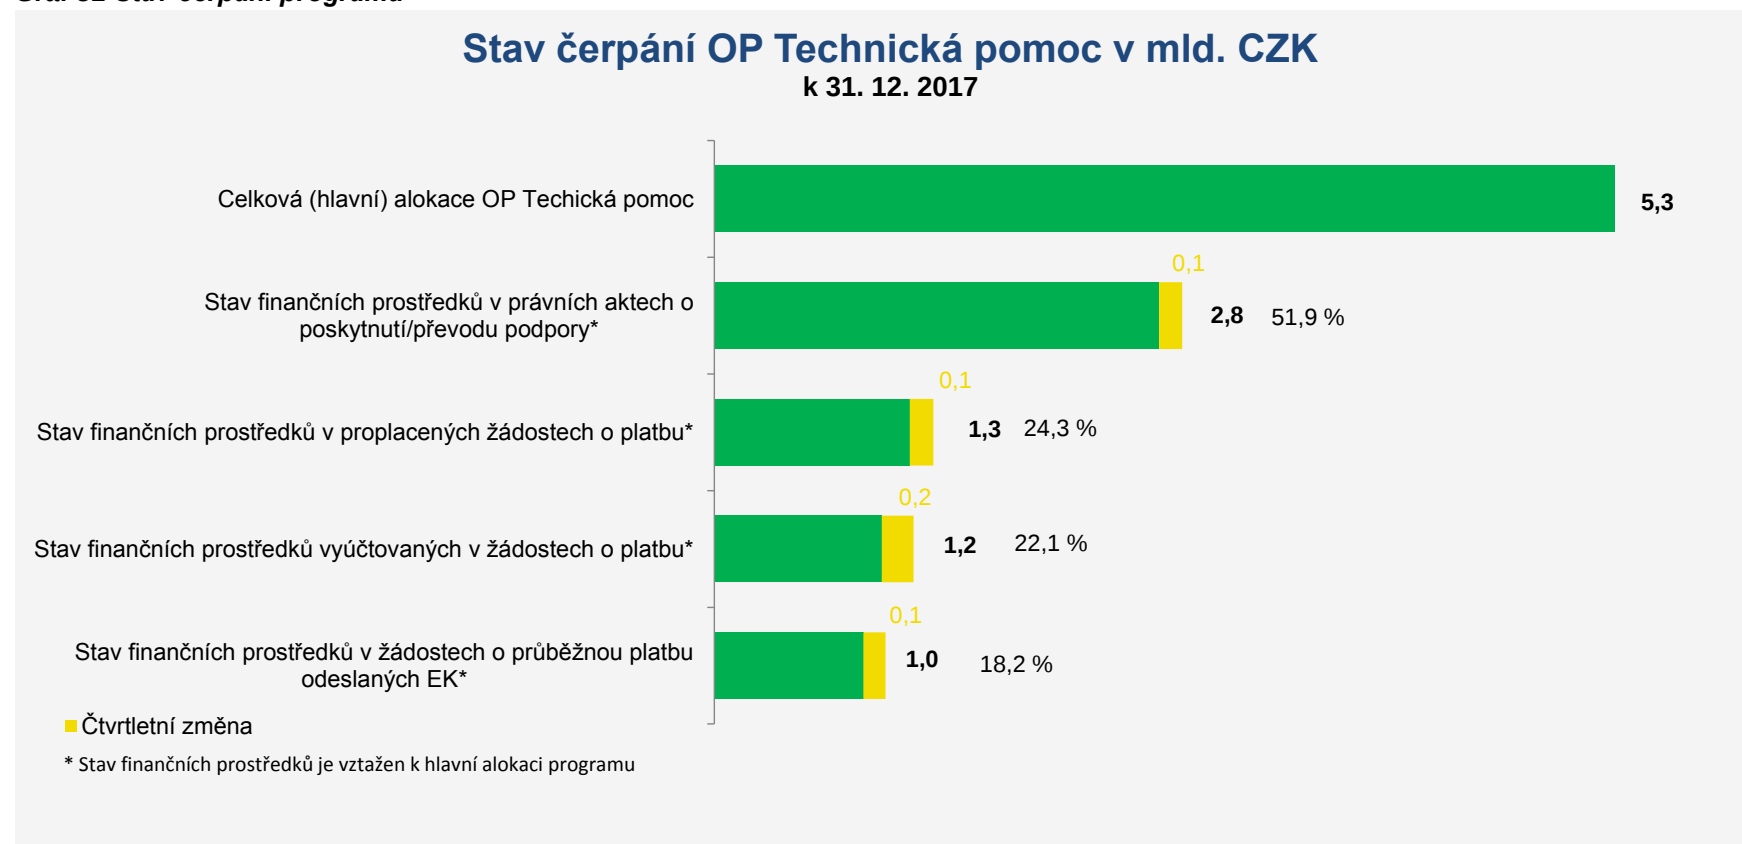

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 26 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
08.1	FS	Nerelevantní	4 170	85	2 849	68,32	70	2 405	57,66	1 095	26,27	977	23,42	985	23,63
08.2	FS	Nerelevantní	1 172	21	705	60,18	11	370	31,55	203	17,36	203	17,36	190	16,17
08	-	-	5 342	106	3 554	66,53	81	2 774	51,93	1 299	24,31	1 180	22,09	1 175	21,99

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.9 Program rozvoje venkova

5.9.1 Zaměření

Program rozvoje venkova (PRV) je nástrojem čerpání podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Řídicím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/>

Tabulka 27 Struktura programu

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
09.1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech	09.1.77.1.1.1 Vzdělávací akce	0,07
	09.1.77.1.2.1 Informační akce	0,05
	09.1.77.16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP	0,34
	09.1.77.16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělství	0,61
	09.1.77.16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v potravinářství	0,22
	09.1.77.16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů	2,44
	09.1.77.16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů	0,14
	09.1.77.16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech	0,05
	09.1.77.2.1.1 Poradenství	0,15
	09.1.78.16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP	0,00
	09.1.78.16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělství	0,00
	09.1.78.16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v potravinářství	0,00
	09.1.78.16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů	0,00
	09.1.78.16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů	0,00
	09.1.78.16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech	0,00
	09.1.79.1.1.1 Vzdělávací akce	0,00
	09.1.79.1.2.1 Informační akce	0,00

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
09.2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů	09.2.80.1.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.2.80.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.2.80.16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP	0,32
	09.2.80.16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělství	0,57
	09.2.80.16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů	2,30
	09.2.80.2.1.1 Poradenství	0,02
	09.2.80.4.1.1 Investice do zemědělských podniků	10,78
	09.2.80.4.3.1 Pozemkové úpravy	3,24
	09.2.81.1.1.1 Vzdělávací akce	0,00
	09.2.81.1.2.1 Informační akce	0,00
	09.2.81.6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců	0,97
	09.2.81a.1.1.1 Vzdělávací akce	0,00
	09.2.81a.1.2.1 Informační akce	0,00
	09.2.81a.4.3.2 Lesnická infrastruktura	1,13
	09.2.81a.8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství	0,62
	09.2.81a.8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven	0,08
09.3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství	09.3.82.1.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.3.82.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.3.82.14.1.1 Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka	0,26
	09.3.82.14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka	1,25
	09.3.82.14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti	0,25
	09.3.82.14.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat	0,44
	09.3.82.14.1.5 Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu	0,10
	09.3.82.16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v potravinářství	0,21
	09.3.82.16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů	0,13

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
	09.3.82.4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3,25
09.4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím	09.4.84.10.0.0 Agroenvironmentální opatření - staré závazky	3,58
	09.4.84.10.1.1 Integrovaná produkce ovoce	0,90
	09.4.84.10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné	0,98
	09.4.84.10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny	0,49
	09.4.84.10.1.4 Ošetřování travních porostů	19,78
	09.4.84.10.1.6 Biopásy	0,30
	09.4.84.10.1.7 Ochrana čejky chocholáté	0,10
	09.4.84.11.0.0 Ekologické zemědělství (AEO) - staré závazky	0,67
	09.4.84.1.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.4.84.11.1.1 Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství	2,60
	09.4.84.11.2.1 Zachování postupů ekologického zemědělství	0,32
	09.4.84.12.0.0 Platby v rámci Natura 2000 - staré závazky	0,01
	09.4.84.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.4.84.12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000	0,12
	09.4.84.13.0.0 Platby v rámci LFA - staré závazky	1,92
	09.4.84.13.1.1 Kompenzační platby v horských oblastech (LFA-H)	10,76
	09.4.84.13.2.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O)	7,33
	09.4.84.13.3.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S)	1,92
	09.4.84.15.0.0 Lesnicko-environmentální opatření - staré závazky	0,03
	09.4.84.15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru	0,07
	09.4.84.15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin	0,15
	09.4.84.2.1.1 Poradenství	0,04
	09.4.85.11.0.0 Ekologické zemědělství (AEO) - staré závazky	0,67
	09.4.85.1.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.4.85.11.1.1 Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství	2,60
	09.4.85.11.2.1 Zachování postupů ekologického zemědělství	0,32

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
	09.4.85.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.4.85.2.1.1 Poradenství	0,04
	09.4.85.8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi	0,04
	09.4.86.10.0.0 Agroenvironmentální opatření - staré závazky	1,61
	09.4.86.10.1.5 Zatravňování orné půdy	1,37
	09.4.86.10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku	0,23
	09.4.86.11.0.0 Ekologické zemědělství (AEO) - staré závazky	0,67
	09.4.86.1.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.4.86.11.1.1 Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství	2,60
	09.4.86.11.2.1 Zachování postupů ekologického zemědělství	0,32
	09.4.86.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.4.86.2.1.1 Poradenství	0,04
	09.4.86.8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích	0,12
	09.4.86.8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách	0,34
	09.4.86.8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi	0,04
	09.4.86.8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin	0,22
	09.4.86.8.5.2 Neproduktivní investice v lesích	0,15
	09.4.86.8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin	0,59
09.5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu	09.5.89.16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech	0,05
	09.5.89.6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů	0,40
	09.5.91.1.1.1 Vzdělávací akce	0,00
	09.5.91.1.2.1 Informační akce	0,00
	09.5.91.8.0.0 Zalesňování zemědělské půdy - staré závazky	0,07
	09.5.91.8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů - náklady na založení a údržba	0,26
09.6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských	09.6.92.6.4.1 Investice do nezemědělských činností	1,67
	09.6.92.6.4.2 Podpora agroturistiky	0,85

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
oblastech	09.6.93.19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje	4,77
	09.6.93.19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin	0,23
09.7 Technická pomoc	09.7.125.20.1.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV)	0,78
	09.7.125.20.2.1 Podpora na zřízení a provoz CSV	0,19
09.8 Staré závazky - Předčasné ukončení zemědělské činnosti	09.8.126.0.0.0 Staré závazky - PUZČ	0,65

5.9.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2017 vyhlásil Řídicí orgán PRV 77 výzev v objemu 34,7 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 62,6 % hlavní alokace. Ve sledovaném čtvrtletí nebyla vyhlášena žádná nová výzva. Další podrobnosti k výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014>.

5.9.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 bylo v PRV uzavřeno 4 026 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 0,4 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 0,8 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2017 v PRV uzavřeno 102 435 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 21,9 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 39,5 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2017 bylo proplaceno 18,3 mld. Kč, tedy 33,1 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 1,4 mld. Kč, tedy 2,5 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 17,1 mld. Kč, tj. 30,8 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 0,9 mld. Kč, tj. 1,7 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci roku 2017 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 17,1 mld. Kč, tj. 28,9 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 0,9 mld. Kč, tj. 1,7 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 31. prosinci 2017 vykázán v rámci PRV na prioritě Unie 2 *Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů*, kde tento finanční stav dosahuje 53,8 % hlavní alokace této priority Unie. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritě Unie 6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech*, kde hodnota tohoto podílu byla 7,3 % alokace této priority Unie.

Stav čerpání PRV k 31. prosinci 2017 ilustruje graf níže, stav čerpání po jednotlivých prioritách Unie je uveden v tabulce č. 28.

Graf 52 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 28 Stav čerpání programu

Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
–	–	–	mil. CZK	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
09.1	EZFRV	Nerelevantní	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	N/A	N/A
09.2	EZFRV	Nerelevantní	8 617	13 184	12 858	149,22	4 771	4 636	53,80	1 433	16,64	1 179	13,68	N/A	N/A
09.3	EZFRV	Nerelevantní	4 775	4 216	4 608	96,50	2 203	2 212	46,33	883	18,50	773	16,18	N/A	N/A
09.4	EZFRV	Nerelevantní	37 357	118 934	20 115	53,85	87 567	14 521	38,87	15 728	42,10	14 859	39,77	N/A	N/A
09.5	EZFRV	Nerelevantní	301	5 357	86	28,72	5 195	71	23,67	59	19,67	56	18,54	N/A	N/A
09.6	EZFRV	Nerelevantní	3 737	1 969	1 088	29,11	385	274	7,32	76	2,03	62	1,65	N/A	N/A
09.7	EZFRV	Nerelevantní	378	186	86	22,61	179	77	20,45	17	4,37	13	3,54	N/A	N/A
09.8	EZFRV	Nerelevantní	252	2 165	131	51,82	2 135	119	47,29	119	47,29	117	46,35	N/A	N/A
09	EZFRV	Nerelevantní	55 418	146 011	38 971	70,32	102 435	21 911	39,54	18 316	33,05	17 058	30,78	N/A	N/A

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV jsou zahrnuté údaje za projekty, plošná opatření a také staré závazky.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu.

5.9.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce PRV bylo k 31. prosinci 2017 dosaženo v případě indikátoru 93501 *Populace pokrytá Místními akčními skupinami (O.18)* na prioritě Unie 6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech*, indikátor ke sledovanému datu vykázal plnění ve výši 135,1 % jeho cílové hodnoty. Naopak nulové plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu bylo vykázáno u indikátoru 93104 *Počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce krátkých dodavatelských řetězců/místních trhů* na prioritě Unie 3 *Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství* a u indikátoru 92702 *Počet podpořených operací (O.3)* na prioritě Unie 5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu*.

Tabulka č. 29 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce PRV.

Tabulka 29 Plnění indikátorů

Priorita Unie	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek příjemců	Dosažená hodnota	Plnění cílové hodnoty v %
09.2	93703 Počet zemědělských podniků s podporou do restrukturalizace nebo modernizace a do rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	5 830	5 448,0	1 056,0	18,11
09.3	93104 Počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce krátkých dodavatelských řetězců/místních trhů	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	90	0	0	0
09.3	92702 Počet podpořených operací (O.3)	EZFRV	Nerelevantní	%	0	1 200	1 151,0	199,0	16,58
09.4	93004 Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování přispívající k obnově, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím (M.P4)	EZFRV	Nerelevantní	%	0	1 351 000	1 156 298,3	1 156 298,3	85,59
09.5	92702 Počet podpořených operací (O.3)	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	40	11,0	0	0
09.5	93003 Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu (M.P5)	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	600	1 156 298,3	26,5	4,42
09.6	92703 Počet projektů v rámci investic do nezemědělských činností	EZFRV	Nerelevantní	%	0	960	519,0	50,0	5,21
09.6	93501 Populace pokrytá Místními akčními skupinami (O.18)	EZFRV	Nerelevantní	%	0	4 505 000	6 087 003,0	6 087 003,0	135,12

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.9.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší plnění finančního milníku bylo k 31. prosinci 2017 vykázáno v případě priority Unie 2 *Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů*, kde byl finanční milník plněn na 94,1 % jeho hodnoty. Hodnota plnění finančních milníků na prioritách Unie 3 *Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství* a 4 *Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím* přesáhla 90 % jejich hodnoty. Finanční milník na prioritě Unie 5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu* byl k uvedenému datu plněn na 44,9 % jeho hodnoty. Nejnižší hodnotu plnění vykázal k 31. prosinci 2017 finanční milník na prioritě Unie 6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech*, tento finanční milník byl plněn na 9,9 % jeho hodnoty.

Plnění věcných milníků vykazuje významné rozdíly nejen mezi jednotlivými prioritami Unie, ale i v rámci jedné priority Unie. V případě priorit Unie 2 *Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů* a 4 *Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím*, u kterých je pouze jeden věcný milník, plnění dosahuje 90,6 %, resp. 107,0 % jejich hodnoty. V případě priority Unie 3 *Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství* je jeden z věcných milníků plněn na 120,6 % jeho hodnoty, druhý věcný milník na této prioritě Unie vykazuje však nulové plnění. V případě priority Unie 5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu* je také jeden z věcných milníků vykazuje nulové plnění, druhý věcný milník na této prioritě Unie je plněn na 11,0 % jeho hodnoty. V případě priority Unie 6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech* je jeden z věcných milníků plněn na 114,8 %, druhý na 26,0 % jeho hodnoty.

Plnění finančních a věcných milníků na jednotlivých prioritách Unie PRV k 31. prosinci 2017 ilustrují níže uvedené grafy.


Priorita Unie 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Graf 53 Plnění výkonnostního rámce PU 2

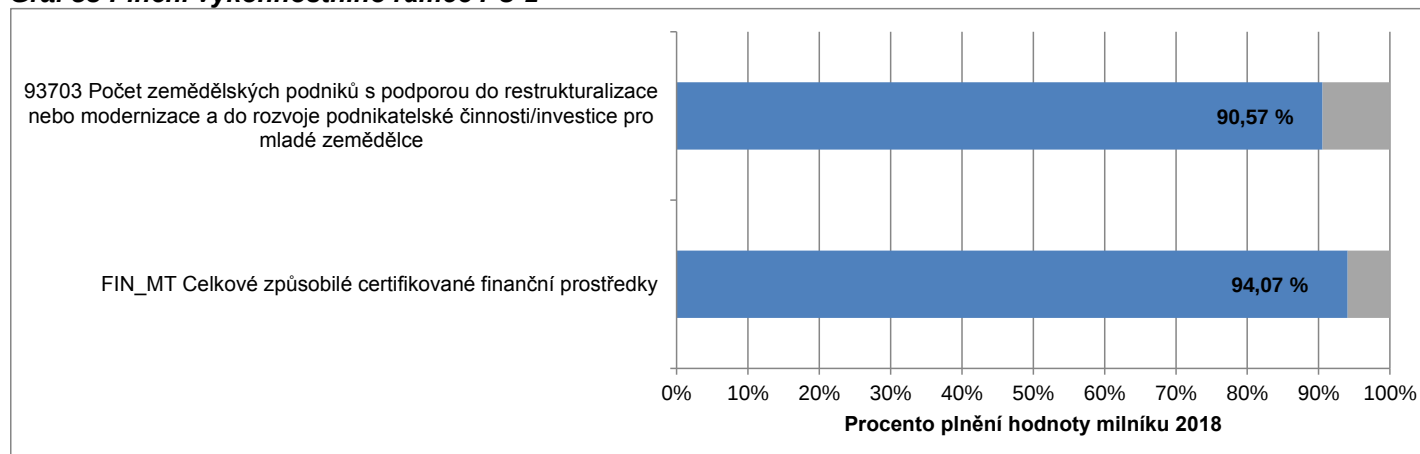


Priorita Unie 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Graf 54 Plnění výkonnostního rámce PU 3

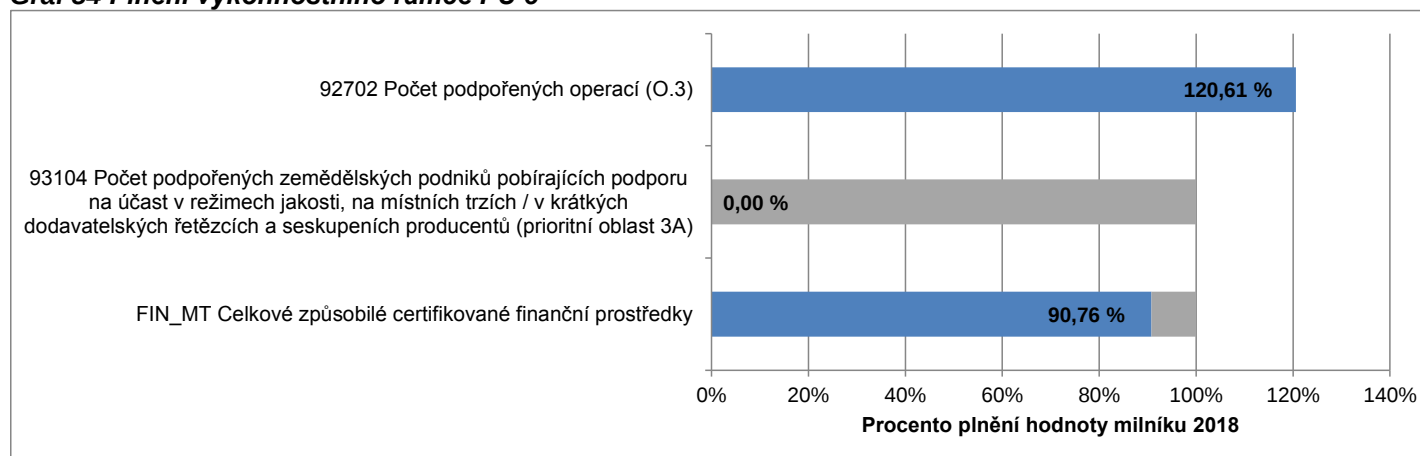


Priorita Unie 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Graf 55 Plnění výkonnostního rámce PU 4

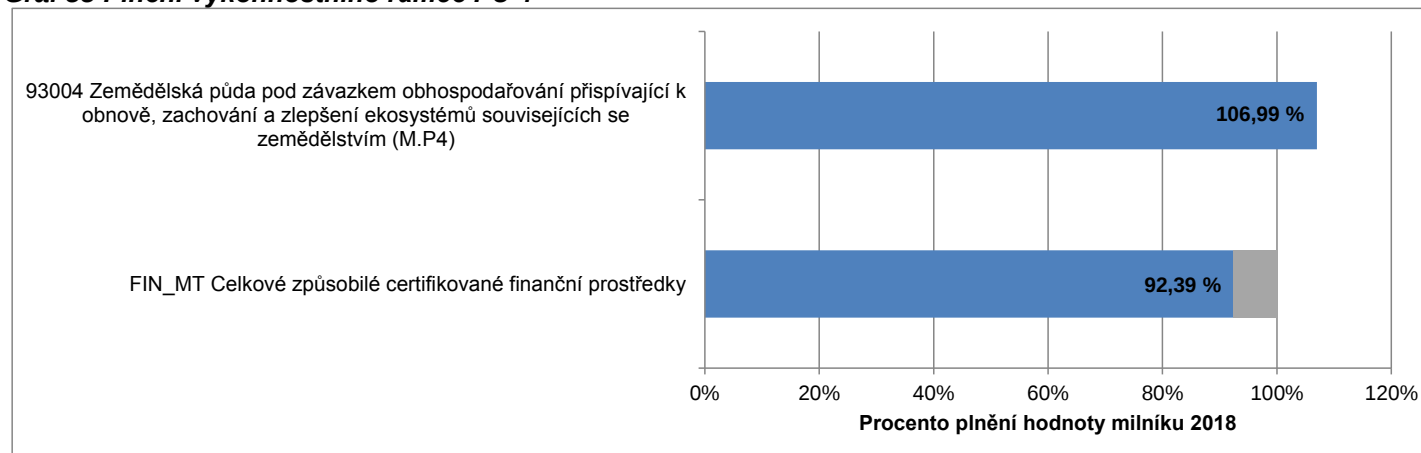


Priorita Unie 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Graf 56 Plnění výkonnostního rámce PU 5

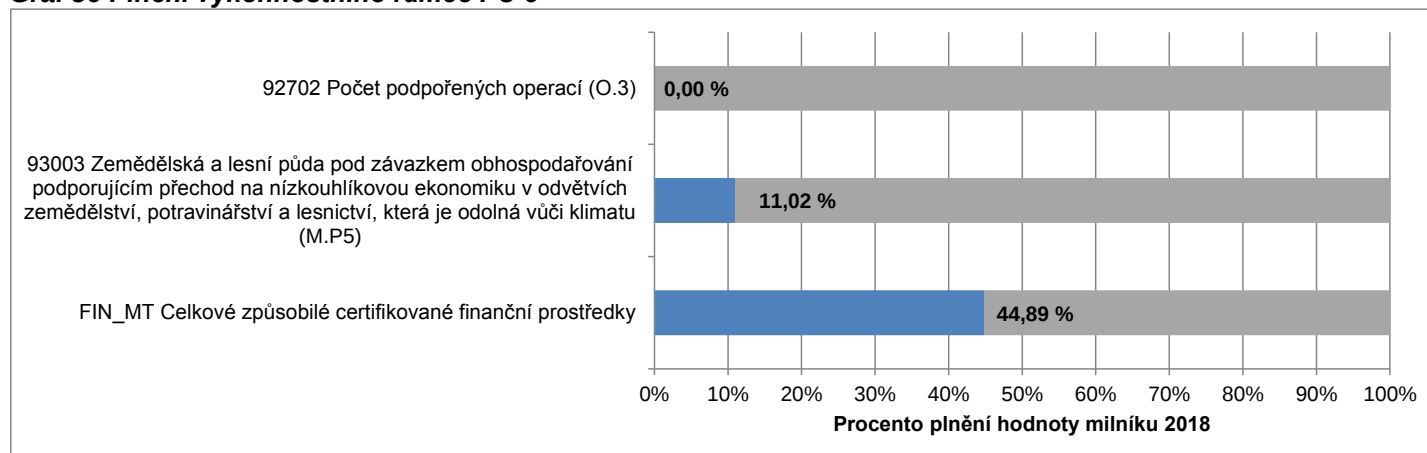

Priorita Unie 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Graf 57 Plnění výkonnostního rámce PU 6

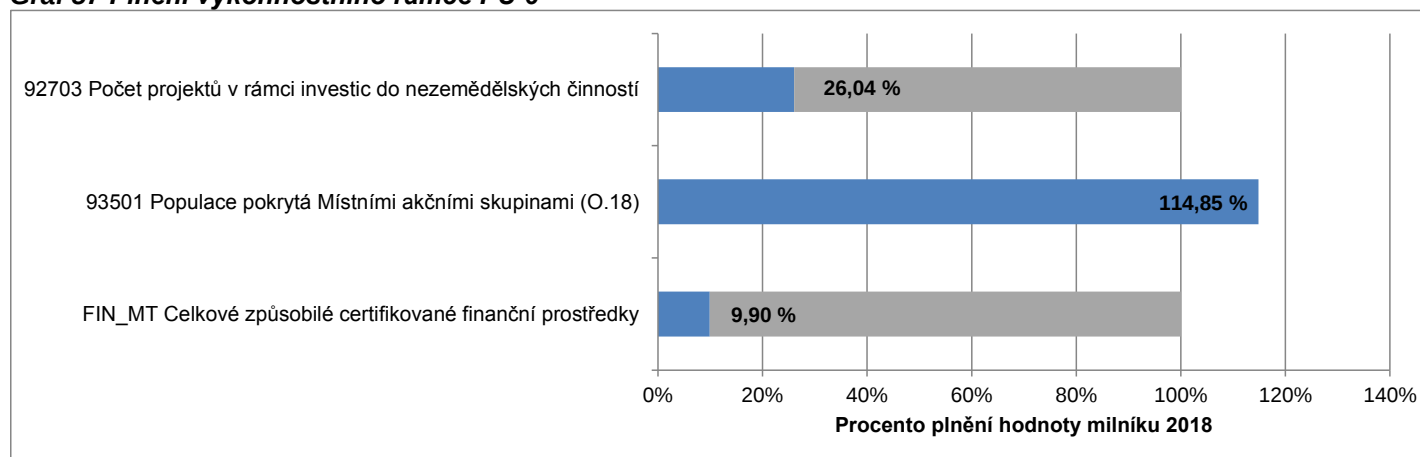

5.10 Operační program Rybářství

5.10.1 Zaměření

OP Rybářství (OP R) je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky v ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo zemědělství, zprostředkujícím orgánem je Státní zemědělský a intervenční fond.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.eagri.cz.

Tabulka 30 Struktura programu

Priorita Unie	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
10.2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje	66,4
10.3 Podpora provádění Společné rybářské politiky	8,5
10.5 Podpora uvádění na trh a zpracování	19,2
10.6 Technická pomoc	5,8

5.10.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2017 vyhlásil Řídicí orgán OP R 23 výzev v objemu 1,0 mld. Kč (příspěvek EU), tato hodnota představuje 130,7 % hlavní alokace programu. Ve sledovaném čtvrtletí nebyla vyhlášena žádná nová výzva. Další podrobnosti k výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/>

5.10.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 bylo v OP R uzavřeno 8 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 0,004 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 0,5 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2017 v OP R uzavřeno 258 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 0,2 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 28,7 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2017 bylo proplaceno 0,06 mld. Kč, tedy 8,2 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017

byla 0,01 mld. Kč, tedy 1,5 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 0,06 mld. Kč, tj. 8,2 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 0,01 mld. Kč, tj. 1,5 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci roku 2017 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 0,04 mld. Kč, tj. 5,9 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 0,04 mld. Kč, tj. 5,9 % hlavní alokace programu.


Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 31. prosinci 2017 vykázán v rámci OP R na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje*, kde tento finanční stav dosahuje 37,6 % hlavní alokace této priority Unie. Nejnižší, respektive nulový, podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky*.

Stav čerpání OP R k 31. prosinci 2017 ilustruje graf níže, stav čerpání OP R po jednotlivých prioritách Unie uvádí tabulka č. 31.

Graf 58 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Rybářství v mld. CZK

k 31. 12. 2017

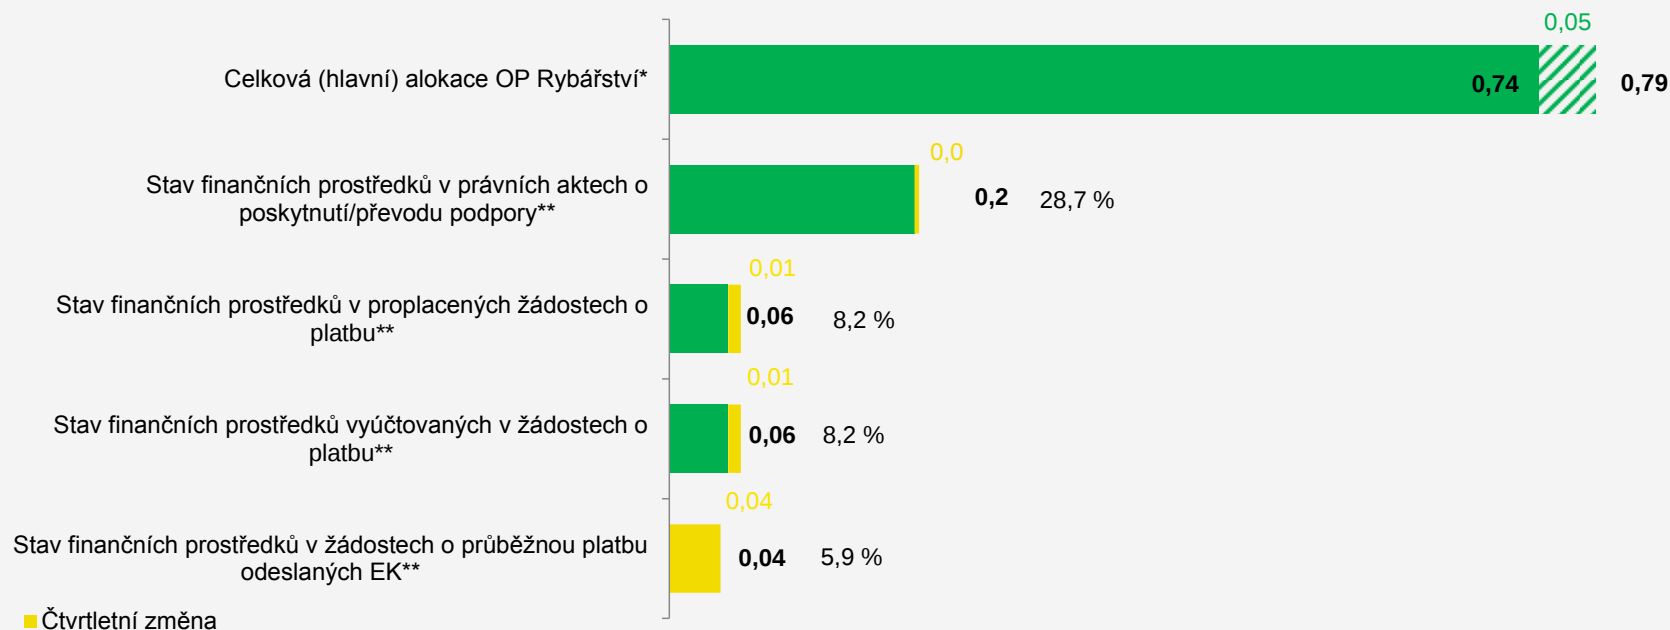

* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 31 Stav čerpání programu

Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
–	–	–	mil. CZK	e	f	g	h	i	j	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
10.2	ENRF	Nerelevantní	495	486	540	109,22	215	186	37,62	61	12,25	61	12,25	43	5,89
10.3	ENRF	Nerelevantní	64	3	7	10,64	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.5	ENRF	Nerelevantní	143	55	43	29,98	22	16	11,30	1	0,39	1	0,39	1	0,33
10.6	ENRF	Nerelevantní	43	27	15	35,59	21	11	25,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	ENRF	Nerelevantní	745	571	606	81,29	258	214	28,67	61	8,22	61	8,22	44	5,89

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.10.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce k 31. prosinci 2017 vykázal indikátor 96001 *Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury* na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje*, indikátor vykázal plnění ve výši 16,1 % jeho cílové hodnoty. Naopak nulové plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu vykázal indikátor 97301 *Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů* na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky*.

Tabulka č. 32 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP R.

Tabulka 32 Plnění indikátorů

Priorita Unie	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
10.2	96001 Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury	ENRF	Nerelevantní	Projekty	0	435	195,0	70,0	16,09
10.3	97301 Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů	ENRF	Nerelevantní	Projekty	0	2	0	0	0
10.5	96401 Počet projektů zaměřených na zpracování	ENRF	Nerelevantní	Projekty	0	33	17,0	3,0	9,09

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.10.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyššího plnění dosáhl finanční milník na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje*, který byl k 31. prosinci 2017 plněn na 108,9 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší, respektive nulové plnění finančního milníku bylo k uvedenému datu vykázáno na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky*. Finanční milník na prioritě Unie 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování* byl plněn na 6,7 % jeho hodnoty.

Věcné milníky na prioritách Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje* a 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování* byly k 31. prosinci 2017 plněny v rozsahu 60,0 % až 63,6 % jejich hodnoty. Věcný milník na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky* vykázal k uvedenému datu stejně jako finanční milník nulovou hodnotu plnění.

Plnění věcných a finančních milníků na jednotlivých prioritách Unie k 31. prosinci 2017 ilustrují níže uvedené grafy.

Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

Graf 59 Plnění výkonnostního rámce PU 2

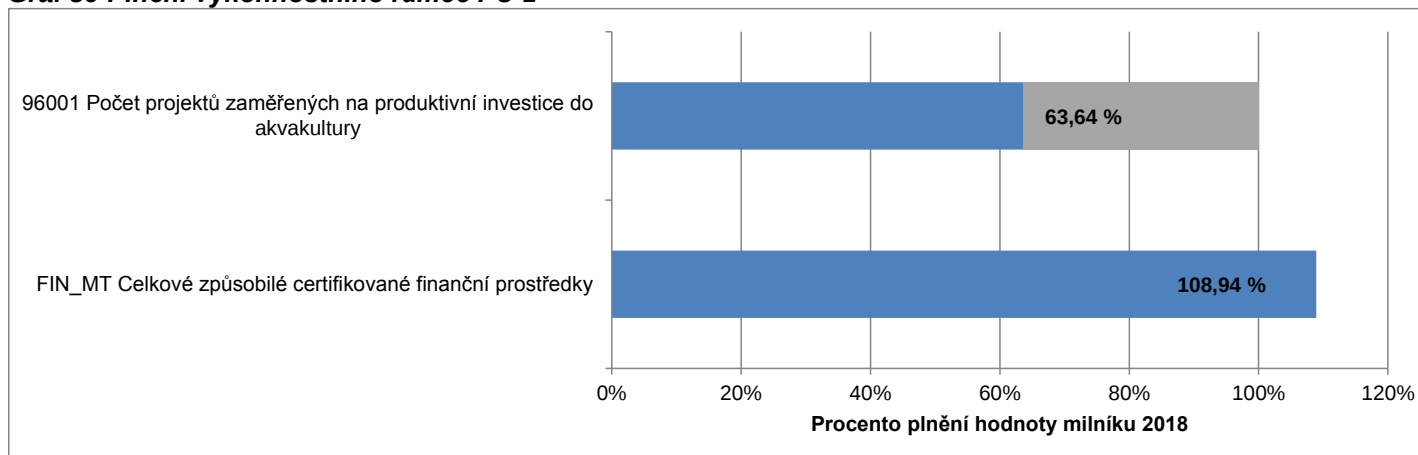


Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

K 31. prosinci 2017 je plnění věcných i finančních milníků na této prioritě Unie nulové.

Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování

Graf 60 Plnění výkonnostního rámce PU 5

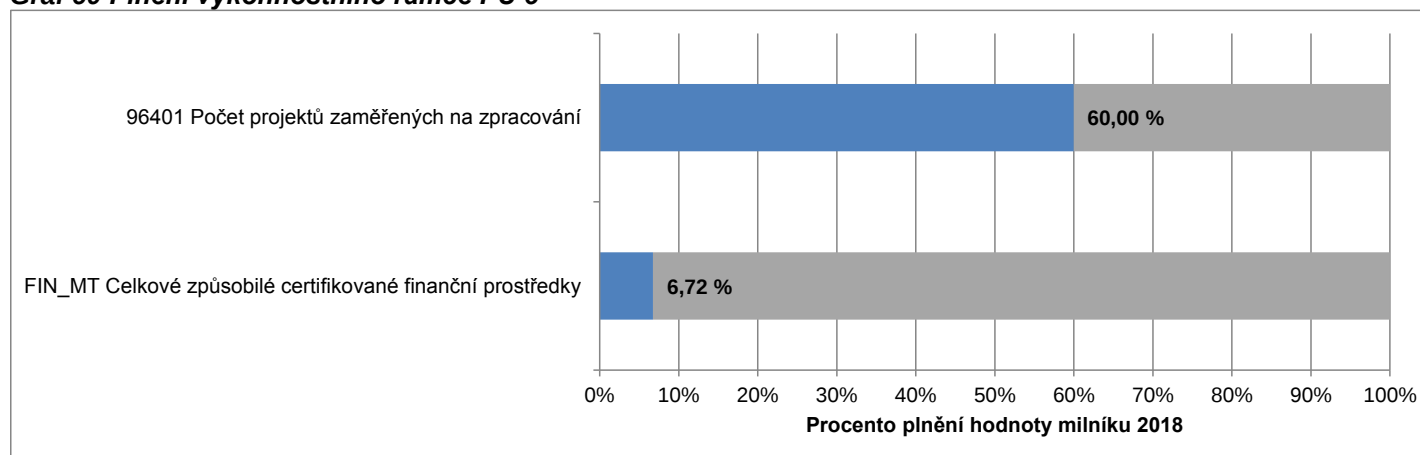

6 Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce

6.1 INTERREG V-A Česká republika - Polsko

6.1.1 Zaměření

Program INTERREG V-A ČR – Polsko se zaměřuje na zlepšení podmínek v oblasti cestovního ruchu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice. Program INTERREG V-A ČR – Polsko je financován z EFRR.

Z územního hlediska je program zaměřen na české a polské příhraniční regiony NUTS III, kterými jsou: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a polské podregiony - Jeleniogórský, Walbrzyský, Opolský, Nyský, Rybnický, Bielský, částečně Tyský a Wrocławský.

Řídícím orgánem je MMR, Ministerstvo rozvoje Polské republiky plní funkci Národního orgánu. Činnost Společného sekretariátu, který sídlí v Olomouci, zajišťují na české straně pracovníci Centra pro regionální rozvoj České republiky, za polskou stranu doplnění o pracovníky delegované jednotlivými příhraničními vojvodstvími (Dolnoslezské, Opolské a Slezské). Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.cz-pl.eu.

Tabulka 33 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	b
11.1 Společné řízení rizik	5,40
11.2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti	60,00
11.3 Vzdělávání a kvalifikace	4,50
11.4 Spolupráce institucí a komunit	24,10
11.5 Technická pomoc	6,00


6.1.2 Přehled vyhlášených výzev

Od počátku programového období bylo vyhlášeno celkem 25 výzev s celkovou alokací 269,9 mil. EUR (CZV). V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2017 bylo možné podávat žádosti do 7 výzev v celkovém finančním objemu 61,2 mil. EUR (CZV). Podrobnosti k výzvám jsou uvedeny na internetových stránkách programu <http://www.cz-pl.eu/>.

6.1.3 Finanční čerpání

V programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko bylo k 31. prosinci 2017 vydáno 90 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 102,4 mil. EUR (tj. 45,3 % celkové alokace programu). Ke konci čtvrtého čtvrtletí roku 2017 bylo proplaceno 4,2 mil. EUR (tj. 1,9 % celkové alokace programu). Hodnota žádostí o průběžnou platbu odeslaných do EK dosáhla k 31. prosinci 2017 hodnoty 2,5 mil. EUR (tj. 1,1 % celkové alokace programu).

Graf 61 Stav čerpání programu

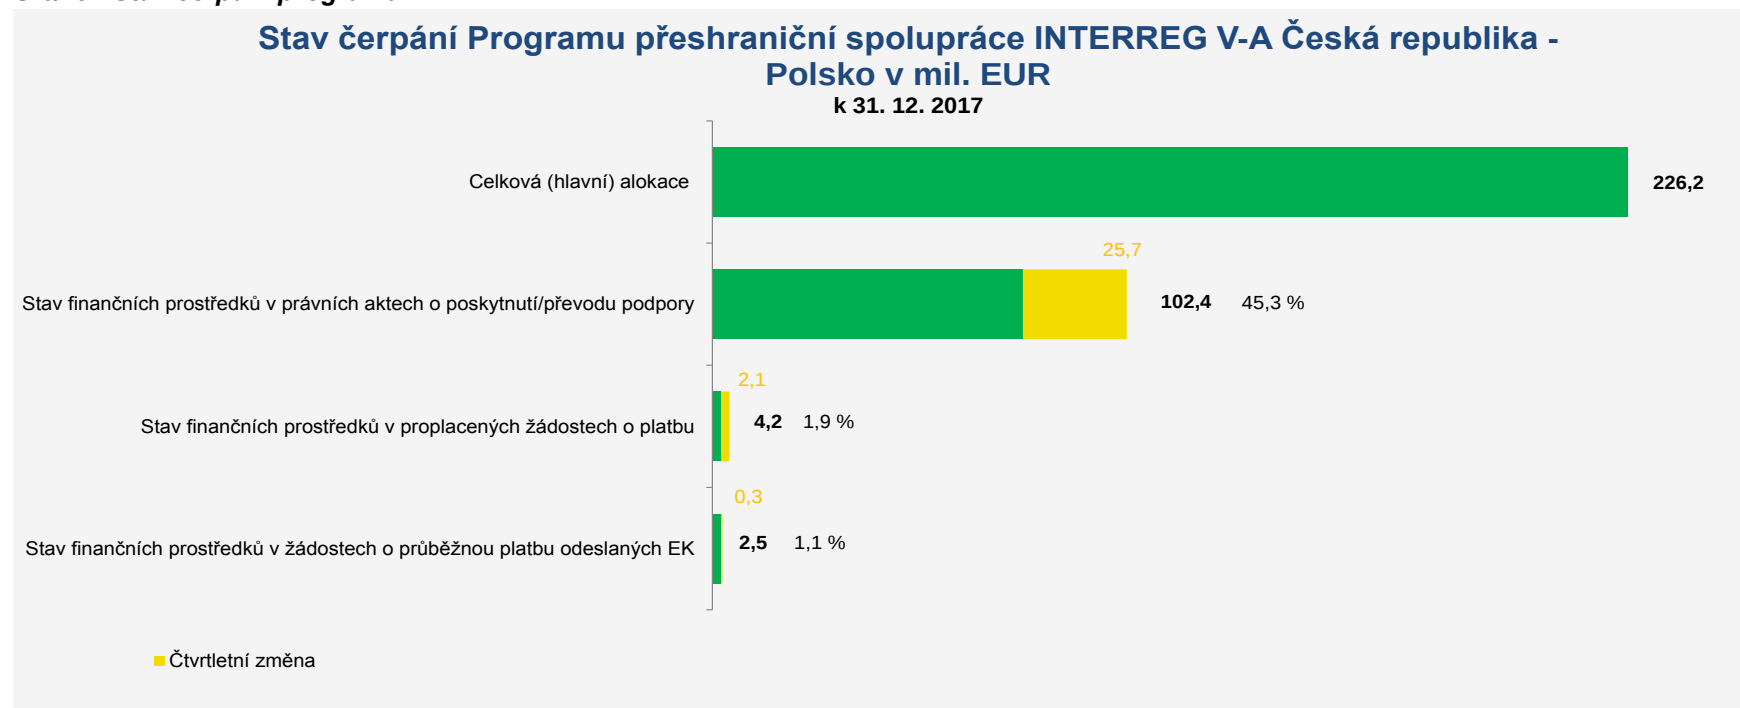

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně EUR.

Tabulka 34 Stav čerpání programu

Prioritní osa	Fond	Celková alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu	
			počet	mil. EUR	%	počet	mil. EUR	%	mil. EUR	%
a	b	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d
11.1	EFRR	12	15	21	170,12	8	12	97,81	0	0,00
11.2	EFRR	136	164	301	221,39	28	76	55,66	1	0,54
11.3	EFRR	10	39	15	145,57	3	1	10,18	0	0,12
11.4	EFRR	55	120	48	87,27	28	10	18,55	3	4,76
11.5	EFRR	14	31	7	53,53	23	4	27,81	1	6,54
11	EFRR	226	369	391	172,82	90	102	45,28	4	1,87

Poznámky:

Tabulka obsahuje údaje o počtu individuálních projektů a fondů mikroprojektů, tzn., neuvádí se údaje o počtu mikroprojektů.

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR.

6.1.4 Plnění indikátorů

Z jednotlivých indikátorů výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko dosáhl k 31. prosinci 2017 nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátor 66600 *Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy* na prioritní ose 3 *Vzdělání a kvalifikace*, indikátor vykázal plnění ve výši 5,1 % cílové hodnoty tohoto indikátoru. Čtyři indikátory výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko vykázaly ke sledovanému datu nulové plnění cílové hodnoty, konkrétně se jedná o indikátory 57502 *Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení* a 57601 *Počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti/kompatibility* na prioritní ose 1 *Společné řízení rizik*, dále indikátor 72300 *Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic* na prioritní ose 2 *Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti* a indikátor 54900 *Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání* na prioritní ose 3 *Vzdělání a kvalifikace*.

Tabulka č. 35 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

Tabulka 35 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
11.1	57502 Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení	EFRR	Nerelevantní	Jednotky	0	24	89	0	0
11.1	57601 Počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti/kompatibility	EFRR	Nerelevantní	Systémy	0	10	14	0	0
11.2	72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	EFRR	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	101	198,78	0	0
11.2	91002 Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou	EFRR	Nerelevantní	Elementy	0	299	167	1	0,33
11.3	54900 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání	EFRR	Nerelevantní	Mechanismy	0	5	0	0	0
11.3	66600 Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy	EFRR	Nerelevantní	Osoby	0	4 000	1 993	204	5,10
11.4	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit	EFRR	Nerelevantní	Partneři	0	2 355	887	32	1,36

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

6.1.5 Plnění výkonnostní rámce

Z finančních milníků k 31. prosinci 2017 vykázal nejvyšší procentuální plnění finanční milník na prioritní ose 4 *Spolupráce institucí a komunit* (plnění ve výši 20,4 % hodnoty finančního milníku pro rok 2018), naopak nulové plnění vykázal finanční milník na prioritní ose 1 *Společné řízení rizik*.

Z celkem sedmi věcných milníků vykazují nenulové plnění tři indikátory výkonnostního rámce: indikátor 91002 *Počet elementů kulturního / přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou* na prioritní ose 2 *Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti* (plnění ve výši 2,2 % hodnoty věcného milníku roku 2018), indikátor 66600 *Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy* na prioritní ose 3 *Vzdělání a kvalifikace* (plnění ve výši 34,0 % hodnoty věcného milníku roku 2018) a 91101 *Počet partnerů zapojených do společných aktivit* na prioritní ose 4 *Spolupráce institucí a komunit* (plnění ve výši 9,1 % hodnoty věcného milníku roku 2018).


Plnění finančních a věcných milníků na jednotlivých prioritních osách OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko k 31. prosinci 2017 ilustrují níže uvedené grafy.

Prioritní osa 1 Společné řízení rizik

K 31. prosinci 2017 je plnění věcných i finančních milníků na této prioritní ose nulové.


Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Graf 62 Plnění výkonnostního rámce PO 2

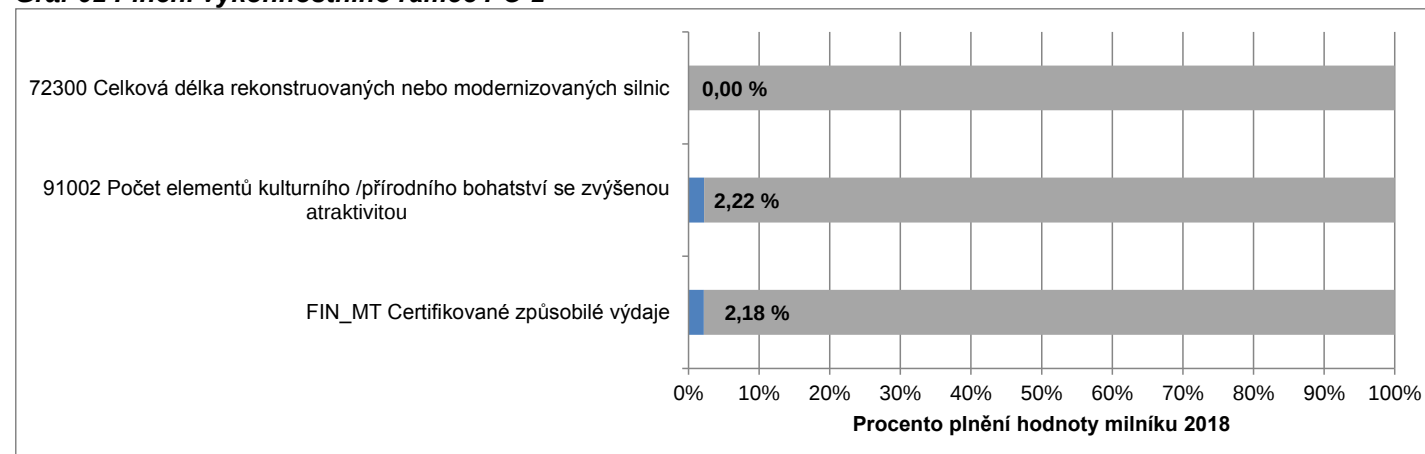


Prioritní osa 3 Vzdělání a kvalifikace

Graf 63 Plnění výkonnostního rámce PO 3

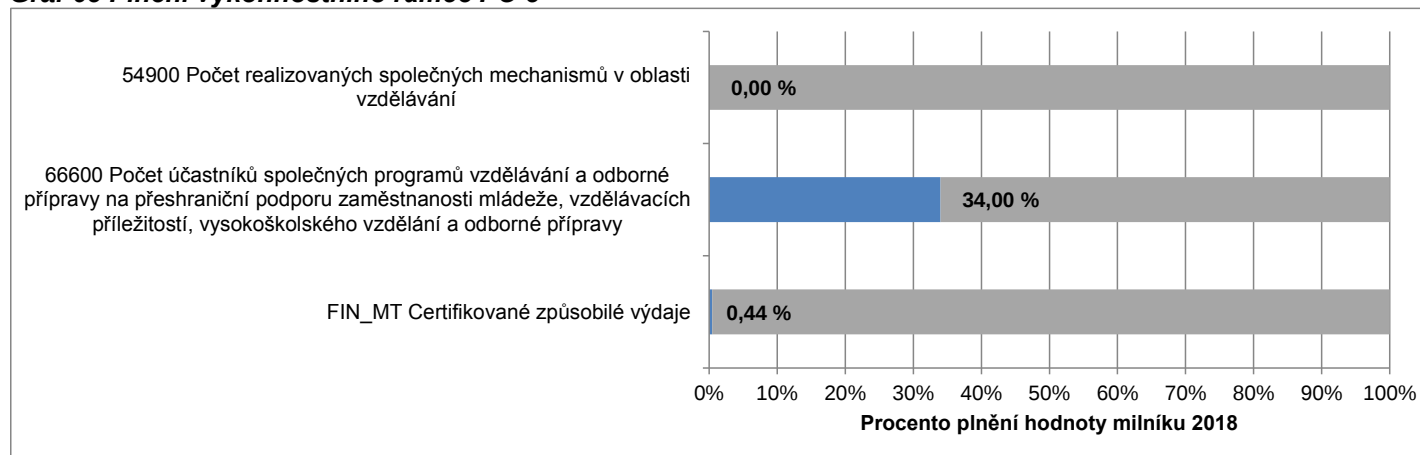

Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit

Graf 64 Plnění výkonnostního rámce PO 4

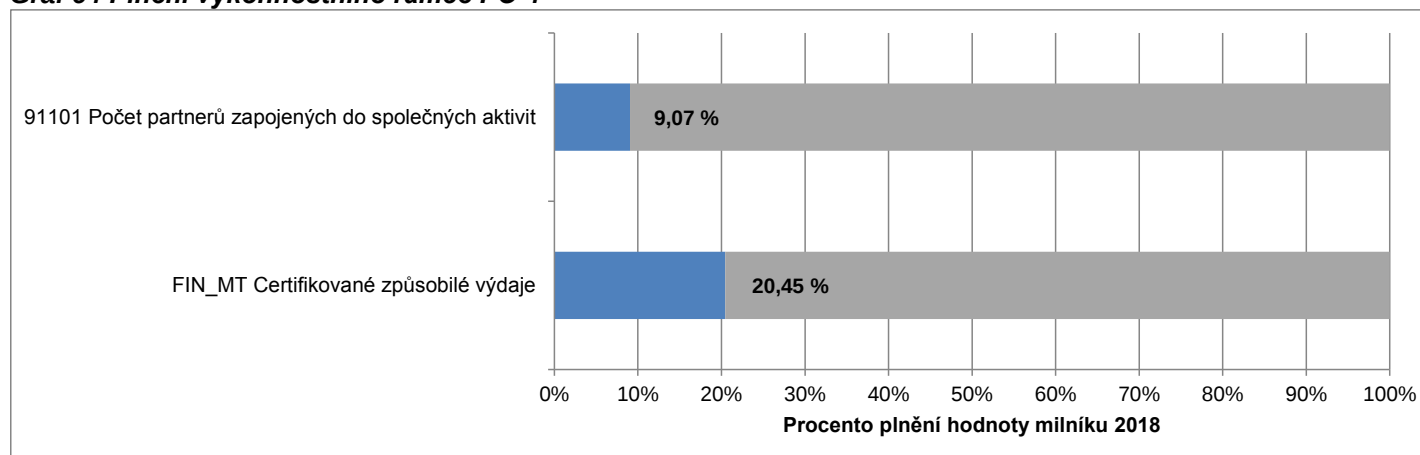

6.2 INTERREG V-A Slovensko - Česká republika

6.2.1 Zaměření

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika je zaměřen na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, podporu vzdělávání a odborné přípravy, ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochranu biologické rozmanitosti, ochranu půdy a podporu ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000. Dále se zaměřuje na podporu investování podniků do výzkumu a inovací a na vytváření synergií mezi podniky, centry výzkumu a vysokoškolským vzdělávacím prostředím. Program INTERREG V-A ČR – Slovensko je financován z EFRR.

Územně je program určen na české straně pro Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj, na slovenské straně pro Trenčínský, Trnavský a Žilinský samosprávný kraj.

Řídicím orgánem programu je slovenské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova, funkci Národního orgánu plní MMR. Činnost Společného technického sekretariátu zajišťuje útvar na Ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova SR. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách programu www.sk-cz.eu.

Tabulka 36 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	b
1 Využívání inovačního potenciálu	16,0
2 Kvalitní životní prostředí	67,0
3 Rozvoj místních iniciativ	11,0
4 Technická pomoc	6,0

6.2.2 Přehled vyhlášených výzev

V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2017 nebylo možné podávat žádosti do žádné výzvy. Podrobnosti k výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://www.sk-cz.eu/>.

6.2.3 Finanční čerpání

V programu INTERREG V-A Slovensko - Česká republika nebyly do 31. prosince 2017 vydány žádné právní akty o poskytnutí / převodu podpory.

6.2.4 Plnění indikátorů

K 31. prosinci 2017 byly hodnoty závazků příjemců i dosažené hodnoty všech indikátorů programu nulové.

6.3 INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

6.3.1 Zaměření

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika pro období 2014–2020 je zaměřen na podporu vědy, výzkumu a inovací, ochranu životního prostředí, podporu kulturního a přírodního dědictví, podporu vzdělávání a rozvoj komunit v přeshraniční dimenzi. Program je orientován zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Program INTERREG V-A ČR – Rakousko je financován z EFRR.

Prioritou programu je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přeshraniční dimenzi.

Území programu je vymezeno regiony NUTS III. V České republice se jedná o Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. V Rakousku je programové území tvořeno regiony: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách: www.at-cz.eu.

Tabulka 37 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	b
1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	12,8
2 Životní prostředí a zdroje	46,4
3 Rozvoj lidských zdrojů	14,0
4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce	20,8
5 Technická pomoc	6,0

6.3.2 Přehled vyhlášených výzev

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 bylo možné předkládat žádosti do vyhlášené průběžné výzvy č. 1, alokace vyhlášené výzvy je 97 814 933,00 EUR (tedy pokrývající celkovou alokaci programu). Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách programu <http://www.at-cz.eu>.

6.3.3 Finanční čerpání

K 31. prosinci 2017 bylo vydáno 33 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 37,7 mil. EUR (tj. 38,5 % celkové alokace programu). Proplaceno bylo 0,2 mil. EUR (tj. 0,2 % celkové alokace programu).

6.3.4 Plnění indikátorů

U všech indikátorů programu je k datu 31. prosince 2017 dosažená hodnota nulová, avšak u všech indikátorů (s výjimkou indikátoru *CO14 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic*) je již evidována nenulová hodnota závazku příjemců. V průměru nejvyšší hodnoty závazku u indikátorů vzhledem k cílové hodnotě programu je dosahováno na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací*, naopak nejmenší je hodnota závazku indikátorů vzhledem k cílové hodnotě na prioritní ose 2 *Životní prostředí a zdroje*. Nejvyšší podíl závazků indikátoru vzhledem k dosažené hodnotě je zaznamenán u indikátoru OP4 *Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních a meziregionálních výzkumných projektů*, jediným indikátorem s nulovou hodnotou závazku je již zmíněný indikátor *CO14 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic*.

6.4 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

6.4.1 Zaměření

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko je zaměřen na posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací, zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, investice do dovedností a vzdělávání a udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

Program je určen pro české kraje Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, na bavorské straně jde o zemské okresy Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing - Bogen a statutární města Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing, Hof a Weiden. Program je financován z EFRR.

Řídicím orgánem je Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plní funkci Národního orgánu. Společný sekretariát sídlí v Bayreuthu. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách programu www.by-cz.eu.

Tabulka 38 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	b
1 Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací	17,3
2 Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů	38,4
3 Investice do dovedností a vzdělávání	11,4
4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce	26,9
5 Technická pomoc	6,0

6.4.2 Přehled vyhlášených výzev

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 bylo možné předkládat žádosti do vyhlášené průběžné výzvy č. 1, alokace vyhlášené výzvy je 103 375 149,00 EUR (tedy pokrývající celkovou alokaci programu). Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách programu <http://www.by-cz.eu>.

6.4.3 Finanční čerpání

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 bylo k 31. prosinci 2017 vydáno 83 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové výši 63,0 mil. EUR (tj. 60,9 % celkové alokace programu) a příjemcům proplaceno 1,3 mil. EUR (tj. 1,2 % celkové alokace programu).

6.4.4 Plnění indikátorů

Všechny indikátory Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 již vykazují nenulové hodnoty závazku příjemců, nenulové dosažené hodnoty indikátorů jsou však k 31. prosinci 2017 zatím jen na prioritní ose 5 Technická pomoc (celkem jsou 4 indikátory na této prioritní ose). Dosažená hodnota indikátoru na prioritní ose 5 *Technická pomoc* se pohybuje od 32,5 % (indikátor OI 51 *Počet společných akcí*) do 157,1 % (indikátor OI 54 *Počet opatření v oblasti dalšího odborného vzdělávání pracovníků zapojených do řízení programu*). Zbývající 2 indikátory (OI 52 *Počet pracovníků v oblasti administrace programu* a OI 53 *Počet zavedených monitorovacích systémů*) vykazují k 31. prosinci 2017 100 % dosažené hodnoty.

6.5 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014–2020

6.5.1 Zaměření

Program přeshraniční spolupráce umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Je řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství. Kontaktními místy pro zájemce jsou Společný sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance (Drážďany) a krajské úřady v dotačním území. Program je financován z EFRR.

Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně zemskými okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz, včetně durynských okresů Greiz a Saale-Orla. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách programu: www.sn-cz2020.eu.

Tabulka 39 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	d
1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik	10,0
2 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů	43,5
3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení	17,5
4 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě	23,0
5 Technická pomoc	6,0

6.5.2 Přehled vyhlášených výzev

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 bylo možné předkládat žádosti do vyhlášené průběžné výzvy č. 1, alokace vyhlášené výzvy je 157 967 067,00 EUR (tedy pokrývající celkovou alokaci programu). Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách programu <http://www.sn-cz2020.eu>.

6.5.3 Finanční čerpání

K 31. prosinci 2017 bylo vydáno 123 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 143,8 mil. EUR (tj. 91,0 % celkové alokace programu), proplaceno bylo 23,2 mil. EUR (tj. 14,7 % celkové alokace programu). Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 10,4 mil. EUR (tj. 6,6 % celkové alokace programu).

6.5.4 Plnění indikátorů

K 31. prosinci 2017 vykazují všechny indikátory programu nenulové hodnoty závazku příjemců, šest indikátorů má k uvedenému datu nulovou dosaženou hodnotu. V průměru nejvyššího procenta plnění dosažené hodnoty je dosahováno na prioritní ose 1 *Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik*, zejména díky indikátoru OI 2 *Subjekty, které se účastní společného projektu*, u kterého dosažená hodnota představuje 102,5 % hodnoty cílové. Naopak nejnižší procento plnění dosažené hodnoty je na prioritní ose 5 *Technická pomoc* (nulovou dosaženou hodnotu mají indikátory OI 15 *Provedené studie a evaluace* a OI 17 *Zaměstnanci, jejichž plat je spolufinancován z technické pomoci*) a prioritní ose 2 *Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů* (nulovou dosaženou hodnotu mají indikátory CO 14 *Celková délka zrekonstruovaných nebo zmodernizovaných silnic* a OI 8 *Počet nově vytvořených strategií a nástrojů*).

7 Použité pojmy

Celková alokace Dohody o partnerství

Objem finančních prostředků z ESI fondů alokovaný pro DoP (resp. jednotlivé programy) na celé programové období 2014–2020.

Certifikované finanční prostředky

Finanční prostředky, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly na úrovni programu, které zaručují, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR, a které byly zahrnuty ve výkazu výdajů předkládaném EK.

Cílová hodnota indikátoru

Hodnota indikátoru, ke které se ŘO programu zavázal vůči EK v programovém dokumentu. Cílová hodnota může být dosažena až po ukončení realizace programu, tzn. datum cílové hodnoty se nemusí rovnat datu předpokládaného ukončení realizace programu. Cílová hodnota může být naplňována i v době udržitelnosti. V rámci cílové hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru.

Dosažená hodnota indikátoru

Hodnota průběžného naplnění indikátoru a datum, kdy byla hodnota indikátoru dosažena. Dosažená hodnota je sledována pomocí monitorovacích zpráv, které pravidelně předkládají příjemci ŘO OP / ZS. Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu nebo přírůstkový údaj dle povahy indikátoru a jeho definice.

Například:

- indikátory vztažené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok“
- podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí (%)“
- statistické indikátory.

V rámci dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty společně (výchozí, cílová a dosažená).

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory

Finanční prostředky, u nichž je stvrzeno jejich poskytnutí / převod podpory subjektem poskytujícím podporu vůči příjemci, a to prostřednictvím právního aktu, příp. dodatku k právním aktům.

Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu

Finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil na účty příjemců na základě schválených žádostí o platbu ex-post a žádostí o kombinovanou platbu.

V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce se jedná o finanční prostředky, které pověřený orgán (platební orgán / certifikační orgán / platební a certifikační orgán) proplatil na účet příjemce (vedoucího partnera) na základě schválených žádostí o platbu ex-post, resp. předloženého vyúčtování.

Dále jsou zahrnovány finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil ve formě zálohových plateb v režimu ex-ante financování (event. obdržel od příjemců v případě přeplatků), a to bez ohledu na, zda příjemci již předložili / nepředložili vyúčtování ex-ante.

Tyto údaje jsou dostupné pouze za příspěvek Unie a národní spolufinancování (národní veřejné zdroje a národní soukromé zdroje). V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná pouze o výši dotace.

Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení.

Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK

Finanční prostředky, které byly zaúčtovány v účetním systému MF-PCO v daném účetním roce, MF-PCO je certifikoval, zahrnul do žádosti o průběžnou platbu a odeslal EK k refundaci.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o finanční prostředky, které PA odeslal EK k refundaci (včetně finančních prostředků za staré závazky). Údaj je dostupný pouze na úrovni programu.

V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce se jedná o finanční prostředky, které pověřený orgán (certifikační orgán / platební a certifikační orgán) certifikoval a zahrnul do žádosti o průběžnou platbu a odeslal EK k refundaci.

Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu

Finanční prostředky, které v režimu ex-post a kombinovaného financování příjemci předložili (vyúčtovali) v žádostech o platbu a které ŘO / ZS / PA schválil (schváleno 2. stupněm).

Finanční prostředky, které v režimu ex-ante financování příjemci vyúčtovali a ŘO / ZS je schválil (schváleno 2. stupněm).

Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení.

Hlavní alokace na jednotlivé roky implementace (resp. alokace na rok n)

Objem finančních prostředků přidělených dílčí programové úrovni na dílčí rok implementace, resp. na rok n, který odpovídá alokaci na daný rok implementace snížené o výši výkonnostní rezervy.

Limit čerpání pro rok n+3

Minimální objem finančních prostředků, které musí být předloženy v žádostech o průběžnou platbu EK, aby bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce implementace. Jinými slovy, jedná se o výši ročního

závazku pro rok n , kterou je potřeba vyčerpat do konce roku $n+3$, sníženou o počáteční a roční předběžné platby.

Příspěvek Unie

Souhrnné označení pro zdroje spolufinancování z ESI fondů, tj. EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF.

Výchozí hodnota indikátoru

Hodnota indikátoru naměřená před začátkem realizace projektu / programu. Hodnota se během realizace projektu / programu nemění. Výchozí hodnota indikátoru je zohledněna v rámci dosažené hodnoty. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty (výchozí, cílové a dosažené) společně. U statistických indikátorů může dojít ke změně výchozí hodnoty v případě, že se změní metodika jejich výpočtu a zpětně jsou dopočítávány časové řady.

Výkonnostní rámec

Výkonnostní rámec představuje nástroj, který slouží k hodnocení úspěšnosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů a plnění finančních a věcných cílů prostřednictvím tzv. milníků a cílů. Motivaci k naplnění těchto milníků a cílů představuje výkonnostní rezerva.

Závazek příjemce

Hodnota (plán) indikátoru, ke které se příjemce zavázal realizací projektu vůči ŘO v Rozhodnutí / Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že závazek silně překračuje cílové hodnoty stanovené v programovém dokumentu, mluvíme o tzv. přezávazkování indikátoru.

8 Seznam zkratek

AEO	Agroenviromentální opatření
AO	Auditní orgán
APZ	Aktivní politika zaměstnanosti
BSK5	Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
CF	Fond soudržnosti
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj
CSV	Celostátní síť pro venkov
CZK	Koruna česká
CZV	Celkové způsobilé výdaje
CŽV	Celoživotní vzdělávání
ČOV	Čistírna odpadních vod
ČR	Česká republika
ČZ	Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020
DoP	Dohoda o partnerství
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj
EIP	Evropské inovační partnerství
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond
ESF	Evropský sociální fond
ESIF, ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EUR	Společná evropská měna euro
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
FTE	Full time equivalent – přepočtený úvazek
GJ	Gigajoule
GSM-R/ETCS	Mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace/Evropský vlakový zabezpečovací systém
CHSKCr	Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem draselným
ICT	Informační a komunikační technologie
INTERREG V-A Česká republika - Polsko	Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika - Polsko
INTERREG V-A Rakousko - Česká republika	Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
INTERREG V-A Slovensko - Česká republika	Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovensko - Česká republika
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS	Informační systém
IS SZIF	Informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu
ISDS	Informační systém datových schránek
IT	Informační technologie
ITI	Integrovaná územní investice
ITS	Inteligentní dopravní systémy

IZS	Integrovaný záchranný systém
KVET	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
kW	kilowatt
LEADER	Liaison entre les actions economic rural – Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova
LFA-H	Horské oblasti
LFA-O	Oblasti, které čelí značným přírodním omezením
LFA-S	Oblasti, které čelí specifickým omezením
MAS	Místní akční skupina
MHD	Městská hromadná doprava
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MSP	Malé a střední podniky
MVA	Megavoltampér
MW	Megawatt
MZe	Ministerstvo zemědělství
NGA	Sítě nové generace
NNO	Nestátní neziskové organizace
OP	Operační program
OP D	Operační program Doprava
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PPR	Operační program Praha – pól růstu
OP R	Operační program Rybářství
OP TP	Operační program Technická pomoc
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OSVČ	Osoba samostatně výdělečně činná
OZE	Obnovitelné zdroje energie
PF	Priorita financování
PO	Prioritní osa
PRV	Program rozvoje venkova 2014– 2020
PS/DS	Transformační výkon přenosové/distribuční soustavy
PU	Priorita Unie
PVS	Portál veřejné správy
REACH	Registrace, evaluace a autorizace chemických látek
RPJ	Roční pracovní jednotka
ŘO	Řídicí orgán
SAIDI	Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období
SAIFI	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období
SVP	Speciální vzdělávací potřeby
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
TEN-T	Transevropské dopravní sítě
TJ	Terajoule

ÚP	Úřad práce
VaV	Výzkum a vývoj
VŠ	Vysoká škola
YEI	Youth Employment Initiative - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
ZCHÚ	Zvláště chráněná území

